

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК


№	ЕТАП/ПОДЕТАП/ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	НАЧАЛО	КРАЙ	БРИГАДА	Ресурс
13	ЗАДАЧА 4	Медицнски газове: изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология, съгласувания с архитекта, технолога и подаване на задание на ел инженера, изработване на окончателен проект	11 d	Sun 23.6.19	Wed 3.7.19	Експерт Медицински газове	проект
14	ЗАДАЧА 5	ОВК : изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология, съгласувания с архитеката и технолога, подаване на задание към ВК и ел инженери, изработване на окончателен проект	11 d	Sun 23.6.19	Wed 3.7.19	Експерт Отопление, вентилация и климатизация	проект
15	ЗАДАЧА 6	Електро силови: изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология и ОВК задание, задание МГ и ПИ, съгласувания с архитекта и ОВК, МГ и МТ инженери, изработване на окончателен проект	9 d	Tue 25.6.19	Wed 3.7.19	Експерт Електроинсталации – силнотоккови	проект
16	ЗАДАЧА 7	Слаботоккови и ПИ: изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология, съгласувания с архитект, електро и МТ инженера, изработване на окончателен проект	11 d	Sun 23.6.19	Wed 3.7.19	Експерт Електроинсталации – слаботоккови и Пожароизвестяване	проект
17	ЗАДАЧА 8	Вик: изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология и ОВК задание, съгласувания с архитекта, ОВК и МТ инженера, изработване на окончателен проект	9 d	Tue 25.6.19	Wed 3.7.19	Експерт Водопровод и канализация	проект
18	ЗАДАЧА 9	ПБЗ и ПУСО: изработване на проекта на база арх.чертеж и количествени сметки по всички части, изработване на окончателен проект	7 d	Thu 27.6.19	Wed 3.7.19	Експерт ПБЗ и ПУСО	проект
19	ЗАДАЧА 10	Пожарна безопасност: изработване на проекта на база записка по всички проектни части, съгласувания с архитекта, изработване на окончателен проект	4 d	Sun 30.6.19	Wed 3.7.19	Експерт Пожарна безопасност	проект
20	ДЕЙНОСТ 3	Приемо - предавателен протокол след проверка на съответствието на инвестиционния проект със Задание за проектиране и Техническите спецификации	1 d	Thu 4.7.19	Thu 4.7.19		
21		АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР и изработване на екзекутивни чертежи за отразяване на несъществени изменения от ТП възникнали в процеса на строителството /.	89 d	Fri 5.7.19	Tue 1.10.19		
22		УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ОТ ПРОЕКТАНТИТЕ по отделните части на ТП през целия период на строителството на обекта	89 d	Fri 5.7.19	Tue 1.10.19		

LEGEND

КРИТИЧЕН/Critical/

НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/


СУМАРЕН/Summary/



ПРЕКЪСВАНЕ/Split/

СЪБИТИЕ/Milestone/

Inactive Milestone



Inactive Summary


Manual Task

Duration-only




ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

пнители / Механизация

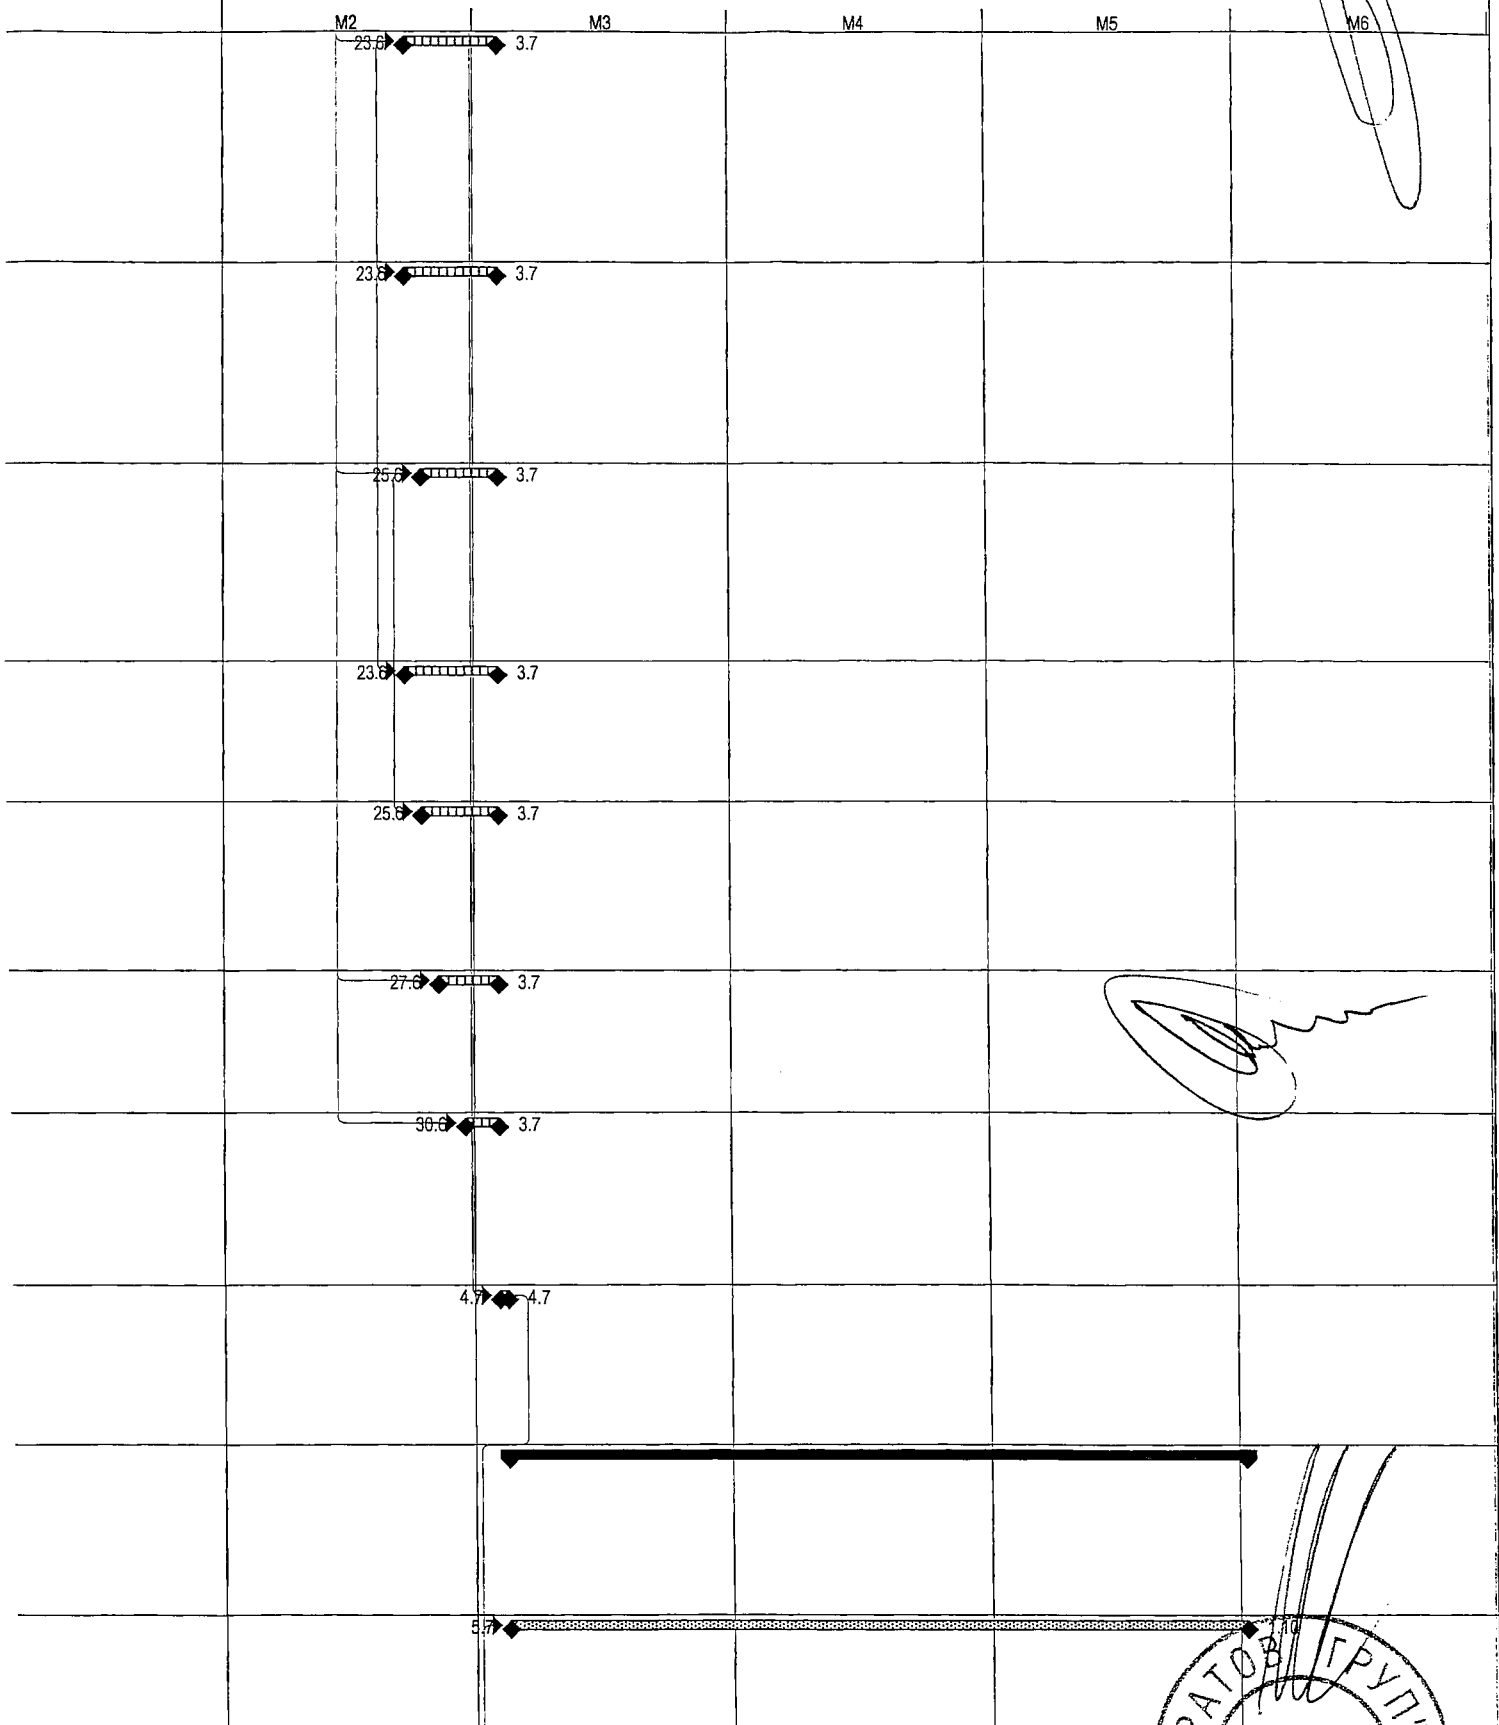


- Summary Rollup Finish-only
- Summary External Tasks
- ily External Milestone




ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет:
 "Преустройство и смяна на предназначението на помещения за Физиотерапия
 и ЛФК в отделение за възрастни към Клиника по изгаряния и пластична хирургия
 към „УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - ЕАД"

СХЕМА НА ОГРАНИЗАЦИОН

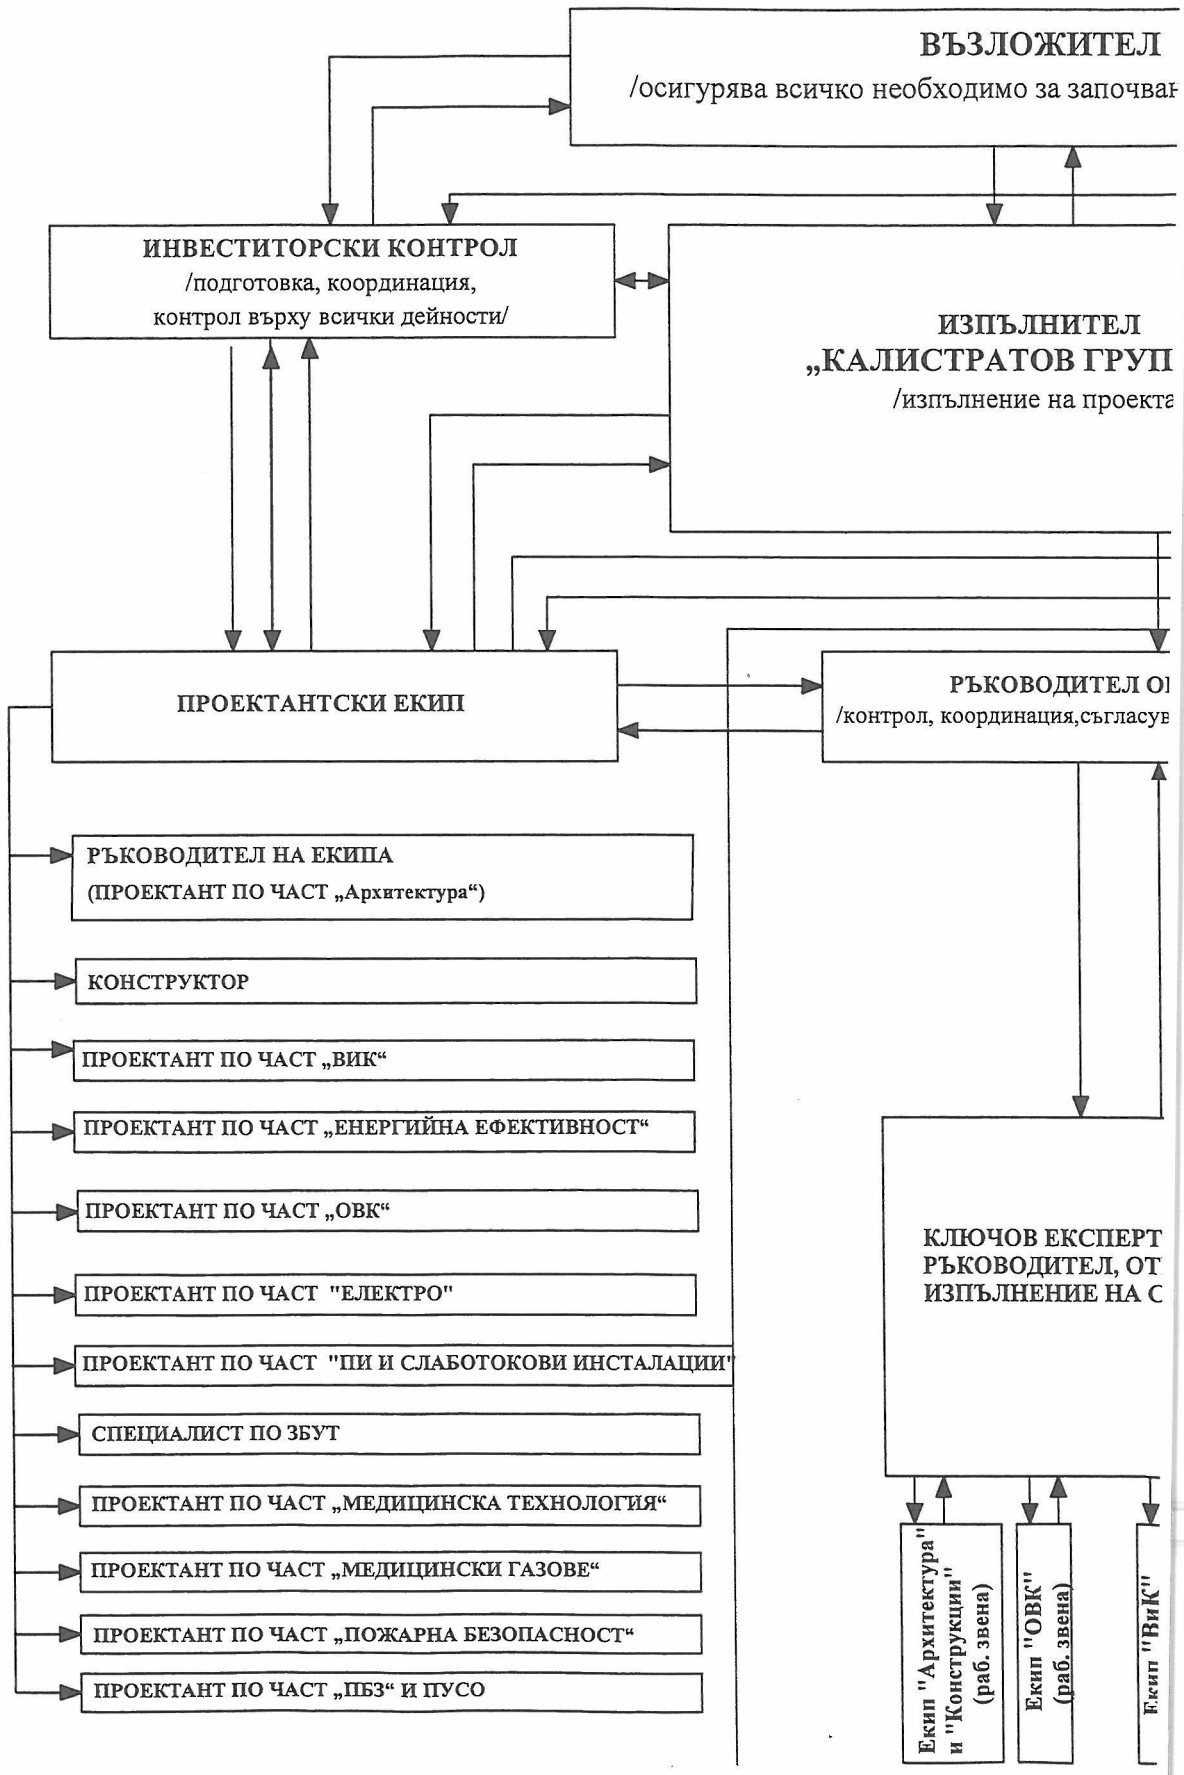

Организационна структура на персонала

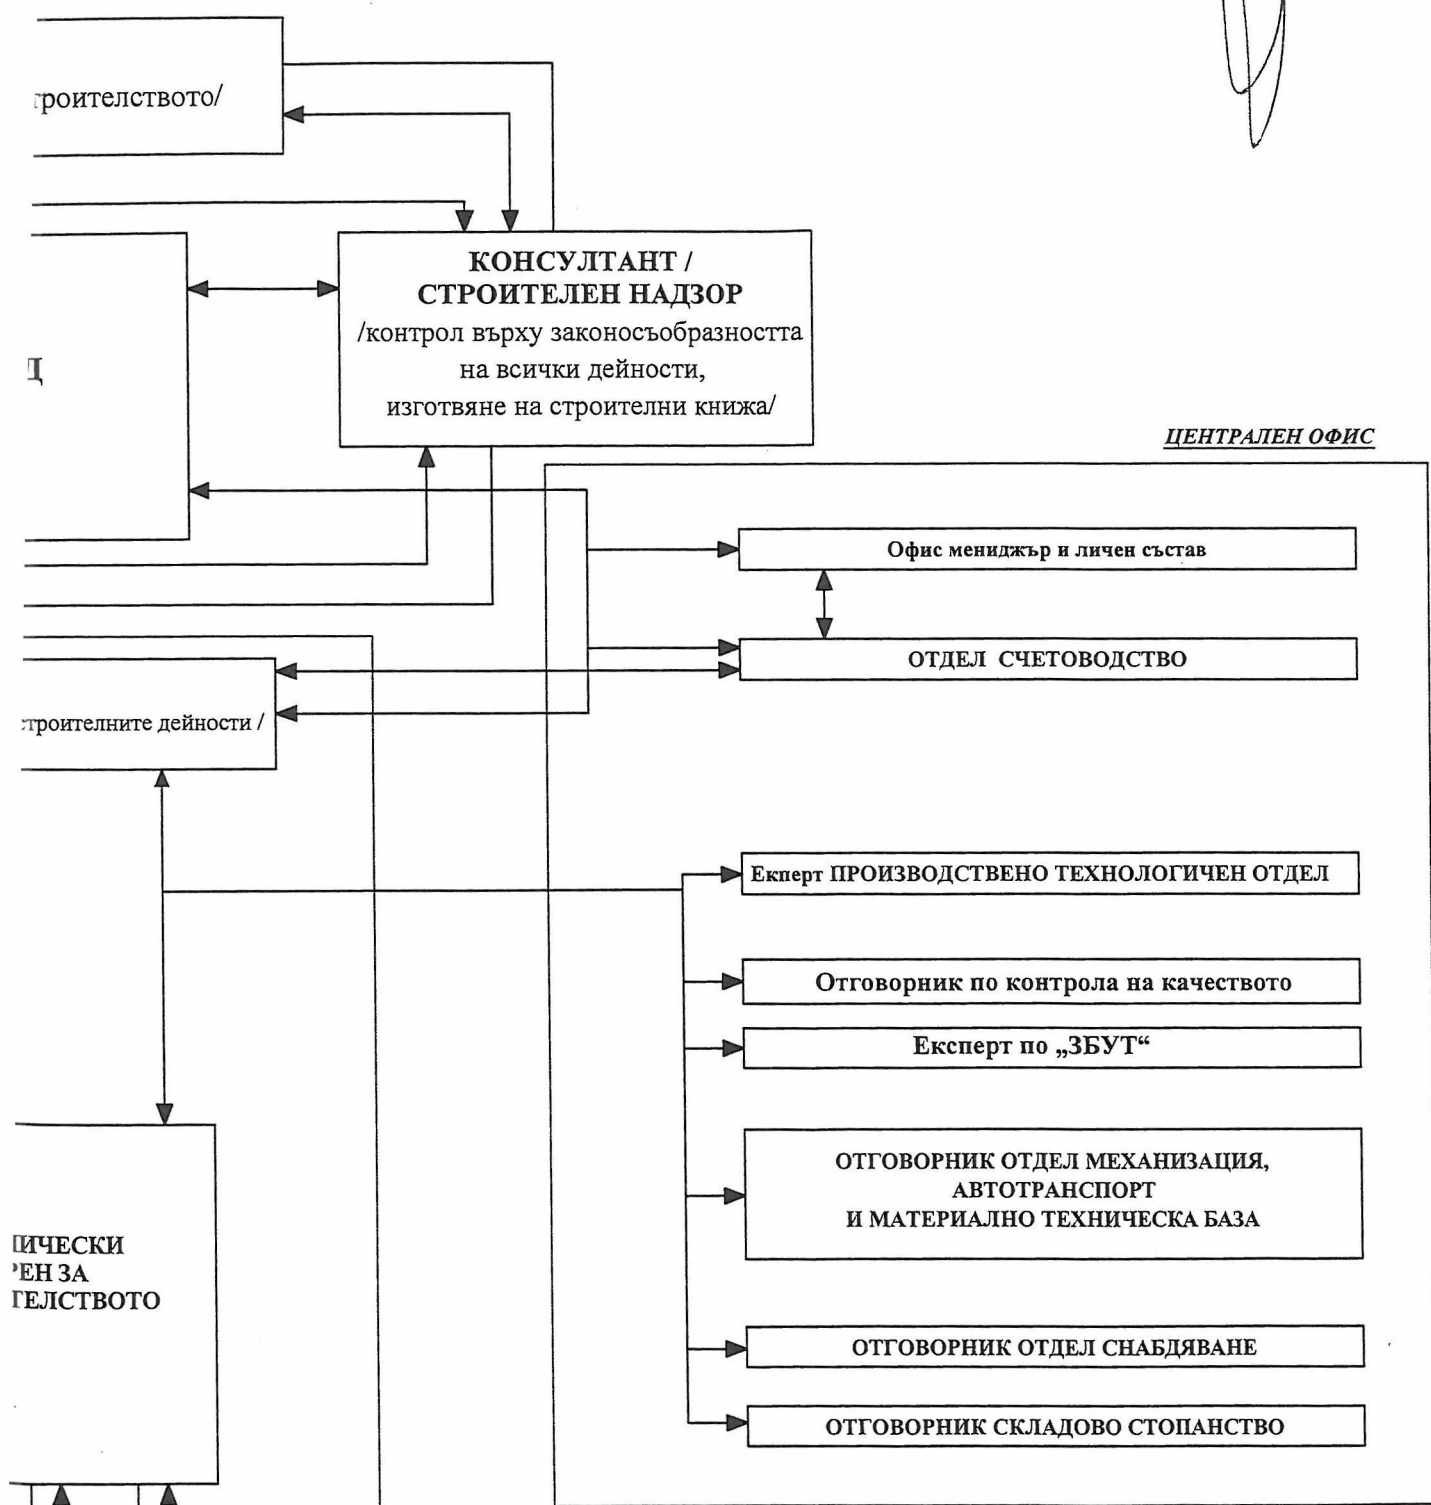

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ФИЗИЧЕСКИ
МЕНИДЖЪР ЗА
СТРОИТЕЛСТВОТО

Екип "Електро":
Електро- и Слаботокови
(раб. звена)

Екип "ОВК" и МГ
(раб. звена)



ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 5


№	ЕТАП/ПОДЕТАП/ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	НАЧАЛО	КРАЙ	БРИГАДА	Ресурси-
1		Обект: Преустройство и смяна на предназначението на помещения на Физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към Клиника по изгаряния и пластична хирургия към УМБАСЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД	107 d	Mon 17.6.19	Tue 1.10.19		
2	ЕТАП 1	ИЗГОТВЯНЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ / ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ	18 d	Mon 17.6.19	Thu 4.7.19		
3		Начало на изготвяне на инвестиционния проект - подписване на Договор за възлагане / Възлагателно писмо	1 d	Mon 17.6.19	Mon 17.6.19		
4	ДЕЙНОСТ 1	Процес на подготовка и събиране на информация за изготвяне на инвестиционен проект:	3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19	Проектантски екип - 10 бр. Специалисти проектант по съответните части	проект
5		Събиране на данни за проектирането и посещения на обекта. провеждане на среща с персонала на Клиниката	3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19		
6		АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ на сградата	3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19		
7		Запознаване с изходните данни а именно Задание за проектиране и Технически спецификации. Доклад за резултатите от обледване за установяване на технически характеристики. Технически паспорт. рег. N ДОСК-2012/22.04.2015	3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19		
8		Запознаване с Доклад от обледване за енергийна ефективност. Резюме на доклад от извършено обледване за енергийна ефективност със Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация	3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19		
9	ДЕЙНОСТ 2	Изготвяне на технически проект	16 d	Tue 18.6.19	Wed 3.7.19		
10	ЗАДАЧА 1	Архитектура: изработване на арх. Решения: съгласуване с Възложителя; подаване на подложка за конструкции и технология: подаване на подложки за отделните специалности; съгласувания с всички проектант, изработване на окончателен проект	16 d	Tue 18.6.19	Wed 3.7.19	Експерт Архитект	проект
11	ЗАДАЧА 2	Конструкции: изработване на проекта на база арх.чертеж, съгласувания с архитекта, изработване на окончателен	3 d	Sun 23.6.19	Tue 25.6.19	Експерт Конструкции	проект
12	ЗАДАЧА 3	Технология: изработване на проекта на база арх.чертеж, съгласувания с архитекта, изработване на окончателен проект	3 d	Sun 23.6.19	Tue 25.6.19	Експерт Медицинска технология	проект

LEGEND

КРИТИЧЕН/Critical/

НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/


СУМАРЕН/Summary/



ПРЕКЪСВАНЕ/Split/

СЪБИТИЕ/Milestone/

Inactive Milestone



Inactive Summary

Manual Task


Duration only

Ma

Ma

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

инители / Механизация

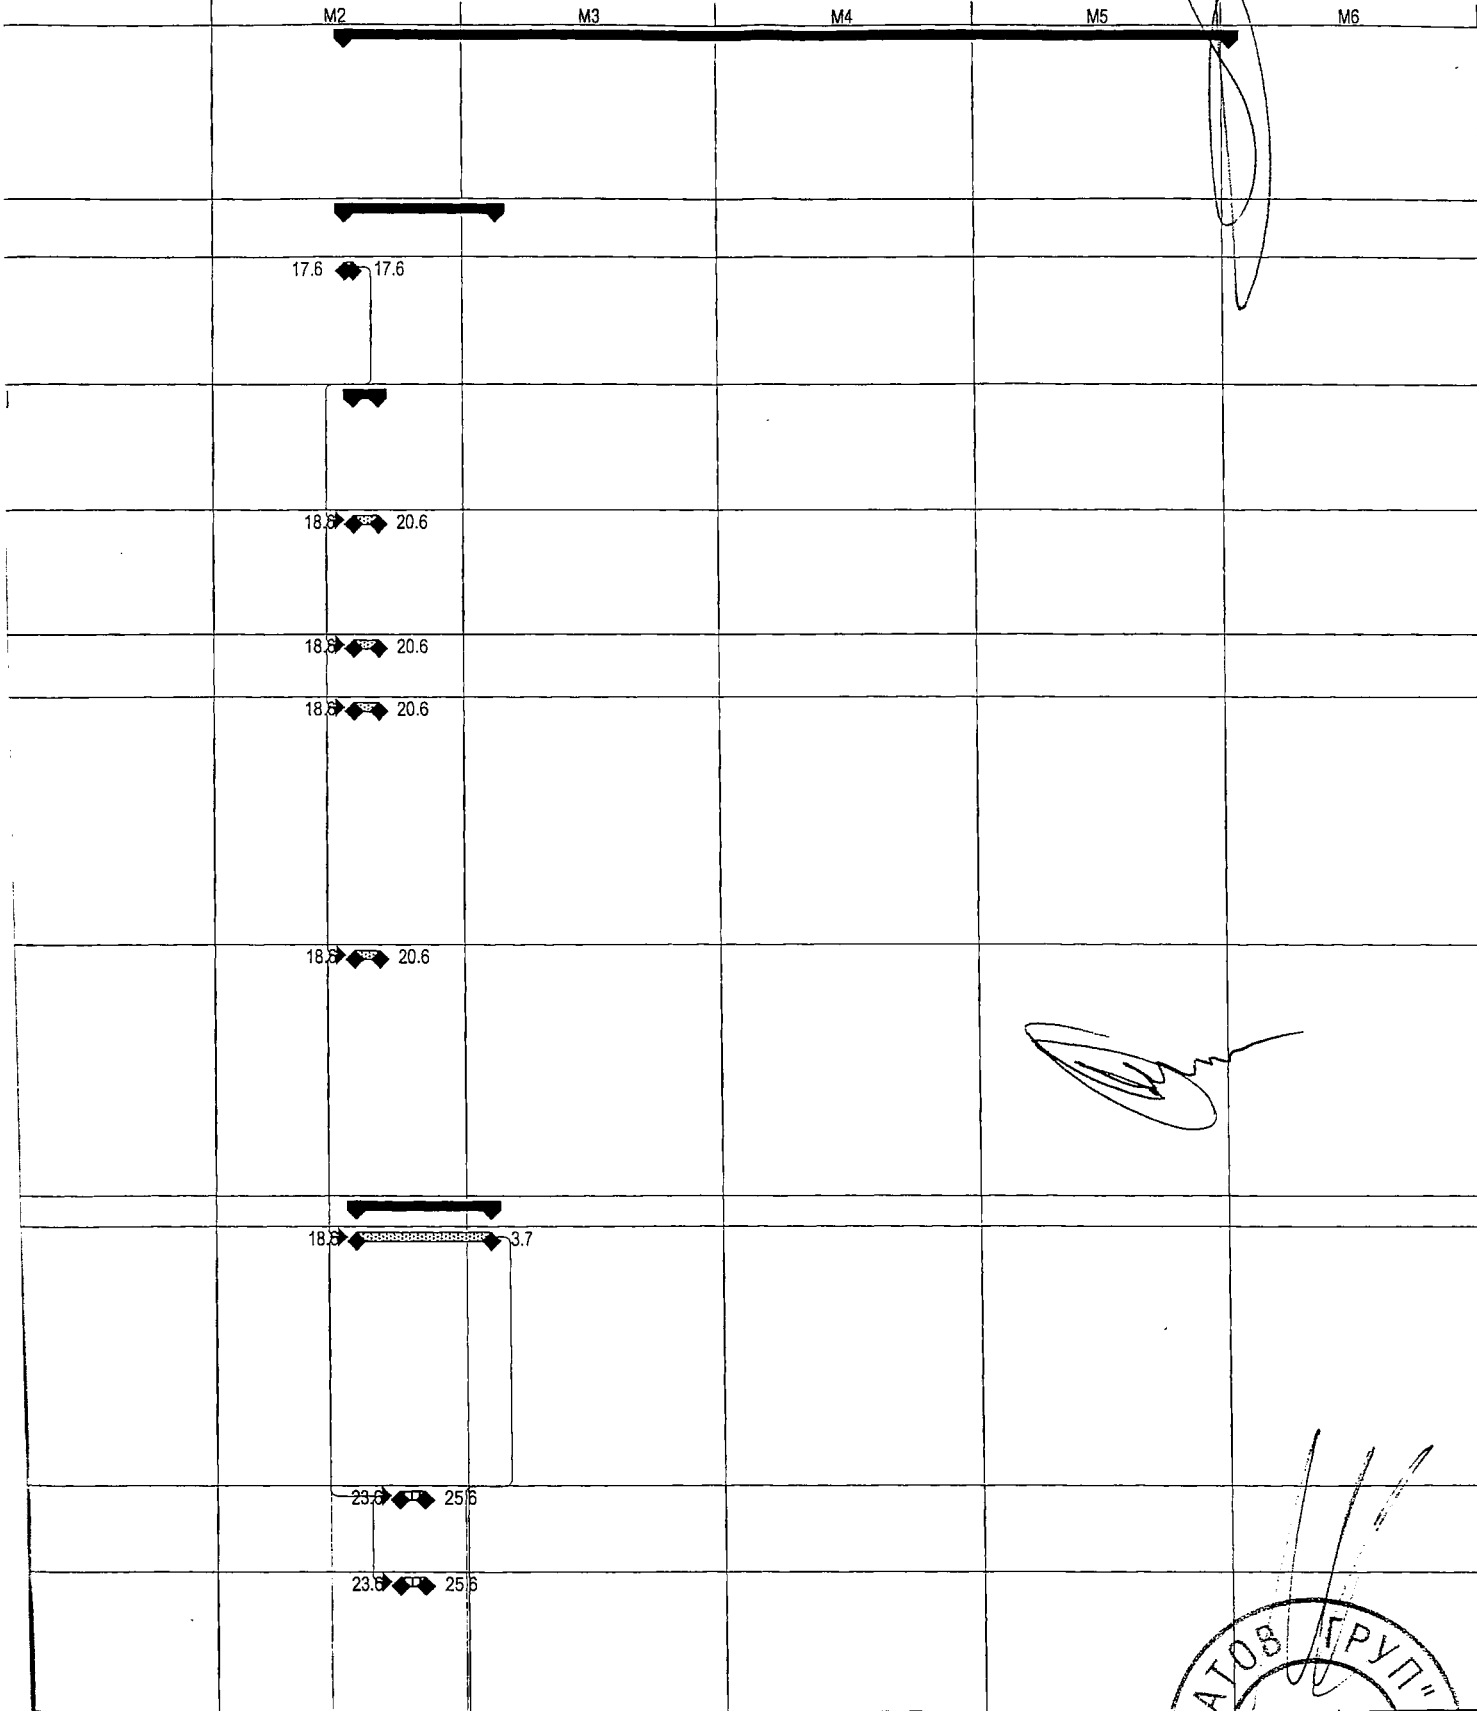

Summary Rollup




Finish-only



Summary



External Tasks




ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИ

ID	Text1	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
19		Нови стени от гипсокартон - преградни стени, шахтови стени, предстенни обшивки, обличане на метални колони, усилване при отвори и санитарни прибори	25 d	Sat 20.7.19	Tue 13.8.19	17SS
20		Полагане на гранитогрес	7 d	Thu 25.7.19	Wed 31.7.19	18
21		Окачен таван от гипсокартон - растерен, гладък, влагоустойчив, обличане на инсталационни трасета и оформяне връзка с фасадна дограма	20 d	Sat 24.8.19	Thu 12.9.19	19FS+10 d
22		Шпакловка и латекс по стени и тавани	35 d	Wed 14.8.19	Tue 17.9.19	19
23		Полагане саморазливна замазка, PVC антистатична рулонна настилка вкл. первази	25 d	Tue 3.9.19	Fri 27.9.19	24
24		Полагане на PVC облицовка по стени	10 d	Sat 24.8.19	Mon 2.9.19	22SS+10 d
25		Доставка и монтаж на алуминиева дограма	23 d	Sat 7.9.19	Sun 29.9.19	24FS+4 d
26		Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати	2 d	Wed 28.8.19	Thu 29.8.19	24SS+4 d
27		Довършителни архитектурно-строителни работи Фоайе	23 d	Sat 20.7.19	Sun 11.8.19	
28		Изпълнение на предстенна обшивка и шахтова стена от гипсокартон	5 d	Sat 20.7.19	Wed 24.7.19	19SS
29		Окачен таван от гипсокартон	3 d	Thu 25.7.19	Sat 27.7.19	28
30		Шпакловка и латекс по стени и тавани	5 d	Sun 28.7.19	Thu 1.8.19	29
31		Полагане PVC антистатична рулонна настилка	5 d	Fri 2.8.19	Tue 6.8.19	30
32		Полагане декоративна мазилка по стени	3 d	Wed 7.8.19	Fri 9.8.19	31
33		Доставка и монтаж на дограма	2 d	Sat 10.8.19	Sun 11.8.19	32
34		Довършителни архитектурно-строителни работи във връзка с подмяна на 3 броя асансьори	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19	
35		Оформяне на пространството около подменените врати, премахване на пиластри, обзидане, мазилка, замазка и латексова боя, извършване на СМР в машинно отделение, осигуряване на здрава основа в ас. шахта	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19	16SS
36		Част Електро - силнотоккови инсталации	61 d	Fri 19.7.19	Tue 17.9.19	
37		Демонтажни работи - съществуващи табла, осветителни тела, ключове и контакти, кабели	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19	11
38		Доставка и полагане на ПЕ тръба под мазилка, в стени и тавани от гипсокартон	7 d	Fri 19.7.19	Thu 25.7.19	16SS
39		Доставка и полагане на кабелна скара	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19	38SS

Project: stadion2-12216-2kashtiELEKT
Date: Wed 29.5.19


Task		Project Summary		Inactive Miles
Split		External Tasks		Inactive Sumi
Milestone		External Milestone		Manual Task
Summary		Critica		Duration-only

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

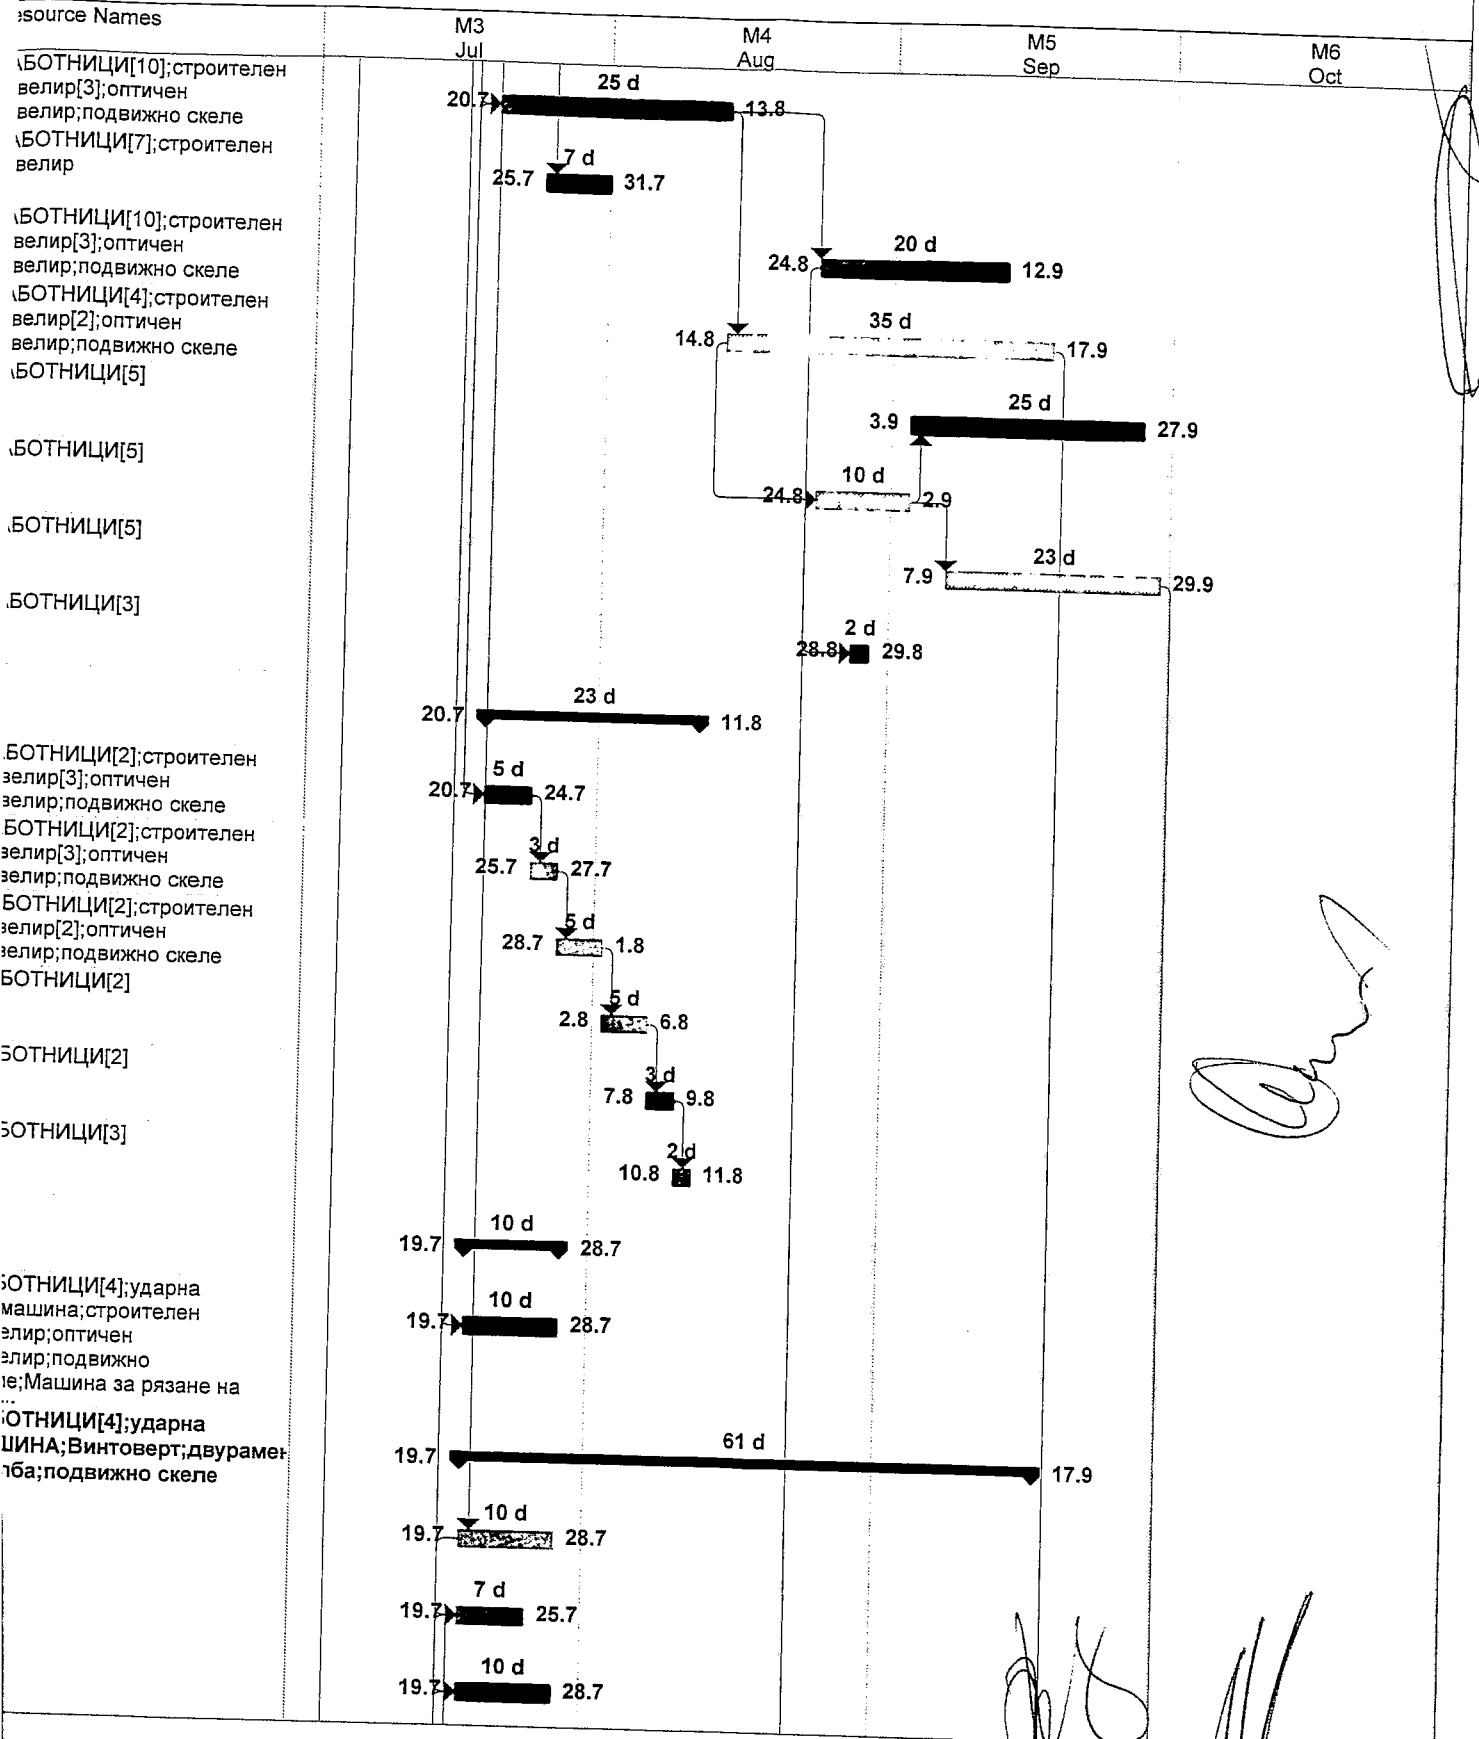

Handwritten signature

Handwritten initials



	Manual Summary Rollup	◆		External Tasks
	Manual Summary	◆		External Milestone
	Start-only			Progress
	Finish-only			Deadline


ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИ

ID	Text1	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		Обект: Преустройство и смяна на предназначението на помещения на Физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към Клиника по изгаряния и пластична хирургия към УМБАСЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД	89 d	Fri 5.7.19	Tue 1.10.19	
2		АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР и изработване на екзекутивни чертежи за отразяване на несъществени изменения от ТП възникнали в процеса на строителството /.	89 d	Fri 5.7.19	Tue 1.10.19	
3		УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ОТ ПРОЕКТАНТИТЕ по отделните части на ТП през целия период на строителството на обекта	89 d	Fri 5.7.19	Tue 1.10.19 6SS	
4		ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ ПО ЧАСТИ, когато това се налага в процеса на изпълнение на строителството за отразяване на несъществени изменения от ТП възникнали в процеса на строителството /.	89 d	Fri 5.7.19	Tue 1.10.19 6SS	
5		ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР Обект: Преустройство и смяна на предназначението на помещения на Физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към Клиника по изгаряния и пластична хирургия към УМБАСЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД	89 d	Fri 5.7.19	Tue 1.10.19	
6		Протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка	1 d	Fri 5.7.19	Fri 5.7.19	
7		Временно строителство, включително обезопасяване на обекта и поставяне на обозначителни табели;	1 d	Sat 6.7.19	Sat 6.7.19 6	
8		ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	12 d	Sun 7.7.19	Thu 18.7.19	
9		Демонтаж на фаянс и дървена ламперия по стени	5 d	Sun 7.7.19	Thu 11.7.19 7	
10		Демонтаж на настилки - теракот, паркет, линолеум	7 d	Sun 7.7.19	Sat 13.7.19 9SS	
11		Демонтажни работи - тухлени и шахтови стени	10 d	Tue 9.7.19	Thu 18.7.19 10SS+2 d	
12		Демонтаж на гипсокартон на метални щендери стени	7 d	Tue 9.7.19	Mon 15.7.19 11SS	
13		Демонтаж на окачен таван - гипсокартон	7 d	Sun 7.7.19	Sat 13.7.19 9SS	
14		Демонтаж вътрешна дограма	7 d	Sun 7.7.19	Sat 13.7.19 9SS	
15		Довършителни архитектурно-строителни работи на II-ри етаж	73 d	Fri 19.7.19	Sun 29.9.19	
16		Нова зидария от газобетон за затваряне на фасаден отвор	1 d	Fri 19.7.19	Fri 19.7.19 11	
17		Мазилка по стени вкл. Подготовка на съществуващи стени за нов латекс	5 d	Sat 20.7.19	Wed 24.7.19 16	
18		Полагане на изравнителна циментова замазка	5 d	Sat 20.7.19	Wed 24.7.19 17SS	

Project: stadion2-12216-2kashtiELEKT
Date: Wed 29.5.19

Task		Project Summary		Inactive Miles
Split		External Tasks		Inactive Sumi
Milestone		External Milestone		Manual Task
Summary		Critica		Duration-only

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

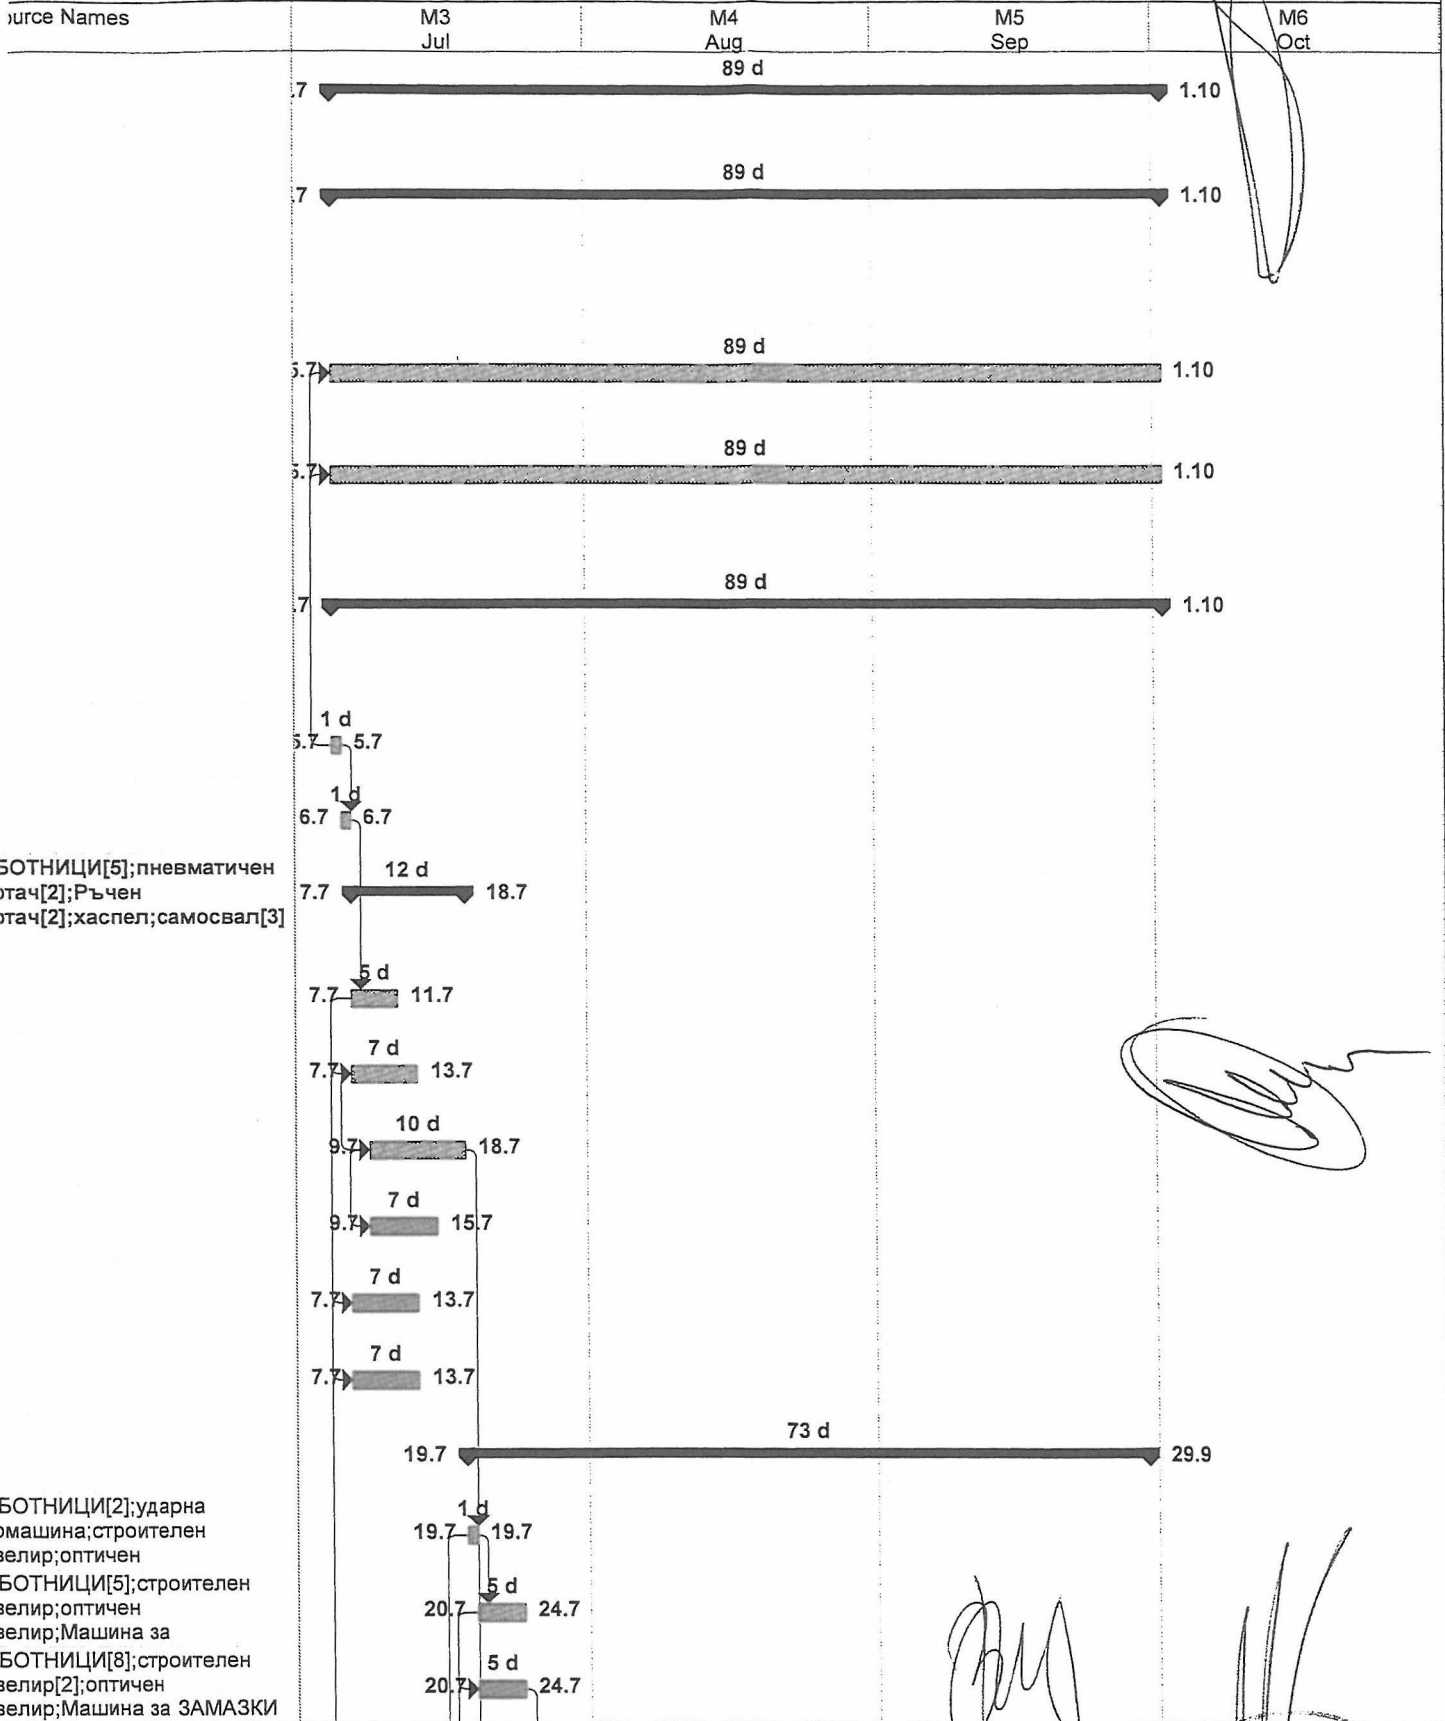

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only
- External Tasks
- External Milestone
- Progress
- Deadline

ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	ЕТАП/ПОДЕТАП/ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ед. Мярка	количество	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	НАЧАЛО	КРАЙ	БРИГ
12	ЗАДАЧА 3	Технология: изработване на проекта на база арх.чертеж, съгласувания с архитекта, изработване на окончателен проект			3 d	Sun 23.6.19	Tue 25.6.19	Екс техн
13	ЗАДАЧА 4	Медицнски газове: изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология, съгласувания с архитекта, технолога и подаване на задание на ел инженера, изработване на окончателен проект			11 d	Sun 23.6.19	Wed 3.7.19	Екс газс
14	ЗАДАЧА 5	ОВК : изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология, съгласувания с архитеката и технолога, подаване на задание към ВК и ел инженери, изработване на окончателен проект			11 d	Sun 23.6.19	Wed 3.7.19	Екс вен кли
15	ЗАДАЧА 6	Електро силови: изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология и ОВК задание, задание МГ и ПИ, съгласувания с архитекта и ОВК, МГ и МТ инженери, изработване на окончателен проект			9 d	Tue 25.6.19	Wed 3.7.19	Екс Еле сил
16	ЗАДАЧА 7	Слаботокови и ПИ: изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология, съгласувания с архитект, електро и МТ инженера, изработване на окончателен проект			11 d	Sun 23.6.19	Wed 3.7.19	Екс Еле слаб Пож
17	ЗАДАЧА 8	ВиК: изработване на проекта на база арх.чертеж и медицинска технология и ОВК задание, съгласувания с архитекта, ОВК и МТ инженера, изработване на окончателен проект			9 d	Tue 25.6.19	Wed 3.7.19	Екс и ка
18	ЗАДАЧА 9	ПБЗ и ПУСО: изработване на проекта на база арх.чертеж и количествени сметки по всички части, изработване на окончателен проект			7 d	Thu 27.6.19	Wed 3.7.19	Екс ПУС
19	ЗАДАЧА 10	Пожарна безопасност: изработване на проекта на база записка по всички проектни части, съгласувания с архитекта, изработване на окончателен проект			4 d	Sun 30.6.19	Wed 3.7.19	Екс безс
20	ДЕЙНОСТ 3	Приемо - предавателен протокол след проверка на съответствието на инвестиционния проект със Задание за проектиране и Техническите спецификации			1 d	Thu 4.7.19	Thu 4.7.19	

LEGEND

КРИТИЧЕН/Critical/




ПРЕКЪСВАНЕ/Split/



Inactive Summary

НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/



СЪБИТИЕ/Milestone/




Manual Task

СУМАРЕН/Summary/



Inactive Milestone



Duration-only

ПРОЕКТИРАНЕ

Ресурси - Изпълнители / Механизация							
		W-1	W1	W2	W3	W4	W5
Медицинска ия	проектант			23.6	25.6		
Медицински	проектант			23.6		3.7	
Отопление, ии и зация	проектант			23.6		3.7	
инсталации – кови	проектант			25.8		3.7	
инсталации – кови и известяване	проектант			23.6		3.7	
Водопровод зация	проектант			25.8		3.7	
ПВЗ и	проектант			27.6		3.7	
Пожарна ност	проектант			30.6		3.7	
						4.7	4.7

Annual Summary Rollup

Annual Summary


Start-only



Finish-only

External Tasks

External Milestone



"КАЛИСТРАТОВ ГРУП" ООД

ЛИНЕЕН ГРАФИ

№	ЕТАП/ПОДЕТАП/ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ед. Мярка	количество	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	НАЧАЛО	КРАЙ	БР
1		Обект: Преустройство и смяна на предназначението на помещения на Физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към Клиника по изгаряния и пластична хирургия към УМБАСЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД			18 d	Mon 17.6.19	Thu 4.7.19	
2	ЕТАП 1	ИЗГОТВЯНЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ / ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ			18 d	Mon 17.6.19	Thu 4.7.19	
3		Начало на изготвяне на инвестиционния проект - подписване на Договор за възлагане / Възлагателно писмо			1 d	Mon 17.6.19	Mon 17.6.19	
4	ДЕЙНОСТ 1	Процес на подготовка и събиране на информация за изготвяне на инвестиционен проект:			3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19	Пр бр. прс със
		Събиране на данни за проектирането и посещения на обекта. провеждане на среща с персонала на Клиниката			3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19	
6		АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ на сградата			3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19	
7		Запознаване с изходните данни а именно Задание за проектиране и Технически спецификации, Доклад за резултатите от обледване за установяване на технически характеристики, Технически паспорт. рег. N ДОСК-2012/22.04.2015			3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19	
8		Запознаване с Доклад от обледване за енергийна ефективност. Резюме на доклад от извършено обледване за енергийна ефективност със Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация			3 d	Tue 18.6.19	Thu 20.6.19	
9	ДЕЙНОСТ 2	Изготвяне на технически проект			16 d	Tue 18.6.19	Wed 3.7.19	
10	ЗАДАЧА 1	Архитектура: изработване на арх. Решения: съгласуване с Възложителя: подаване на подложка за конструкции и технология: подаване на подложки за отделните специалности: съгласувания с всички проектанти, изработване на окончателен проект			16 d	Tue 18.6.19	Wed 3.7.19	Екс
11	ЗАДАЧА 2	Конструкции: изработване на проекта на база арх.чертеж, съгласувания с архитекта, изработване на окончателен			3 d	Sun 23.6.19	Tue 25.6.19	Екс Коф

LEGEND

КРИТИЧЕН/Critical/




ПРЕКЪСВАНЕ/Split/



Inactive Summary

НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/



СЪБИТИЕ/Milestone/



Manual Task

СУМАРЕН/Summary/




Inactive Milestone



Duration-only

А ПРОЕКТИРАНЕ

Ресурси - Изпълнители / Механизация		W-1	W1	W2	W3	W4	W5
				—————			
				—————			
			17.6	17.6			
технически екип - 10 административни части	проектант[10]			—————			
			18.6	20.6			
			18.6	20.6			
			18.6	20.6			
			18.6	20.6			
Архитект	проектант		18.6	—————			3.7
инженери	проектант			23.6	25.6		



- Technical Summary Rollup ◆ Finish-only ———
- Technical Summary ◆ External Tasks —◆—
- External Milestone only ——— External Milestone ———

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	ЕТАП/ПОДЕТАП/ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	НАЧАЛО	КРАЙ	БРИГАДА	Ресурси
104		Климатизация	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
105	ЗАДАЧА 2	Климатизатор мултисплит-система	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
106		Отопление	68 d	Fri 19.7.19	Tue 24.9.19		
107	ЗАДАЧА 1	Демонтажни работи - радиатори и тръбна разводка	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19		
108	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на полипропиленови тръби	15 d	Fri 19.7.19	Fri 2.8.19		
109	ЗАДАЧА 2	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори	7 d	Wed 18.9.19	Tue 24.9.19		
110	ДЕЙНОСТ 9	Част ВИК	68 d	Fri 19.7.19	Tue 24.9.19	БРИГАДА ВИК	РАБОТНИ МАШИНИ: нивелир: тръби:Ресурси: скеле
111	ЗАДАЧА 1	Демонтажни работи - поцинковани тръби и санитария	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19		
112	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на тръби - поцинковани, полипропиленови, PVC тръби, вкл. СК и фасонни части	30 d	Fri 19.7.19	Sat 17.8.19		
113	ЗАДАЧА 2	Доставка и монтаж на смесителни батерии и санитария	7 d	Wed 18.9.19	Tue 24.9.19		
114	ДЕЙНОСТ 10	Част Медицински газове	38 d	Sun 18.8.19	Tue 24.9.19	БРИГАДА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ	РАБОТНИ бормаши: нивелир:
115	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на медни тръби вкл. Колена и тръйници	30 d	Sun 18.8.19	Mon 16.9.19		
116	ЗАДАЧА 2	Доставка и монтаж на етажно газоразпределително табли, дози	7 d	Wed 18.9.19	Tue 24.9.19		
117	ДЕЙНОСТ 11	Строителни отпадъци	85 d	Sun 7.7.19	Sun 29.9.19		
118	ДЕЙНОСТ 12	Демобилизация и почистване	1 d	Mon 30.9....	Mon 30.9.19		
119	ДЕЙНОСТ 13	КОНСТАТИВЕН АКТ ОБР. 15	1 d	Tue 1.10.19	Tue 1.10.19		

LEGEND

КРИТИЧЕН/Critical/




ПРЕКЪСВАНЕ/Split/



Inactive Summary

Ma

НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/



СЪБИТИЕ/Milestone/




Manual Task

Ma

СУМАРЕН/Summary/



Inactive Milestone




Duration-only

Sta

ЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


тели / Механизация

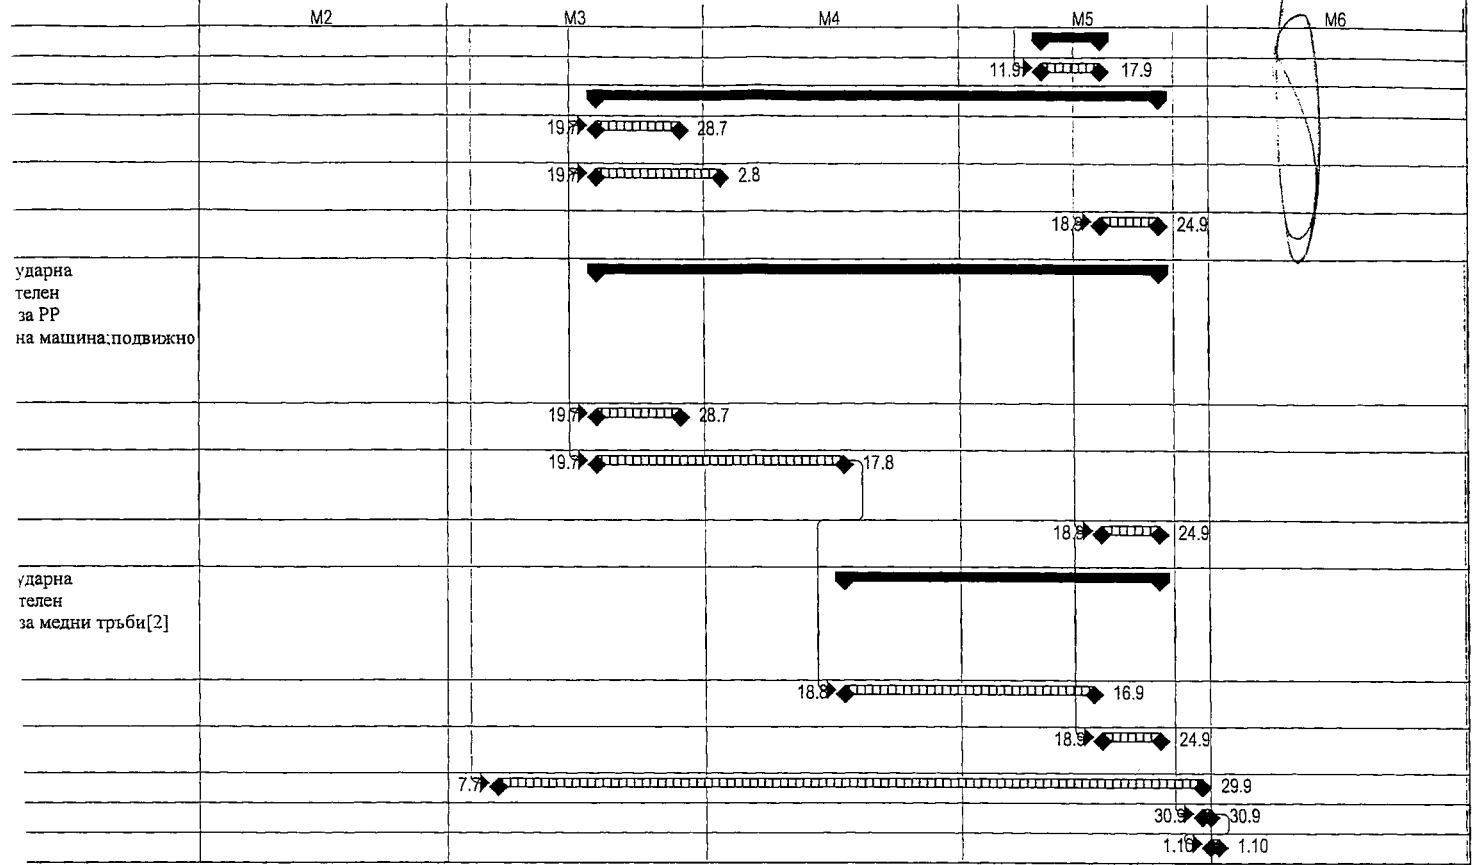

Handwritten signature

Handwritten signature

- ary Rollup ◆
- ary ◆
- Finish-only
- External Tasks
- External Milestone



ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 3.

№	ЕТАП/ПОДЕТАП/ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	НАЧАЛО	КРАЙ	БРИГАДА	Ресурси - И.
68		Видеодомофонна система	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19		
69	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
70	ЗАДАЧА 1	Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19		
71	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на оборудване - камера, видеомонитор	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
72		Пожароизвестителна система	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19		
73	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
74	ЗАДАЧА 1	Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19		
75	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на оборудване - пожарозвестители, звукови сигнализатори, модули за управление	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
76		Локална радиосистема	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19		
77	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
78	ЗАДАЧА 1	Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19		
79	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на оборудване - високоговорители, атенюатори	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
80		Вътрешна кабелна телевизионна система	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19		
81	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
82	ЗАДАЧА 1	Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19		
83	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на оборудване - букси, радиоразклонители	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
84		ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - компютърна и интернет	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19		
85	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
86	ЗАДАЧА 1	Окабеляване	25 d	Tue 30.7.19	Fri 23.8.19		
87	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на оборудване - кутии, модули	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
88		Система за контрол на достъпа	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19		
89	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
90	ЗАДАЧА 1	Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19		
91	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на оборудване - четци, контролери	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
2		Система - паник охрана	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19		
93	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
94	ЗАДАЧА 1	Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19		
95	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на оборудване - розетки, паник-бутони, контролни панели	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
96		Сестринска система	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19		
97	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
98	ЗАДАЧА 1	Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19		
99	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на оборудване - модули и панели	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		
100	ДЕЙНОСТ 8	Част ОВК	68 d	Fri 19.7.19	Tue 24.9.19	БРИГАДА ОВК	РАБОТНИ бормашина
101		Вентилация	61 d	Fri 19.7.19	Tue 17.9.19		
102	ЗАДАЧА 1	Въздуховоди от поцинкована ламарина вкл. Колена и преходи	20 d	Fri 19.7.19	Wed 7.8.19		
103	ЗАДАЧА 2	Оборудване - вентилатори, вентилационен блок и въздухонагревател, решетки	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		

LEGEND

КРИТИЧЕН/Critical/

НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/


СУМАРЕН/Summary/



ПРЕКЪСВАНЕ/Split/

СЪБИТИЕ/Milestone/

Inactive Milestone



Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Mani

Mani

Start


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

нителни / Механизация



И[б]:ударна
строителен нивелир

- External Summary Rollup
- External Summary
- External only
- Finish-only
- External Tasks
- External Milestone



ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 3


№	ЕТАП/ПОДЕТАП/ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	НАЧАЛО	КРАЙ	БРИГАДА	Ресурси - I
42	ЗАДАЧА 7	Полагане саморазлична замазка. PVC антистатична рулонна настилка вкл. первази	25 d	Tue 3.9.19	Fri 27.9.19	БРИГАДА НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ PVC	РАБОТНИ
43	ЗАДАЧА 7	Полагане на PVC облицовка по стени	10 d	Sat 24.8.19	Mon 2.9.19	БРИГАДА НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ PVC	РАБОТНИ
44	ЗАДАЧА 8	Доставка и монтаж на алуминиева дограма	23 d	Sat 7.9.19	Sun 29.9.19	БРИГАДИ ДОГРАМА 5 РАБ	РАБОТНИ
45	ЗАДАЧА 8	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати	2 d	Wed 28.8.19	Thu 29.8.19	МОНТАЖНИЦИ ВРАТИ 3 РАБ	РАБОТНИ
46	ДЕЙНОСТ 4	Довършителни архитектурно-строителни работи Фойе	23 d	Sat 20.7.19	Sun 11.8.19		
47	ЗАДАЧА 4	Изпълнение на предстенна обшивка и шахтова стена от гипсокартон	5 d	Sat 20.7.19	Wed 24.7.19	БРИГАДА "СУХО СТРОИТЕЛСТВО"	РАБОТНИ нивелир[
48	ЗАДАЧА 4	Окачен таван от гипсокартон	3 d	Thu 25.7.19	Sat 27.7.19	БРИГАДА "СУХО СТРОИТЕЛСТВО"	РАБОТНИ нивелир[
49	ЗАДАЧА 6	Шпакловка и латекс по стени и тавани	5 d	Sun 28.7.19	Thu 1.8.19	БРИГАДА ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	РАБОТНИ нивелир[
50	ЗАДАЧА 7	Полагане PVC антистатична рулонна настилка	5 d	Fri 2.8.19	Tue 6.8.19	БРИГАДА НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ PVC	РАБОТНИ
	ЗАДАЧА 6	Полагане декоративна мазилка по стени	3 d	Wed 7.8.19	Fri 9.8.19	БРИГАДА ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	РАБОТНИ
52	ЗАДАЧА 8	Доставка и монтаж на дограма	2 d	Sat 10.8.19	Sun 11.8.19	МОНТАЖНИЦИ ВРАТИ 3 РАБОТНИ	
53	ДЕЙНОСТ 5	Довършителни архитектурно-строителни работи във връзка с подмяна на 3 броя асансьори	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19		
54	ЗАДАЧА 9	Оформяне на пространството около подменените врати, премахване на пиластри, обзидане, мазилка, замазка и латексова боя, извършване на СМР в машинно отделение, осигуряване на здрава основа в ас. шахта	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19	БРИГАДА ЗИДАРИ	РАБОТНИ бормаш нивелир; скеле;Mi
55	ДЕЙНОСТ 6	Част Електро - силнотоккови инсталации	61 d	Fri 19.7.19	Tue 17.9.19	БРИГАДА ЕЛЕКТРО	РАБОТНИ МАШИ стълба;п
56	ЗАДАЧА 1	Демонтажни работи - съществуващи табла, осветителни тела, ключове и контакти, кабели	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19		
57	ЗАДАЧА 2	Доставка и полагане на ПЕ тръба под мазилка, в стени и тавани от гипсокартон	7 d	Fri 19.7.19	Thu 25.7.19		
58	ЗАДАЧА 2	Доставка и полагане на кабелна скара	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19		
59	ЗАДАЧА 2	Доставка и полагане на кабели в тръба и по скара	10 d	Mon 22.7.19	Wed 31.7.19		
60	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на разпределителни табла	5 d	Thu 29.8.19	Mon 2.9.19		
61	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на осветителни тела	20 d	Thu 29.8.19	Tue 17.9.19		
62	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на ключове и контакти	20 d	Thu 29.8.19	Tue 17.9.19		
63	ДЕЙНОСТ 7	Част Електро - слаботоккови инсталации	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	БРИГАДА ЕЛЕКТРО	РАБОТНИ МАШИ стълба;п
64		Система за видеонаблюдение	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19		
65	ЗАДАЧА 1	Доставка и полагане на проводник RG6 и окабеляване	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
66	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19		
67	ЗАДАЧА 3	Доставка и монтаж на камери и рекордер	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19		

LEGEND

КРИТИЧЕН/Critical/
НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/
СУМАРЕН/Summary/



ПРЕКЪСВАНЕ/Split/
СЪБИТИЕ/Milestone/
Inactive Milestone




Inactive Summary
Manual Task
Duration-only


M
M
S

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

итители / Механизация

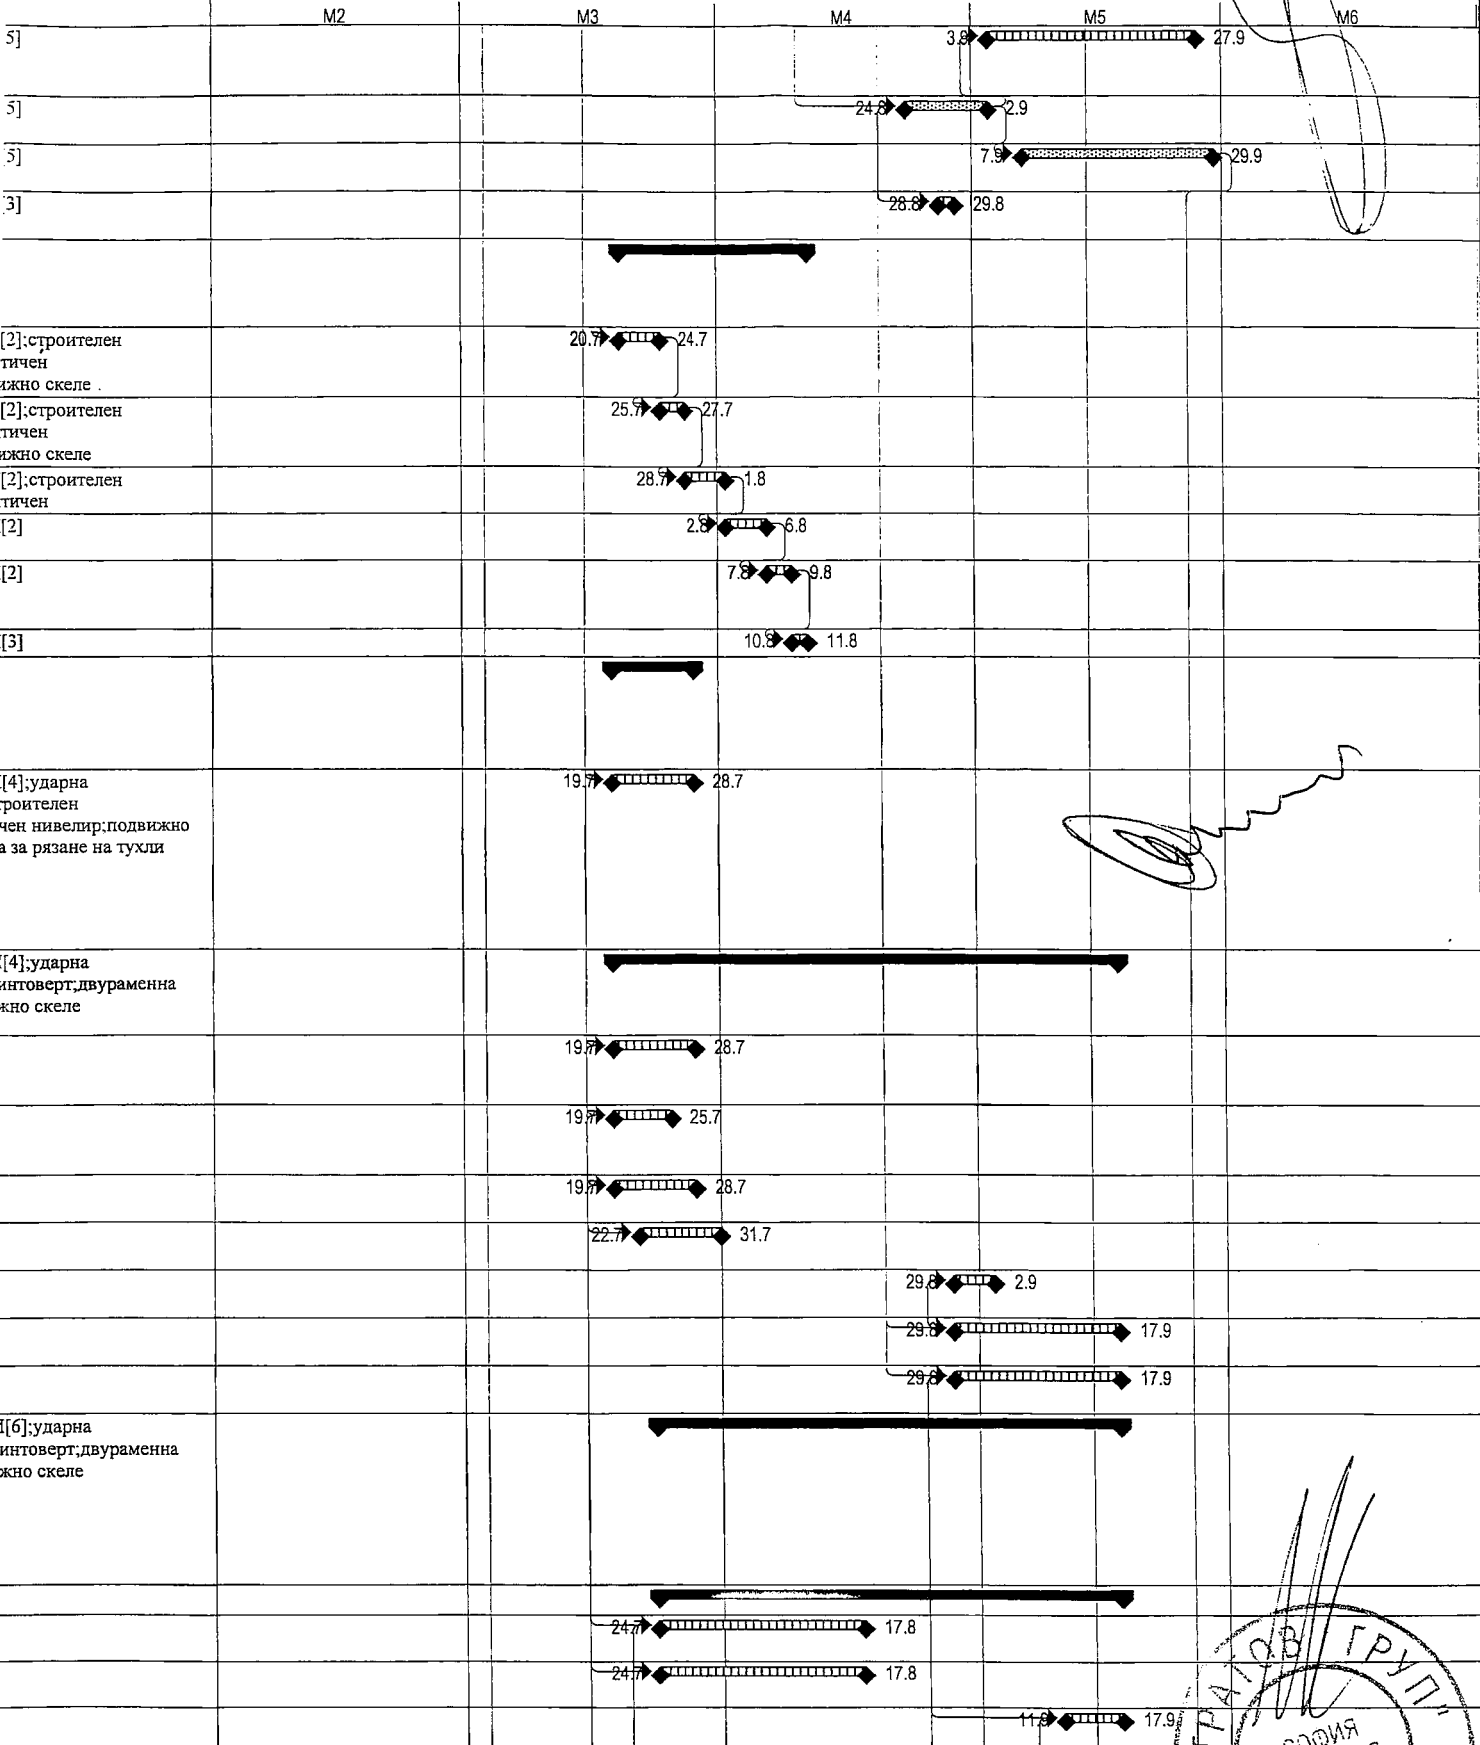

- al Summary Rollup ◆
- al Summary ◆
- aliv —
- Finish-only —
- External Tasks ◆
- External Milestone —



ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК


№	ЕТАП/ПОДЕТАЛ/ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	НАЧАЛО	КРАЙ	БРИГАДА	Ресурси
23		ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ ПО ЧАСТИ, когато това се налага в процеса на изпълнение на строителството за отразяване на несъществени изменения от ПП възникнали в процеса на строителството .	89 d	Fri 5.7.19	Tue 1.10.19		
24	ЕТАП 2	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР Обект: Преустройство и смяна на предназначението на помещения на Физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към Клиника по изгаряния и пластична хирургия към УМБАСЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД	89 d	Fri 5.7.19	Tue 1.10.19		
25		Протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка	1 d	Fri 5.7.19	Fri 5.7.19		
26	ДЕЙНОСТ 1	Временно строителство, включително обезопасяване на обекта и поставяне на обозначителни табели:	1 d	Sat 6.7.19	Sat 6.7.19		
27	ДЕЙНОСТ 2	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	12 d	Sun 7.7.19	Thu 18.7.19	Бригада "Демонтажни работи"	РАБОТНИ КЪРТА
28	ЗАДАЧА 1	Демонтаж на фаянс и дървена ламперия по стени	5 d	Sun 7.7.19	Thu 11.7.19		
29	ЗАДАЧА 1	Демонтаж на настилки - теракот, паркет, линолеум	7 d	Sun 7.7.19	Sat 13.7.19		
30	ЗАДАЧА 1	Демонтажни работи - тухлени и шахтови стени	10 d	Tue 9.7.19	Thu 18.7.19		
31	ЗАДАЧА 1	Демонтаж на гипсокартон на метални шендери стени	7 d	Tue 9.7.19	Mon 15.7.19		
32	ЗАДАЧА 1	Демонтаж на окачен таван - гипсокартон	7 d	Sun 7.7.19	Sat 13.7.19		
33	ЗАДАЧА 1	Демонтаж вътрешна дограма	7 d	Sun 7.7.19	Sat 13.7.19		
34	ДЕЙНОСТ 3	Довършителни архитектурно-строителни работи на II-ри етаж	73 d	Fri 19.7.19	Sun 29.9.19		
35	ЗАДАЧА 1	Нова зидария от газобетон за затваряне на фасаден отвор	1 d	Fri 19.7.19	Fri 19.7.19	БРИГАДАЗИДАРИ	РАБОТНИ НИВЕЛИ
36	ЗАДАЧА 2	Мазилка по стени вкл. Подготовка на съществуващи стени за нов латекс	5 d	Sat 20.7.19	Wed 24.7.19	БРИГАДАМАЗИЛКИ	РАБОТНИ НИВЕЛИ
37	ЗАДАЧА 3	Полагане на изравнителна циментова замазка	5 d	Sat 20.7.19	Wed 24.7.19	БРИГАДАЗАМАЗКИ	РАБОТНИ НИВЕЛИ
38	ЗАДАЧА 4	Нови стени от гипсокартон - преградни стени, шахтови стени, предстенни обшивки, обличане на метални колонни, усилване при отвори и санитарни прибори	25 d	Sat 20.7.19	Tue 13.8.19	БРИГАДА "СУХО СТРОИТЕЛСТВО"	РАБОТНИ НИВЕЛИ
39	ЗАДАЧА 5	Полагане на гранитогрес	7 d	Thu 25.7.19	Wed 31.7.19	БРИГАДАМОНТАЖНИЦИ - ГРАНИТОГРЕС	РАБОТНИ НИВЕЛИ
40	ЗАДАЧА 4	Окачен таван от гипсокартон - растерен, гладък, влагоустойчив, обличане на инсталационни трасета и оформяне връзка с фасадна дограма	20 d	Sat 24.8.19	Thu 12.9.19	БРИГАДА "СУХО СТРОИТЕЛСТВО"	РАБОТНИ НИВЕЛИ
41	ЗАДАЧА 6	Шпакловка и латекс по стени и таван	35 d	Wed 14.8.19	Tue 17.9.19	БРИГАДАШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	РАБОТНИ НИВЕЛИ

LEGEND

КРИТИЧЕН/Critical/

НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/

СУМАРЕН/Summary/



ПРЕКЪСВАНЕ/Split/

СЪБИТИЕ/Milestone/

Inactive Milestone




Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Механизация

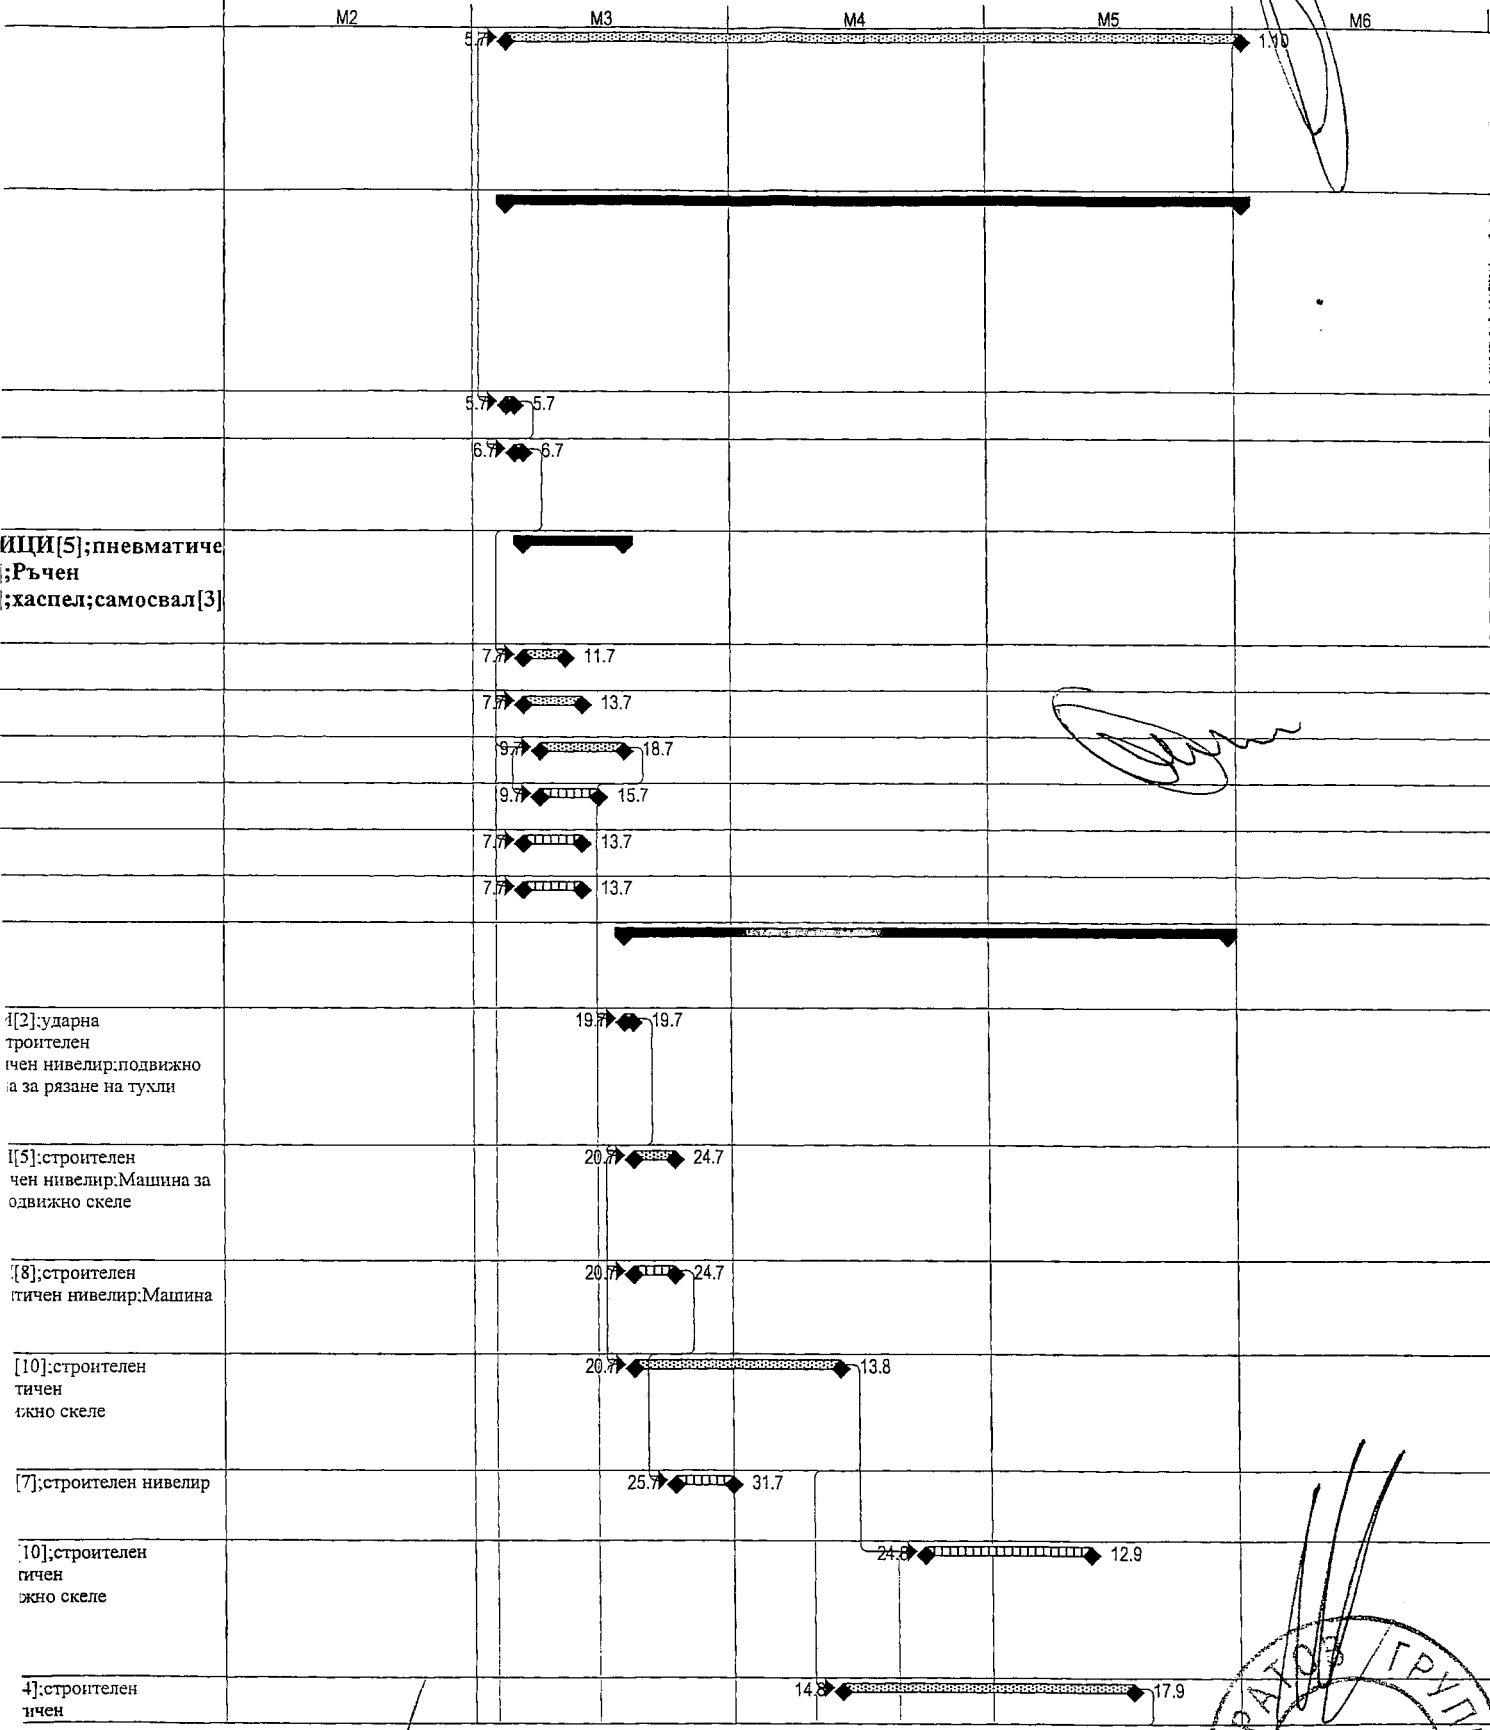

ИЦИ[5];пневматиче
;Ръчен
;хаспел;самосвал[3]

4[2];ударна
тронтелен
чен нивелир;подвижно
а за рязане на тухли

1[5];строителен
чен нивелир;Машина за
одвижно скеле

1[8];строителен
гичен нивелир;Машина


1[10];строителен
гичен
чно скеле

1[7];строителен нивелир

1[10];строителен
гичен
чно скеле

1[4];строителен
гичен

Summary Rollup Finish-only
 Summary External Tasks
 у External Milestone




ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФ


ID	Text1	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
40		Доставка и полагане на кабели в тръба и по скара	10 d	Mon 22.7.19	Wed 31.7.19	39SS+3 d
41		Доставка и монтаж на разпределитени табла	5 d	Thu 29.8.19	Mon 2.9.19	42SS
42		Доставка и монтаж на осветителни тела	20 d	Thu 29.8.19	Tue 17.9.19	21SS+5 d
43		Доставка и монтаж на ключове и контакти	20 d	Thu 29.8.19	Tue 17.9.19	21SS+5 d
44		Част Електро - слаботокови инсталации	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	
45		Система за видеонаблюдение	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	
46		Доставка и полагане на проводник RG6 и окабеляване	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	38SS+5 d
47		Доставка и монтаж на разклонителни кутии	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	38SS+5 d
48		Доставка и монтаж на камери и рекордер	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	43SS+13 d
49		Видеодомофонна система	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	
50		Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	46SS
51		Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19	50SS+3 d
52		Доставка и монтаж на оборудване - камера, видеомонитор	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	48SS
53		Пожароизвестителна система	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	
54		Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	50SS
55		Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19	54SS+3 d
56		Доставка и монтаж на оборудване - пожарозвестители, звукови сигнализатори, модули за управление	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	52SS
57		Локална радиосистема	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	
58		Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	54SS
59		Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19	58SS+3 d
60		Доставка и монтаж на оборудване - високоговорители, атенюатори	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	56SS
61		Вътрешна кабелна телевизионна система	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	

Project: stadion2-12216-2kashtiELEKT Date: Wed 29.5.19	Task		Project Summary		Inactive Milestone
	Split		External Tasks		Inactive Summary
	Milestone		External Milestone		Manual Task
	Summary		Critical		Duration-only

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

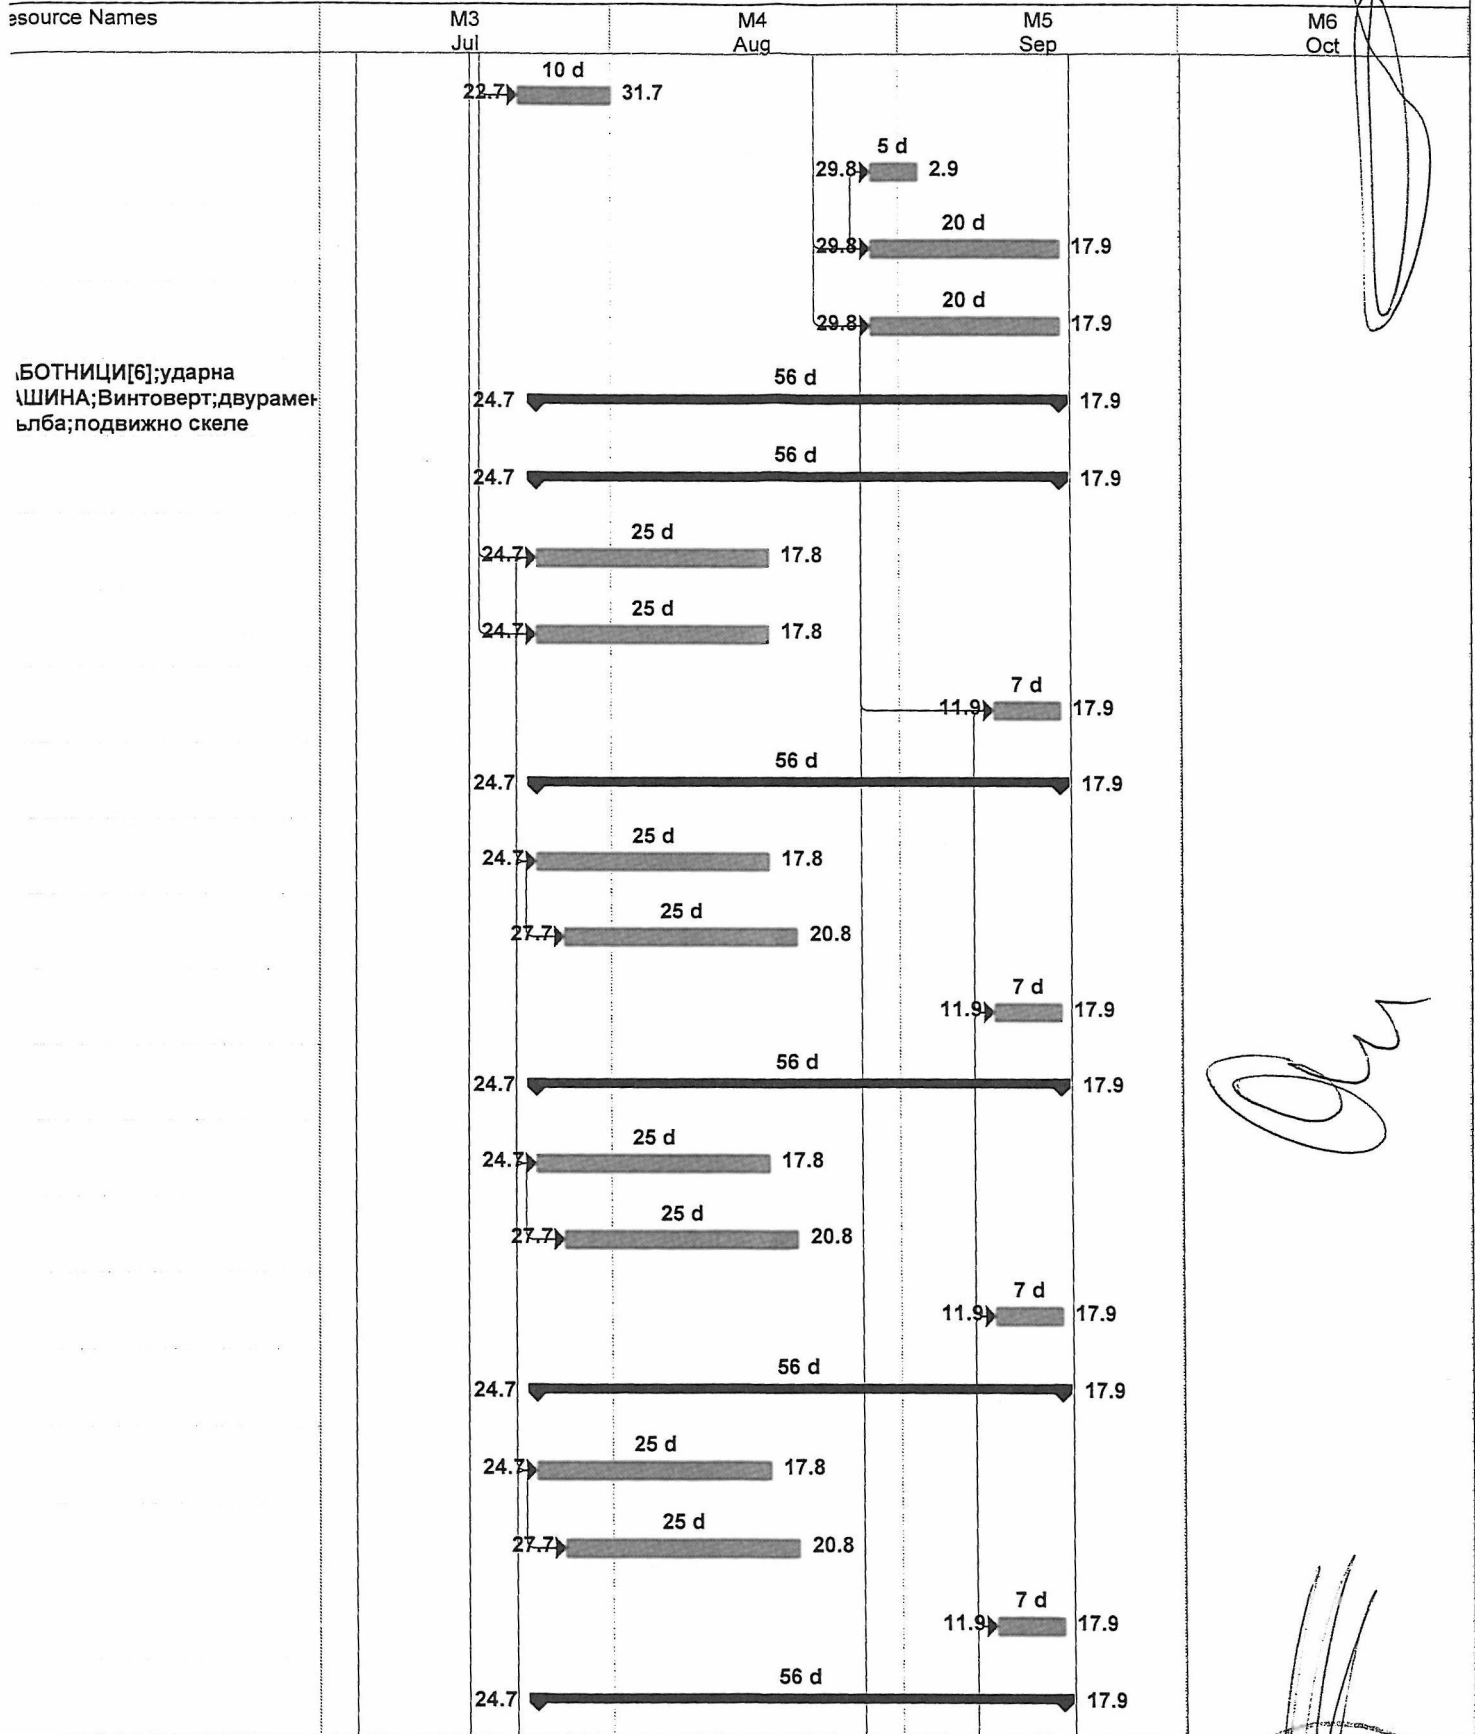

Handwritten signature



Handwritten signature

КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД

- Manual Summary Rollup ◆
- Manual Summary ◆
- Start-only
- Finish-only
- External Tasks ◆
- External Milestone
- Progress
- Deadline

ID	Text1	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor
62		Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	58SS
63		Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19	62SS+3 d
64		Доставка и монтаж на оборудване - букси, радиоразклонители	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	60SS
65		ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И СКС - компютърна и интернет	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	
66		Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	62SS
67		Окабеляване	25 d	Tue 30.7.19	Fri 23.8.19	63SS+3 d
68		Доставка и монтаж на оборудване - кутии, модули	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	64SS
69		Система за контрол на достъпа	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	
70		Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	66SS
71		Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19	70SS+3 d
72		Доставка и монтаж на оборудване - четци, контролери	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	68SS
73		Система - паник охрана	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	
74		Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	70SS
75		Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19	74SS+3 d
76		Доставка и монтаж на оборудване - розетки, паник-бутони, контролни панели	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	72SS
77		Сестринска система	56 d	Wed 24.7.19	Tue 17.9.19	
78		Доставка и полагане на гофрирани тръби	25 d	Wed 24.7.19	Sat 17.8.19	74SS
79		Окабеляване	25 d	Sat 27.7.19	Tue 20.8.19	78SS+3 d
80		Доставка и монтаж на оборудване - модули и панели	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	76SS
81		Част ОВК	68 d	Fri 19.7.19	Tue 24.9.19	
82		Вентилация	61 d	Fri 19.7.19	Tue 17.9.19	

Project: stadion2-12216-2kashtiELEKT Date: Wed 29.5.19	Task		Project Summary		Inactive Miles
	Split		External Tasks		Inactive Sum
	Milestone		External Milestone		Manual Task
	Summary		Critica		Duration-only

А ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР


Source Names

M3
Jul

M4
Aug

M5
Sep

M6
Oct

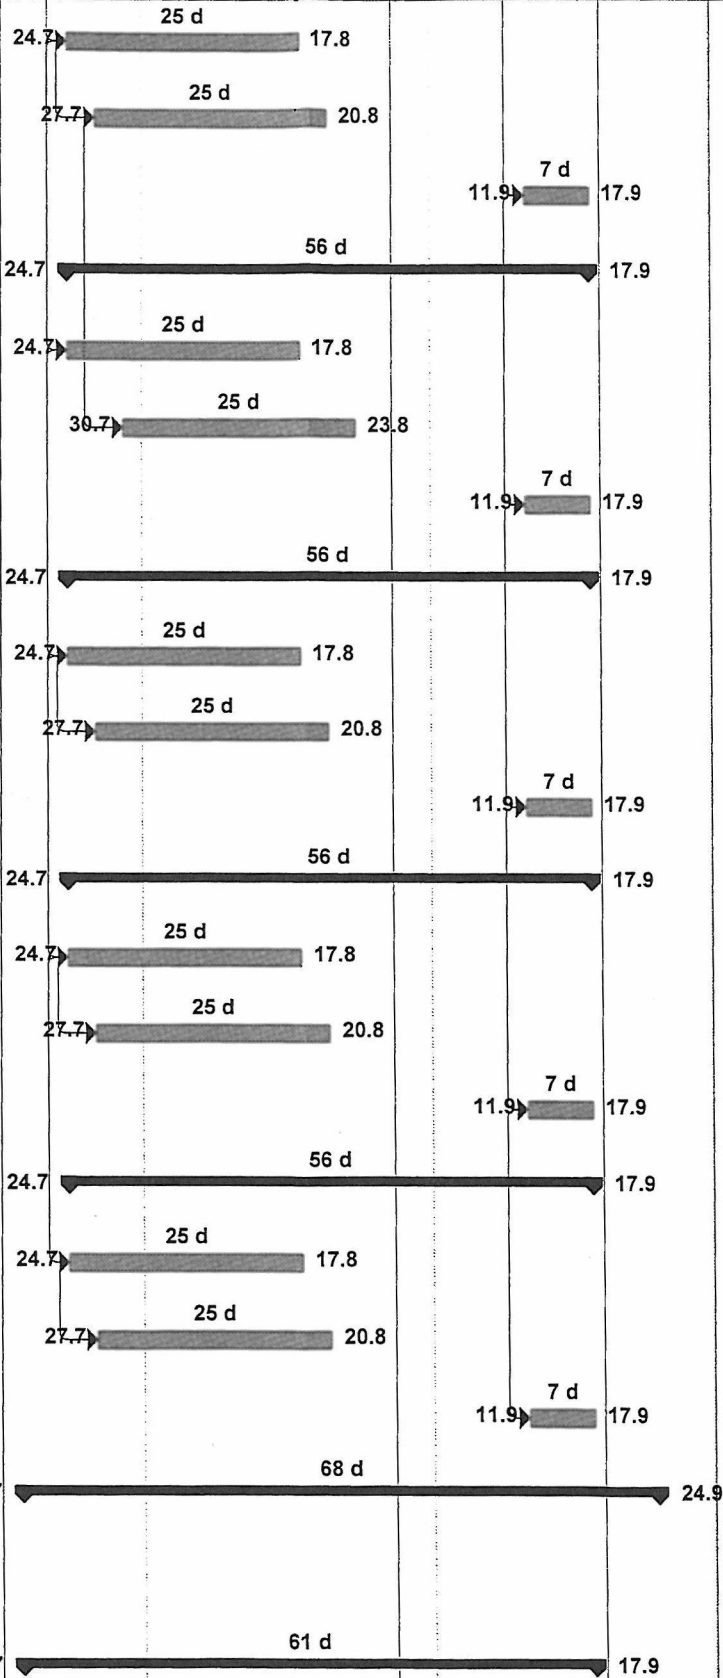

БОТНИЦИ[6];ударна
машина;строителен
зелир

- Manual Summary Rollup ◆
- Manual Summary ◆
- Start-only
- Finish-only
- External Tasks ◆
- External Milestone
- Progress
- Deadline



ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФ

ID	Text1	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
83		Въздуховоди от поцинкована ламарина вкл. Колена и преходи	20 d	Fri 19.7.19	Wed 7.8.19	39SS
84		Оборудване - вентилатори, вентилационен блок и въздухонагревател, решетки	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	43SS+13 d
85		Климатизация	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	
86		Климатизатор мултисплит-система	7 d	Wed 11.9.19	Tue 17.9.19	84SS
87		Отопление	68 d	Fri 19.7.19	Tue 24.9.19	
88		Демонтажни работи - радиатори и тръбна разводка	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19	37SS
89		Доставка и полагане на полипропиленови тръби	15 d	Fri 19.7.19	Fri 2.8.19	83SS
90		Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори	7 d	Wed 18.9.19	Tue 24.9.19	22
91		Част ВИК	68 d	Fri 19.7.19	Tue 24.9.19	
92		Демонтажни работи - поцинковани тръби и санитария	10 d	Fri 19.7.19	Sun 28.7.19	88SS
93		Доставка и полагане на тръби - поцинковани, полипропиленови, PVC тръби, вкл. СК и фасонни части	30 d	Fri 19.7.19	Sat 17.8.19	89SS
94		Доставка и монтаж на смесителни батерии и санитария	7 d	Wed 18.9.19	Tue 24.9.19	90SS
95		Част Медицински газове	38 d	Sun 18.8.19	Tue 24.9.19	
96		Доставка и полагане на медни тръби вкл. Колена и тръници	30 d	Sun 18.8.19	Mon 16.9.19	93
97		Доставка и монтаж на етажно газоразпределително табли, дози	7 d	Wed 18.9.19	Tue 24.9.19	94SS
98		Строителни отпадъци	85 d	Sun 7.7.19	Sun 29.9.19	9SS
99		Демобилизация и почистване	1 d	Mon 30.9.19	Mon 30.9.19	25
100		КОНСТАТИВЕН АКТ ОБР. 15	1 d	Tue 1.10.19	Tue 1.10.19	99

Project: stadion2-12216-2kashtiELEKT
Date: Wed 29.5.19

Task		Project Summary		Inactive Mile:
Split		External Tasks		Inactive Surr
Milestone		External Milestone		Manual Task
Summary		Critica		Duration-only

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР


source Names

M3
Jul

M4
Aug

M5
Sep

M6
Oct

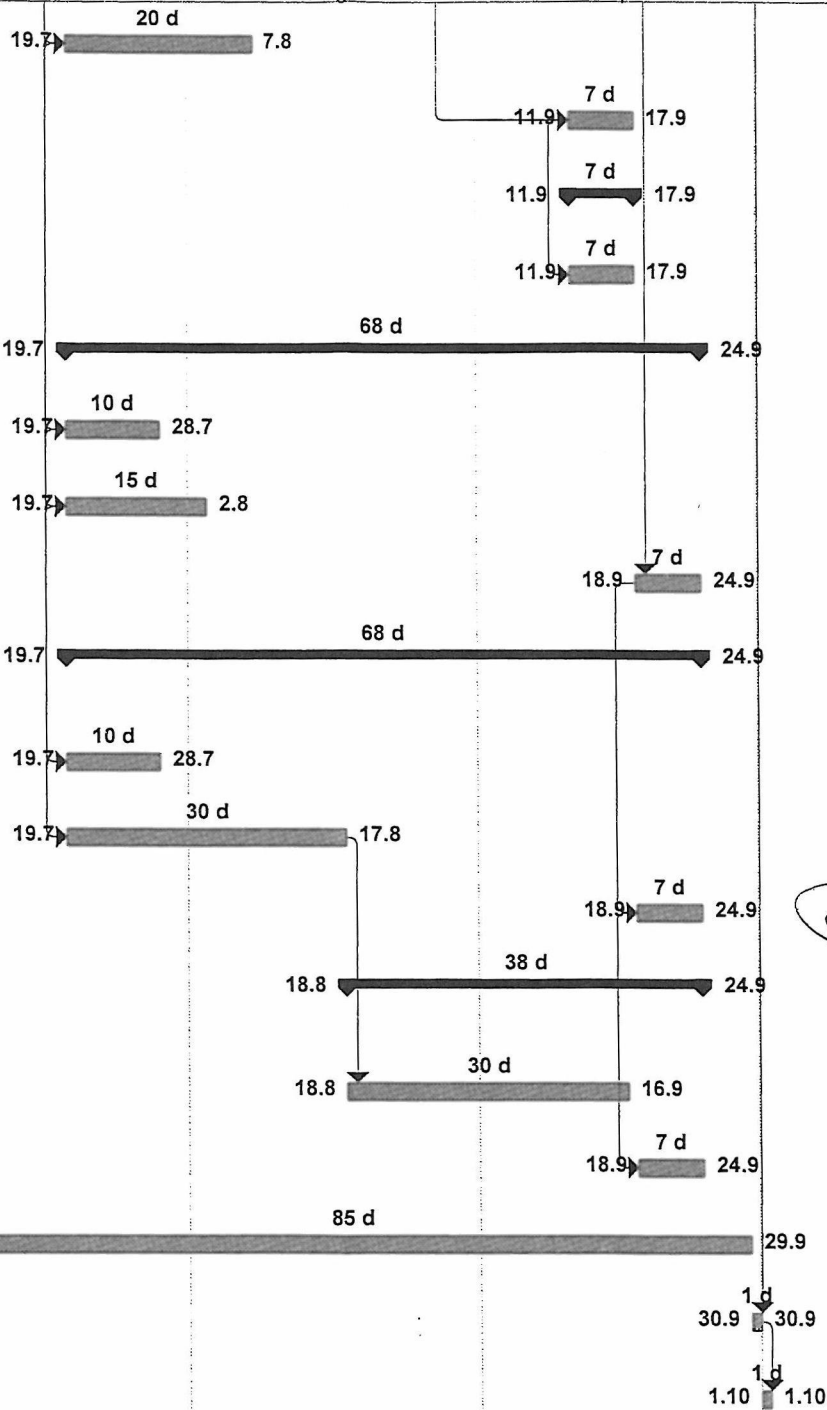

РАБОТНИЦИ[4];ударна
МАШИНА;строителен
ивелир;поаялник за РР
ръби;Резбонарезна

РАБОТНИЦИ[5];ударна
юрмашина;строителен
ивелир;поаялник за медни
ръби[2]

- Manual Summary Rollup ◆
- Manual Summary ◆
- Start-only
- Finish-only

- External Tasks ◆
- External Milestone
- Progress
- Deadline



**Обща диаграма на заетостта на експертите -
Инвестиционно проектиране**





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Диаграма на заетостта на отделните експерти - Инвестиционно проектиране

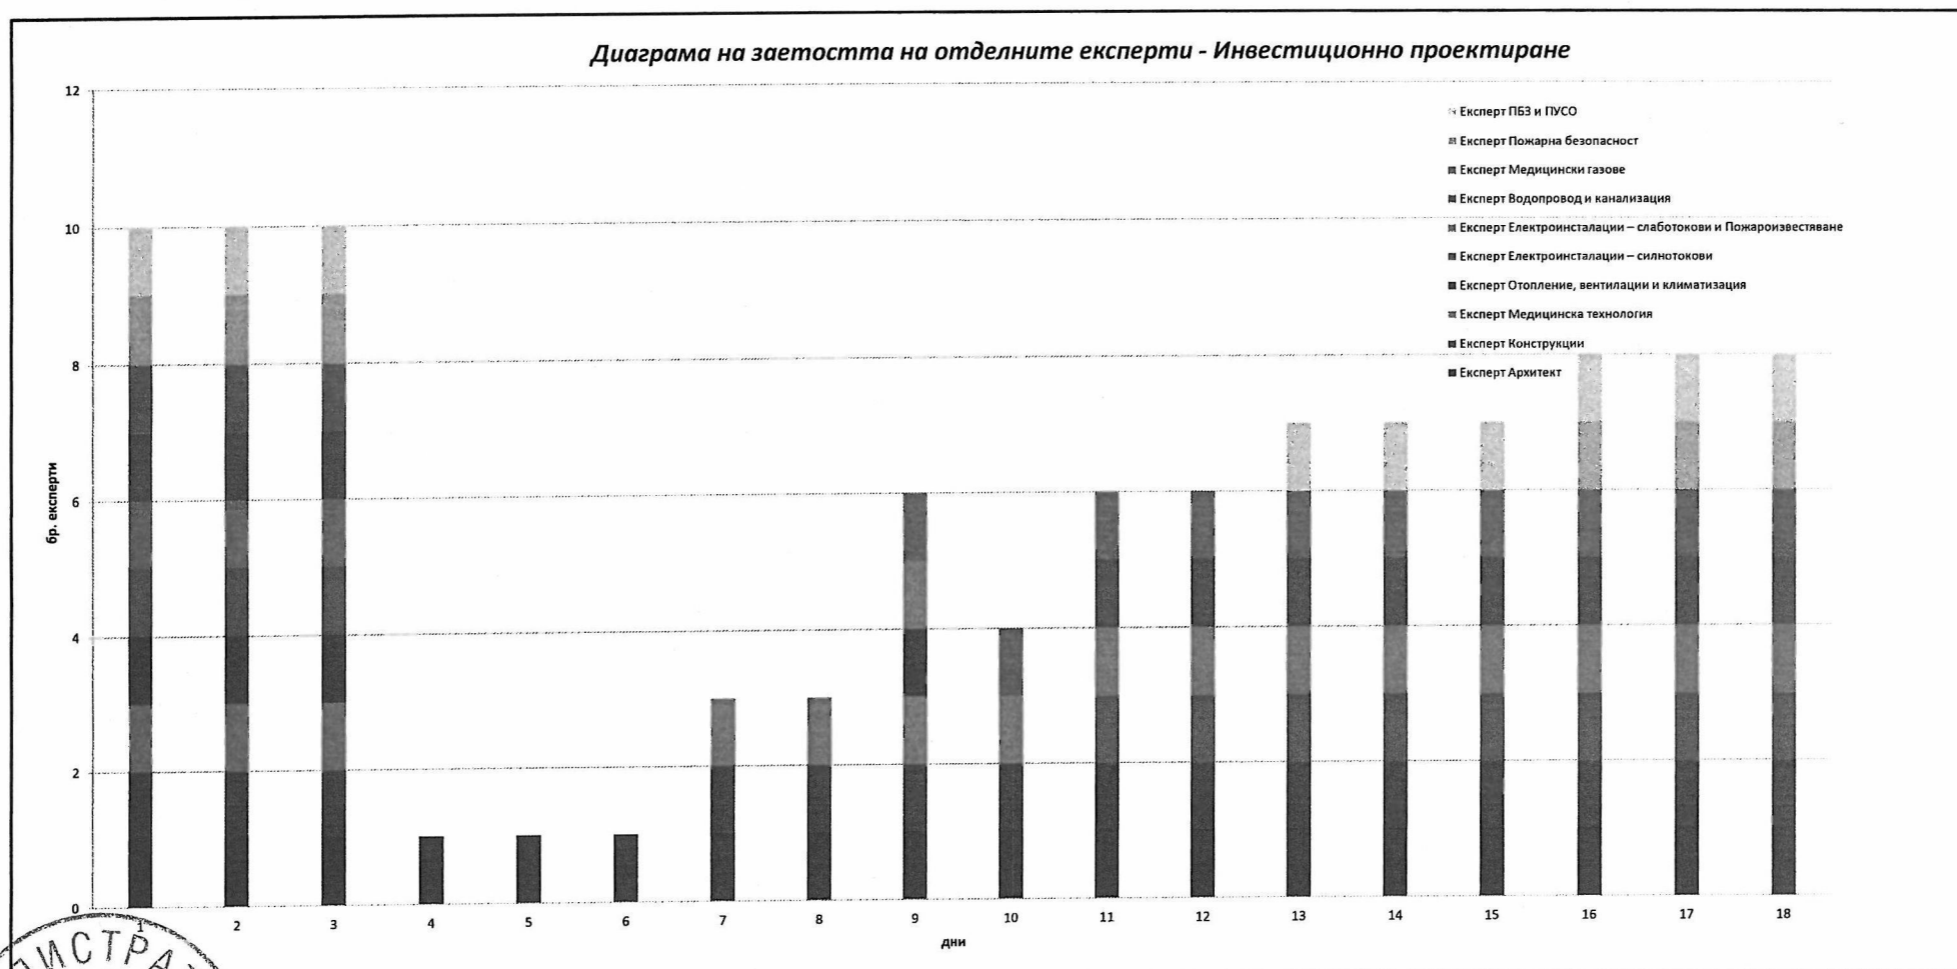


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

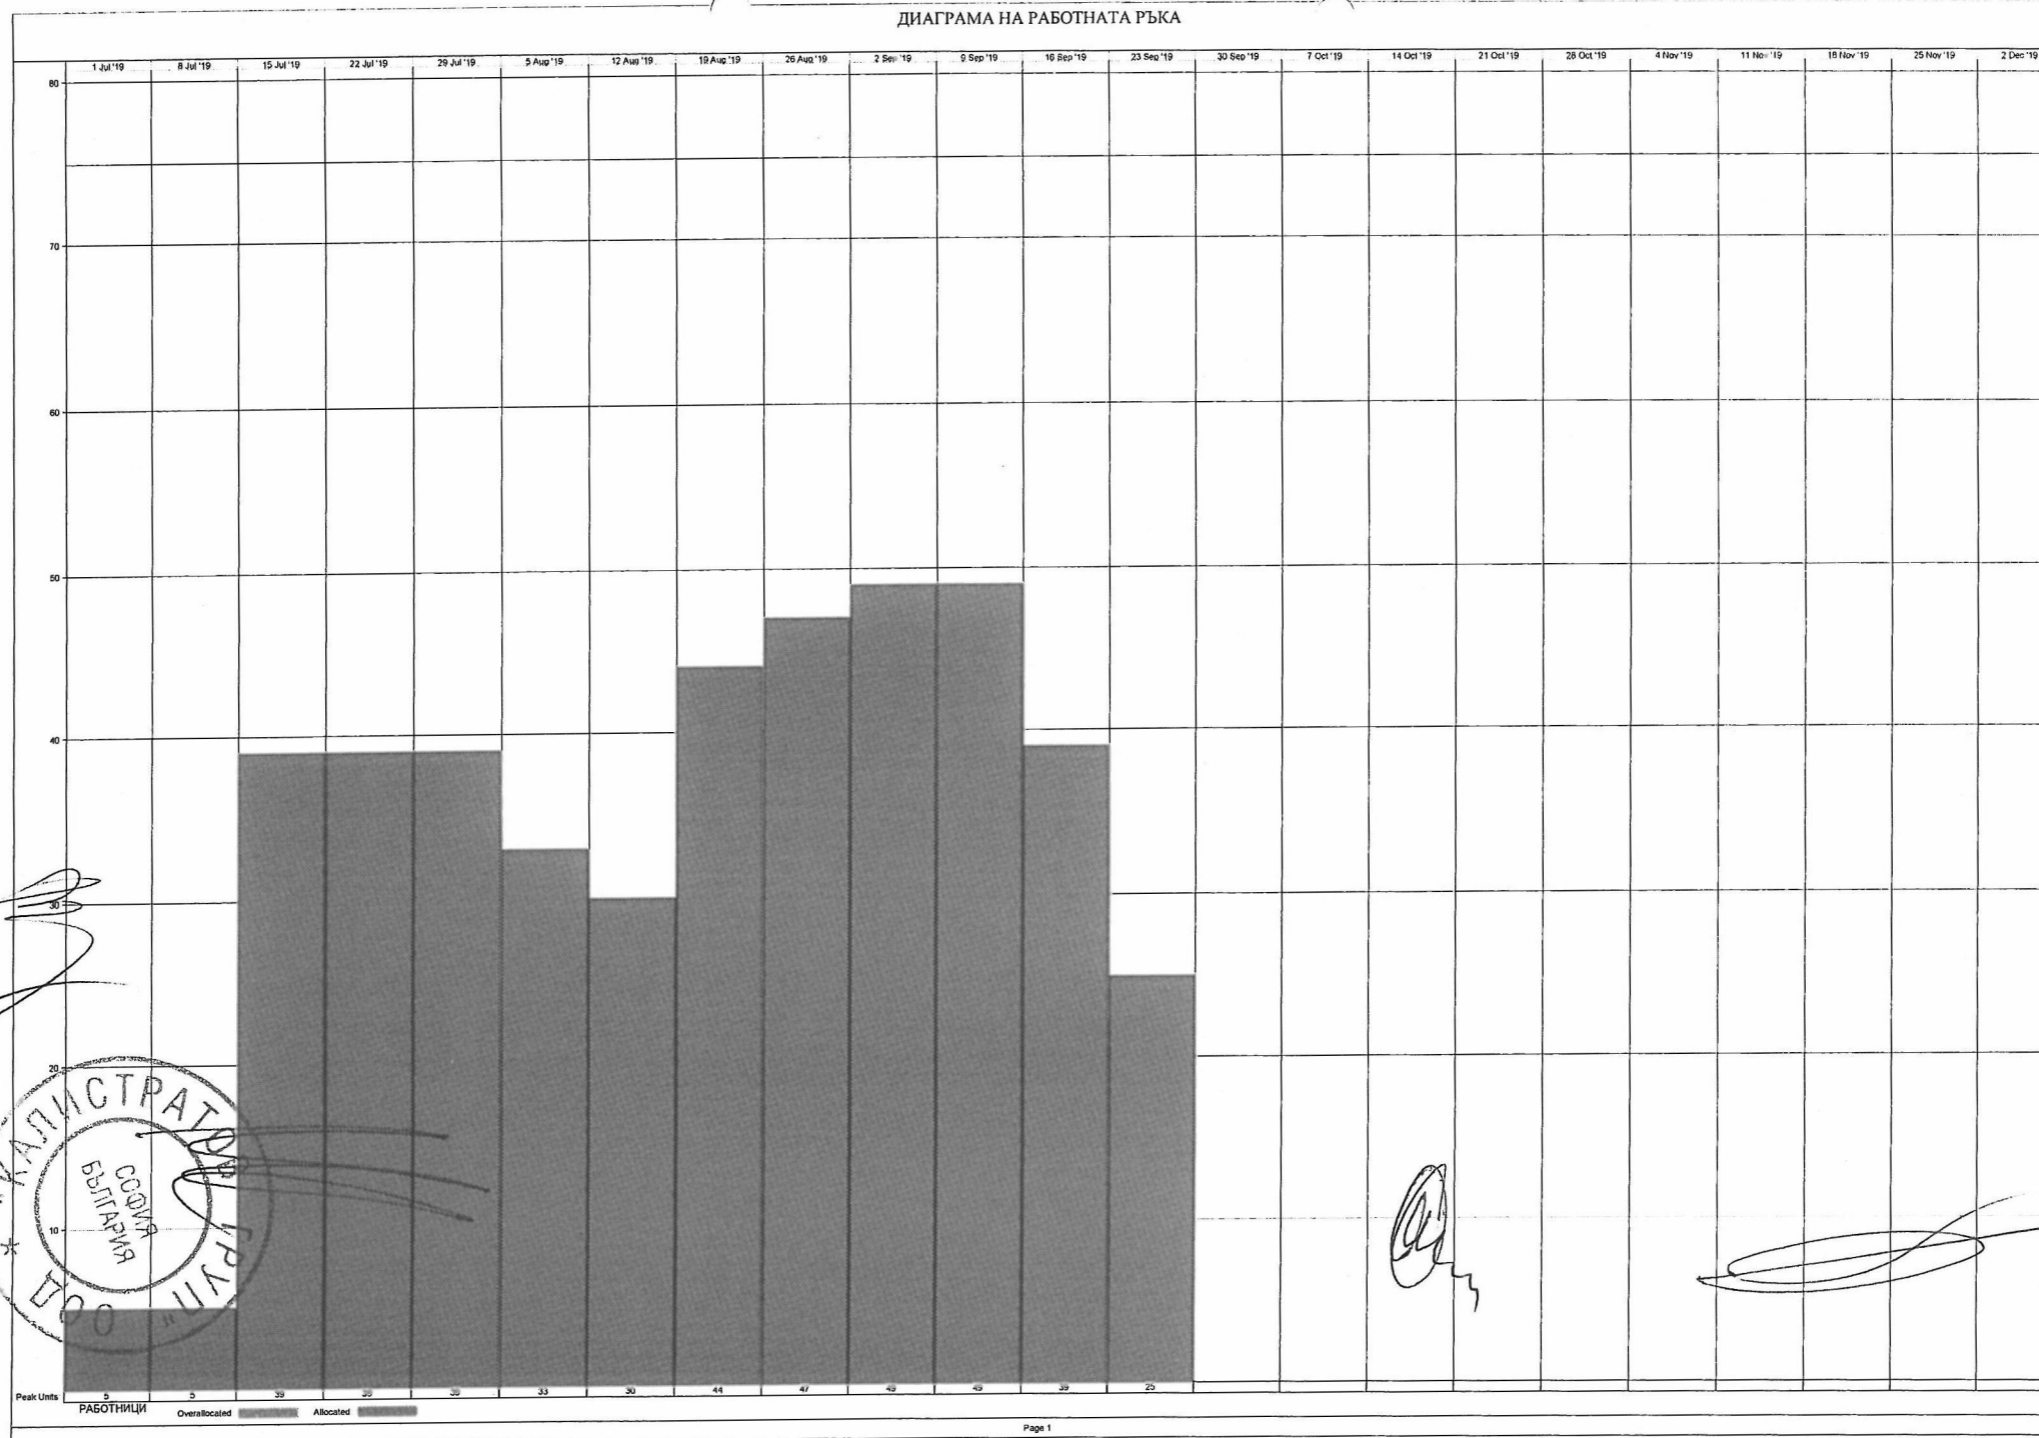

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Peak Units
РАБОТНИЦИ
Overallocated
Allocated

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

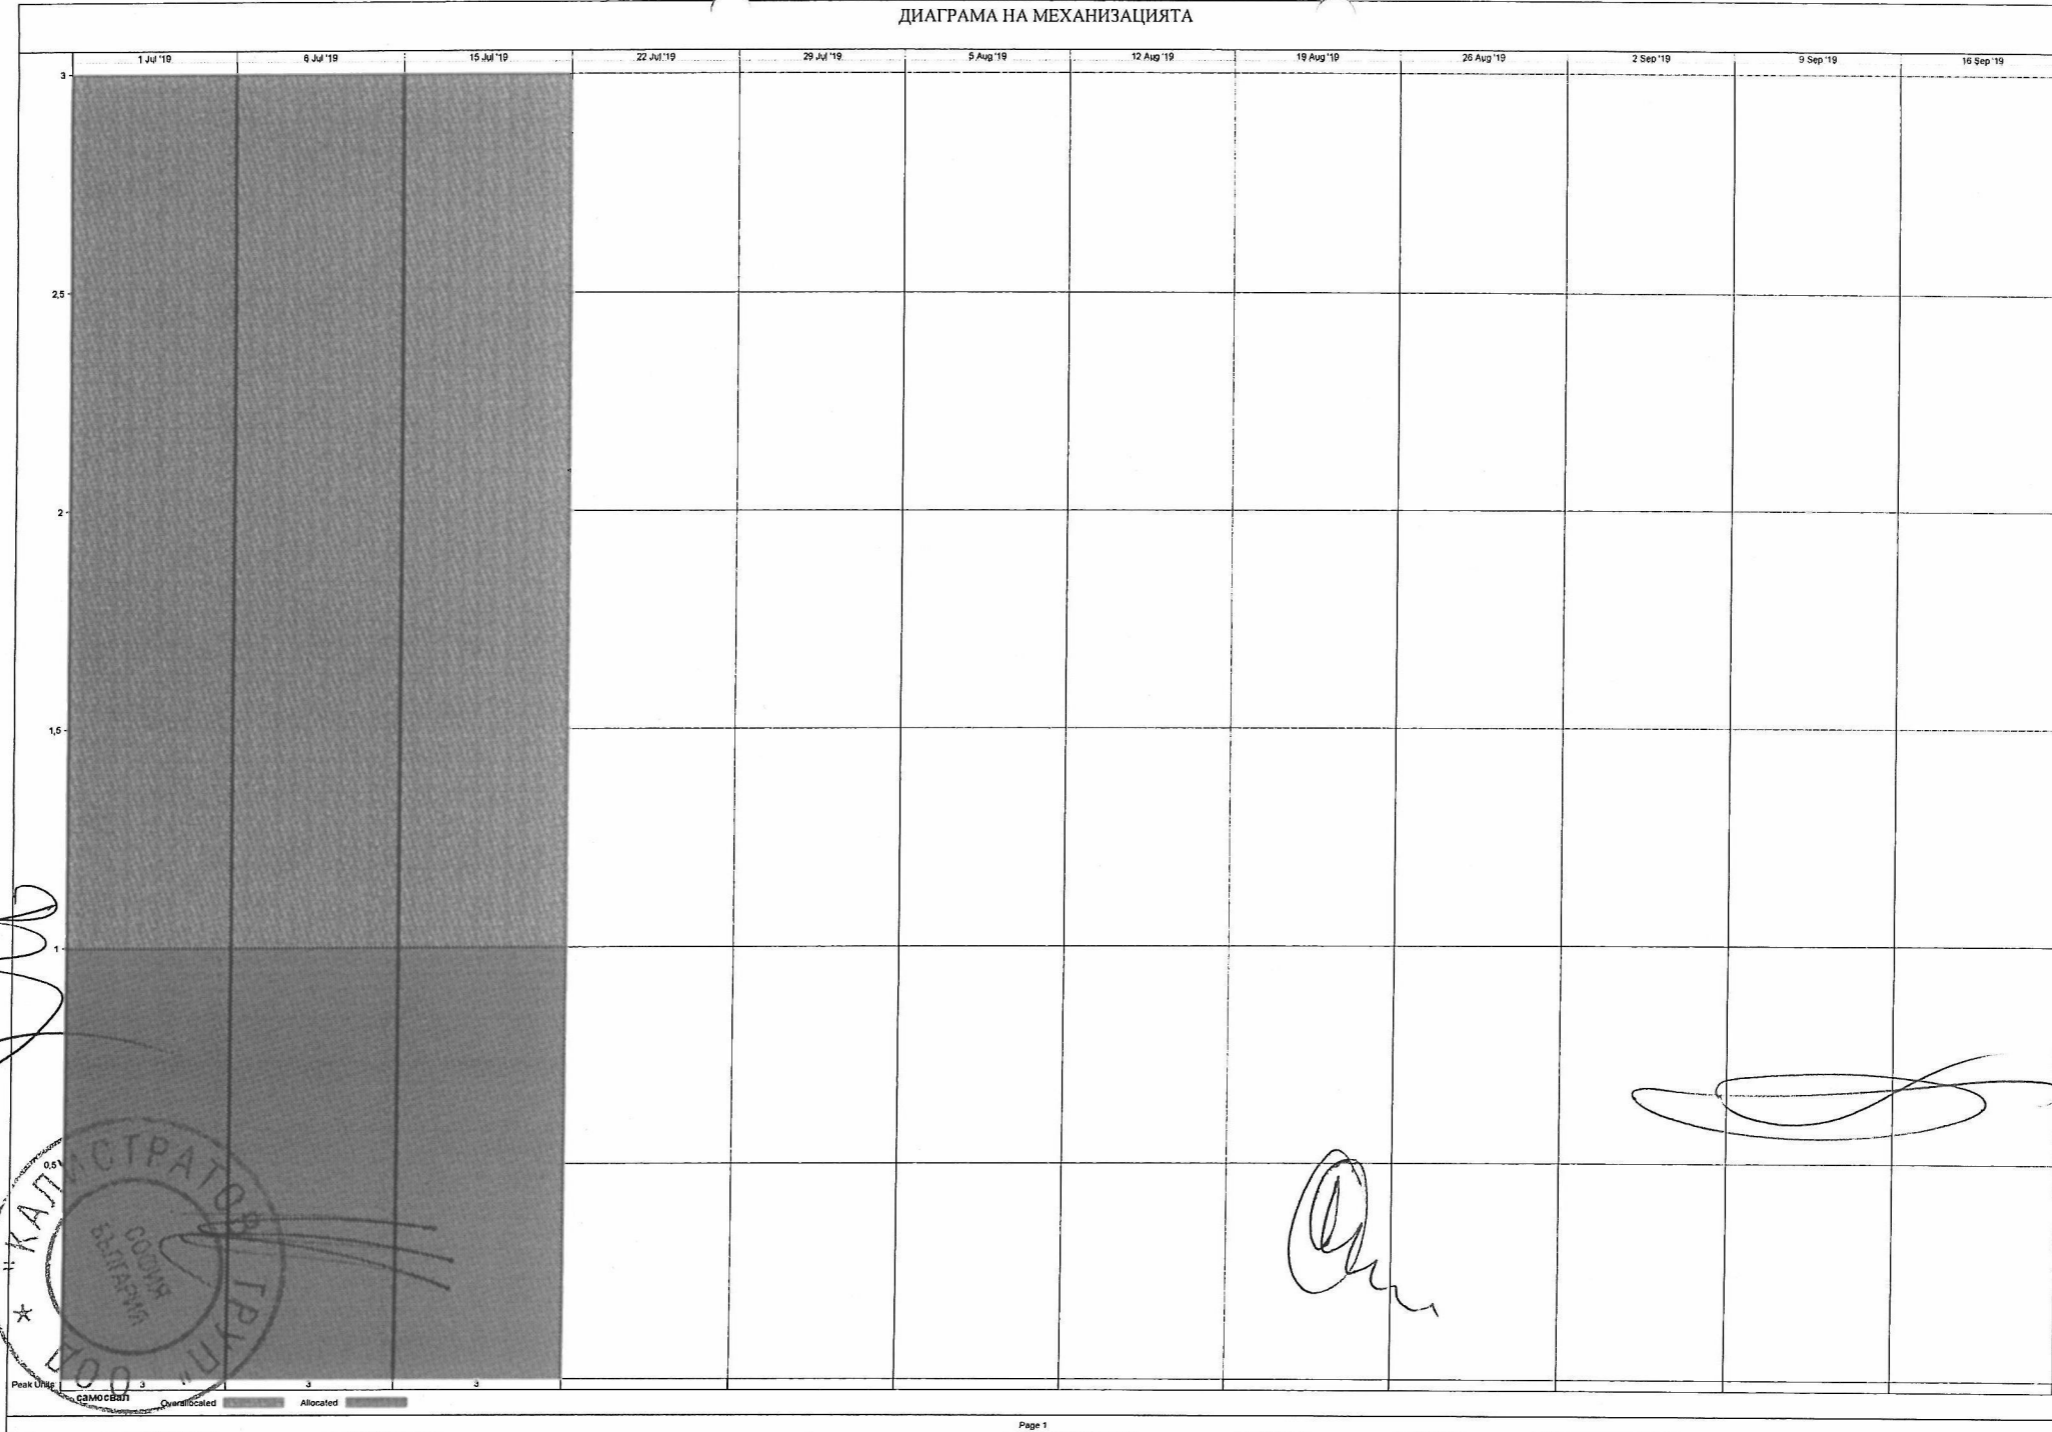


ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

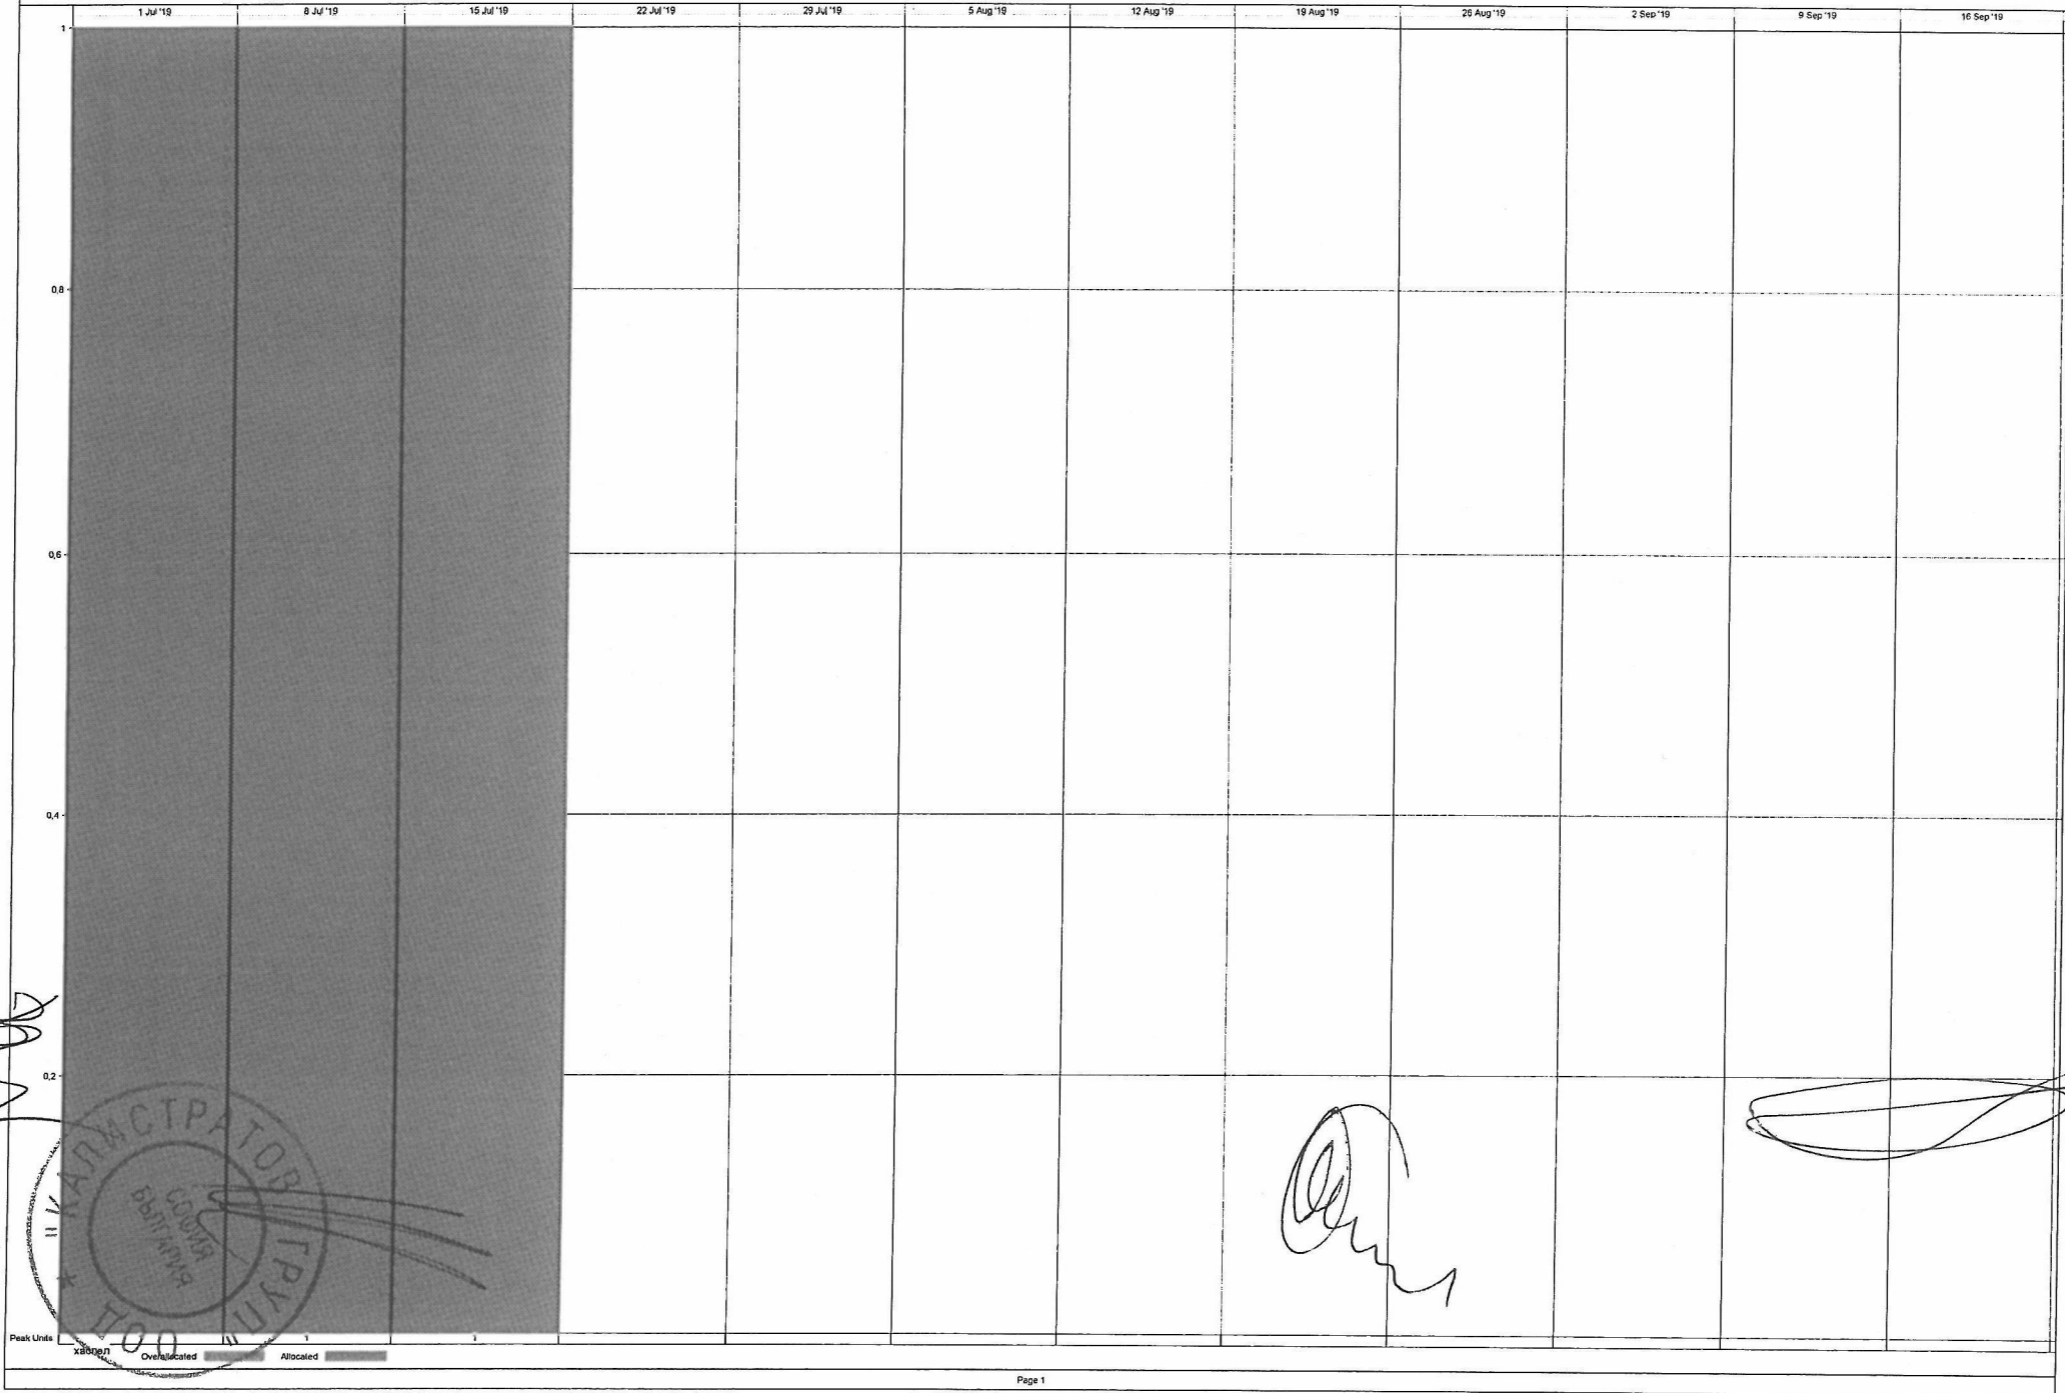

Peak Link
X100001
OverAllocated
Allocated

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

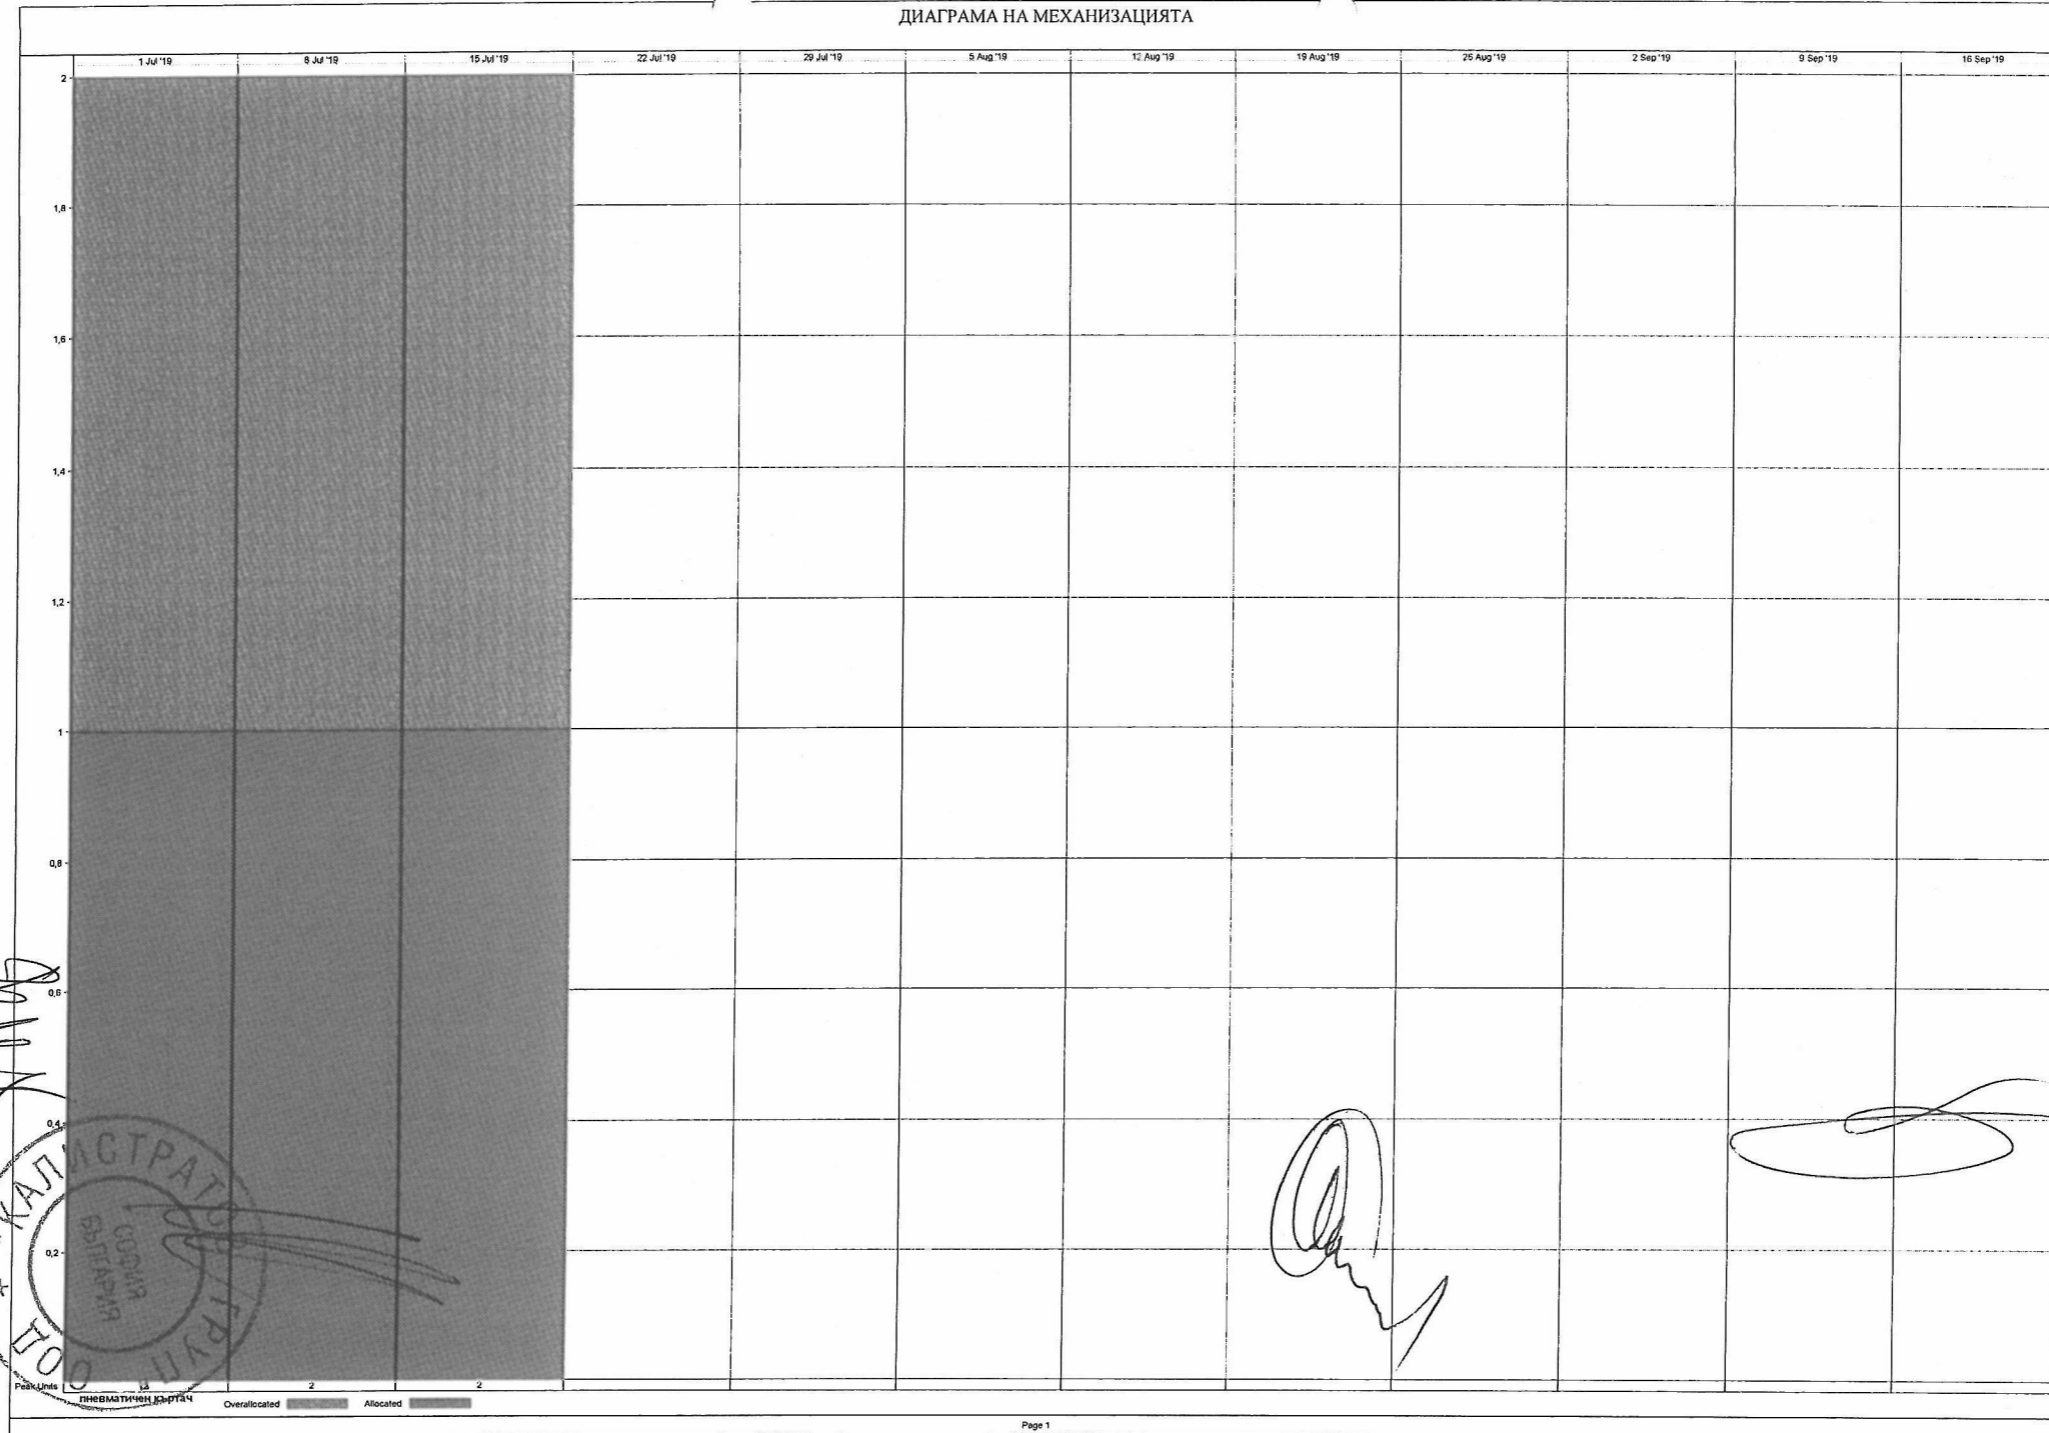


[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

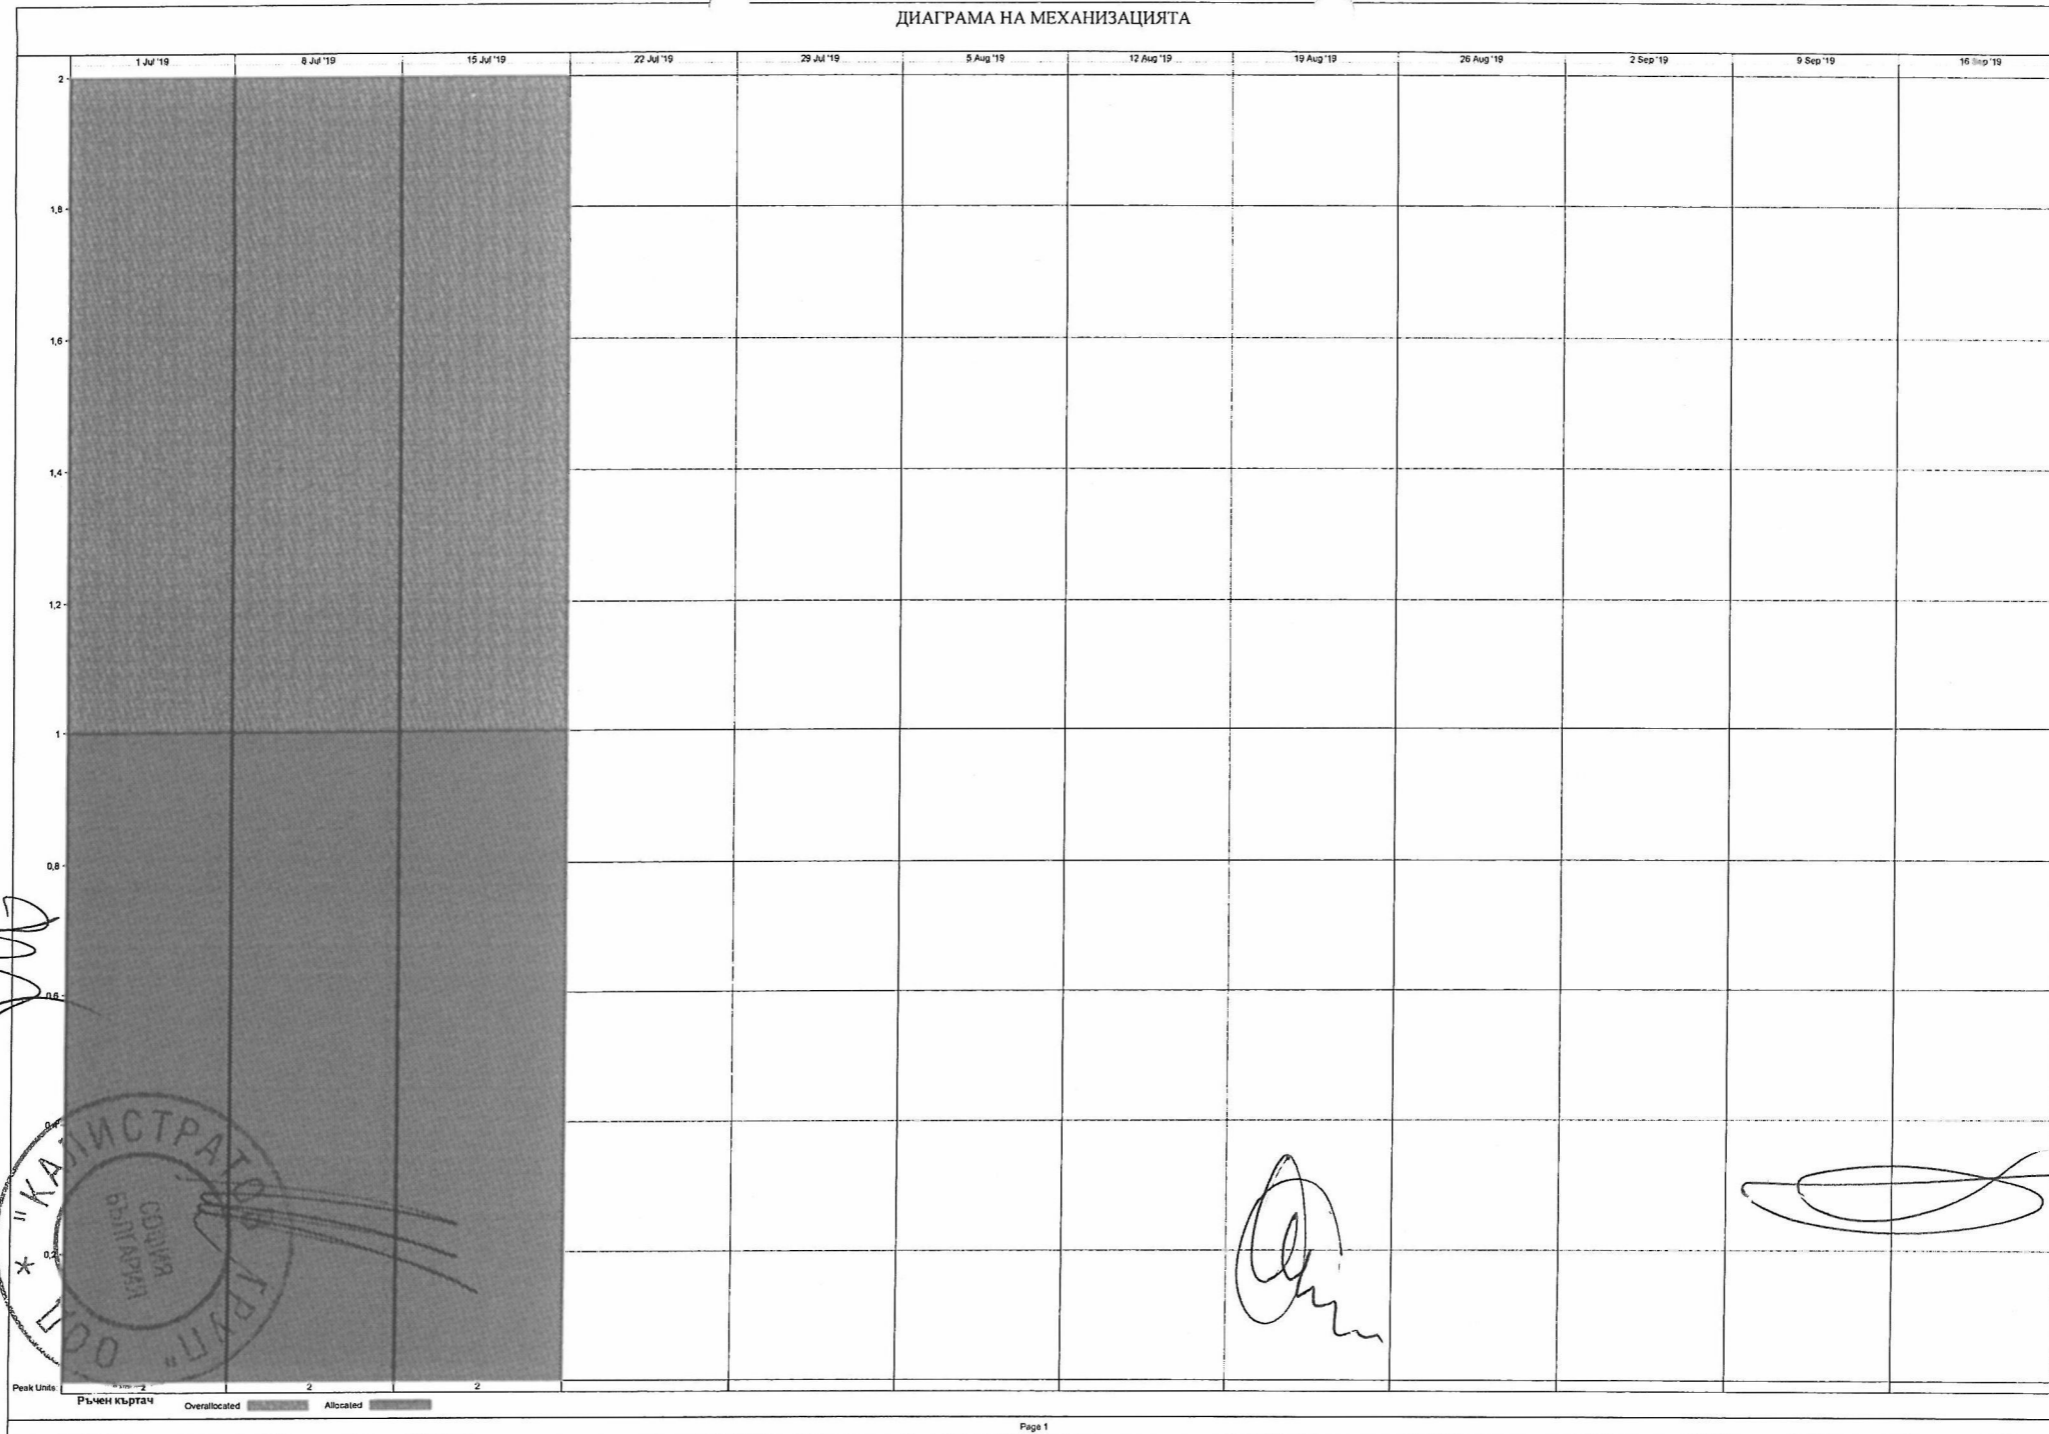

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

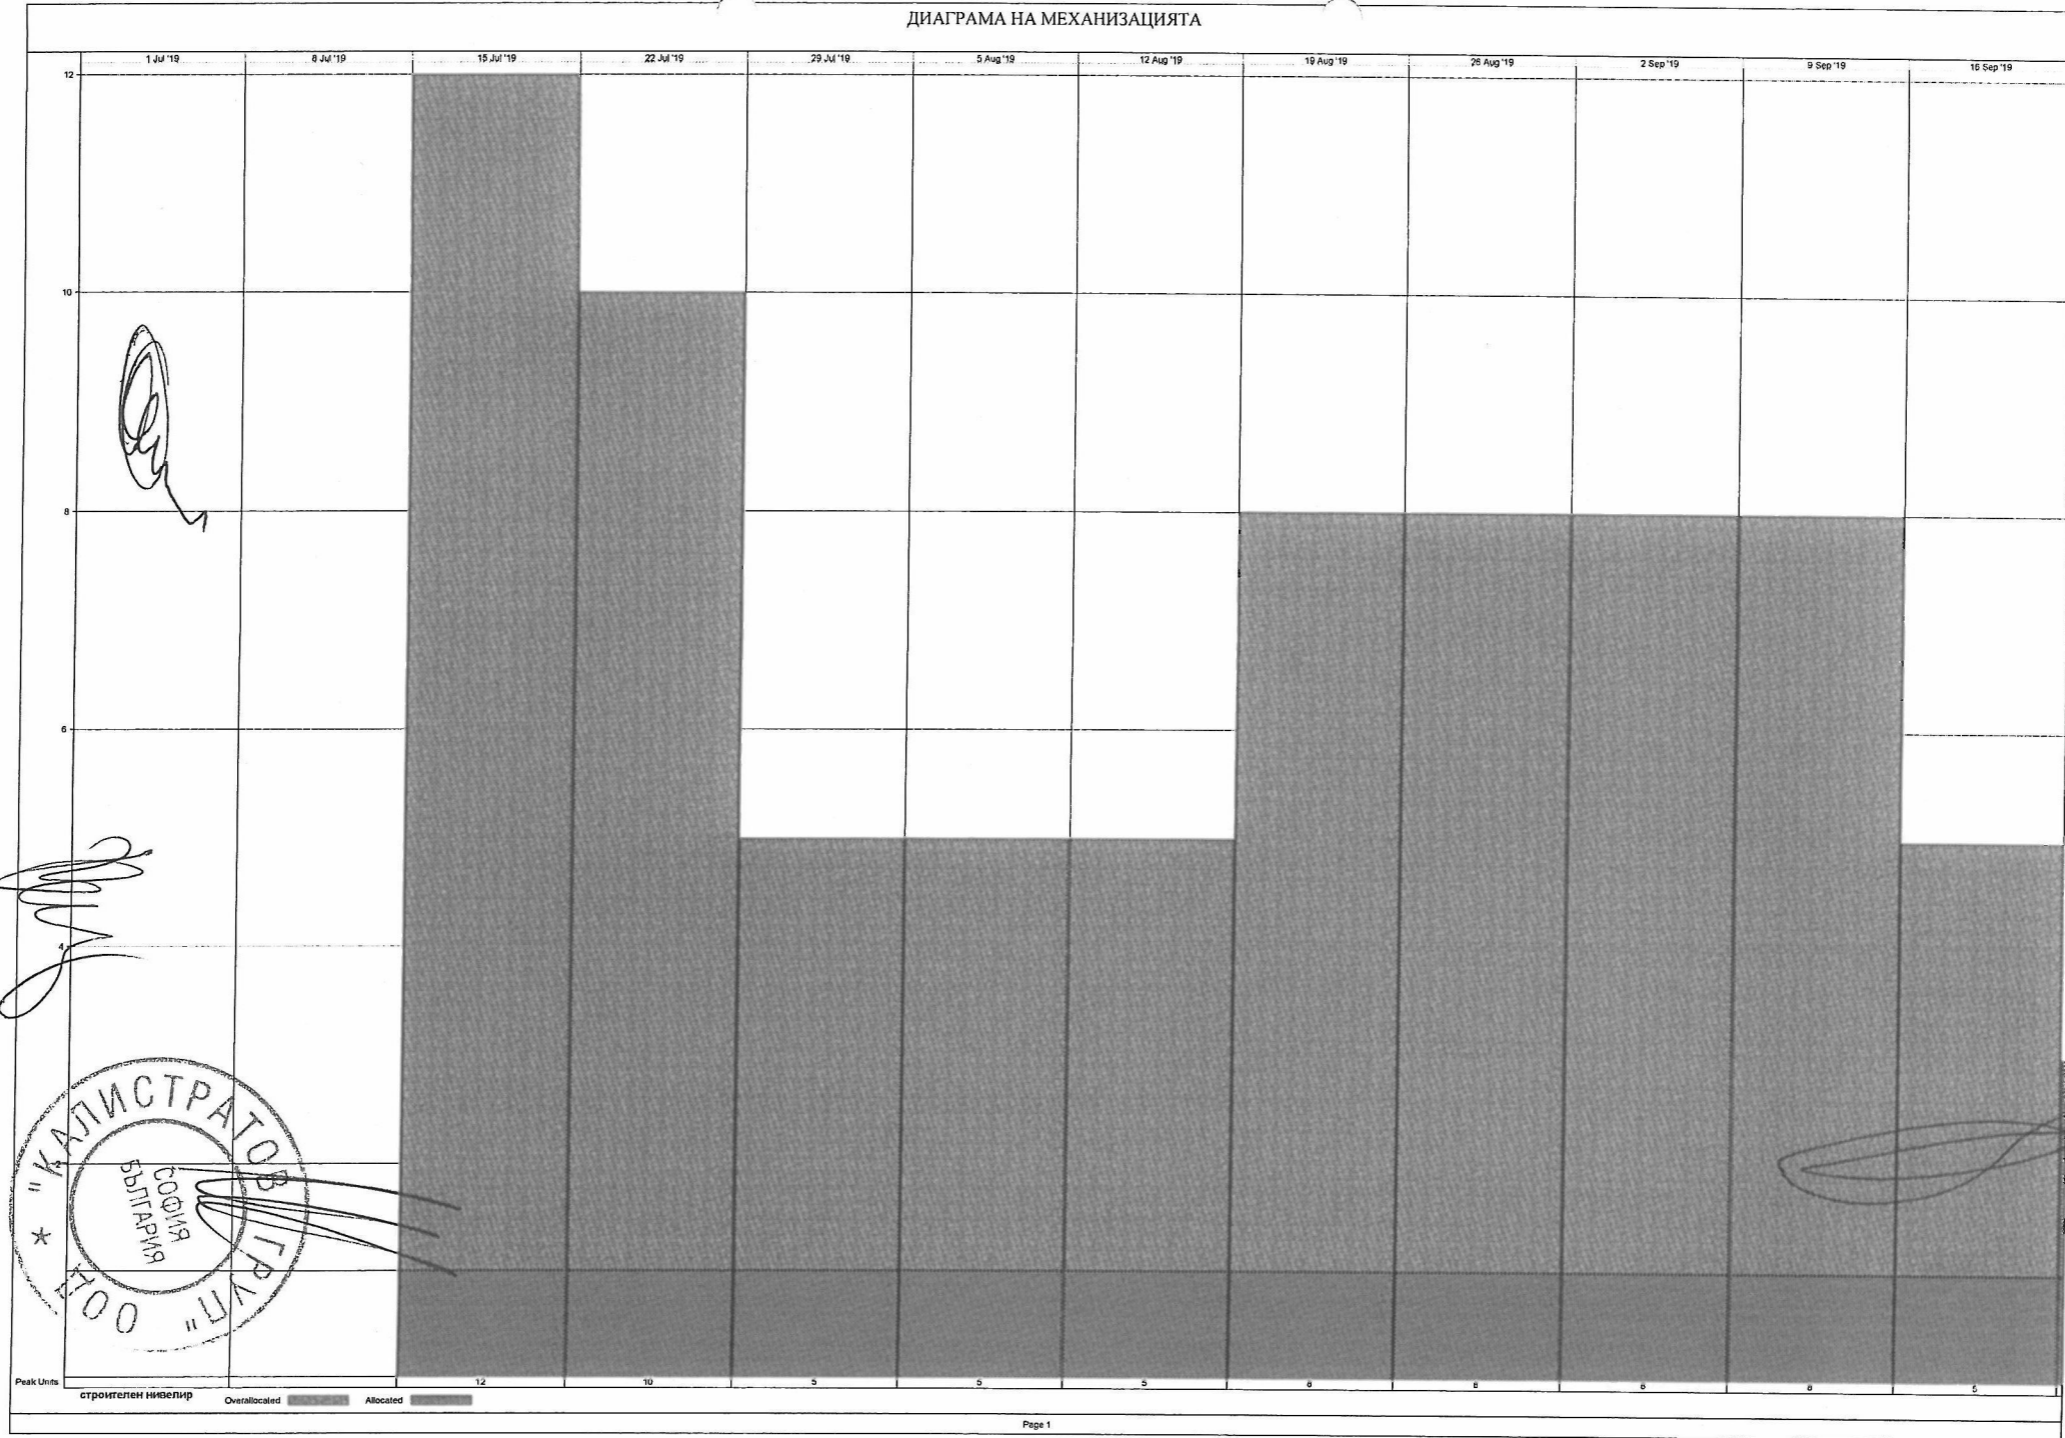

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

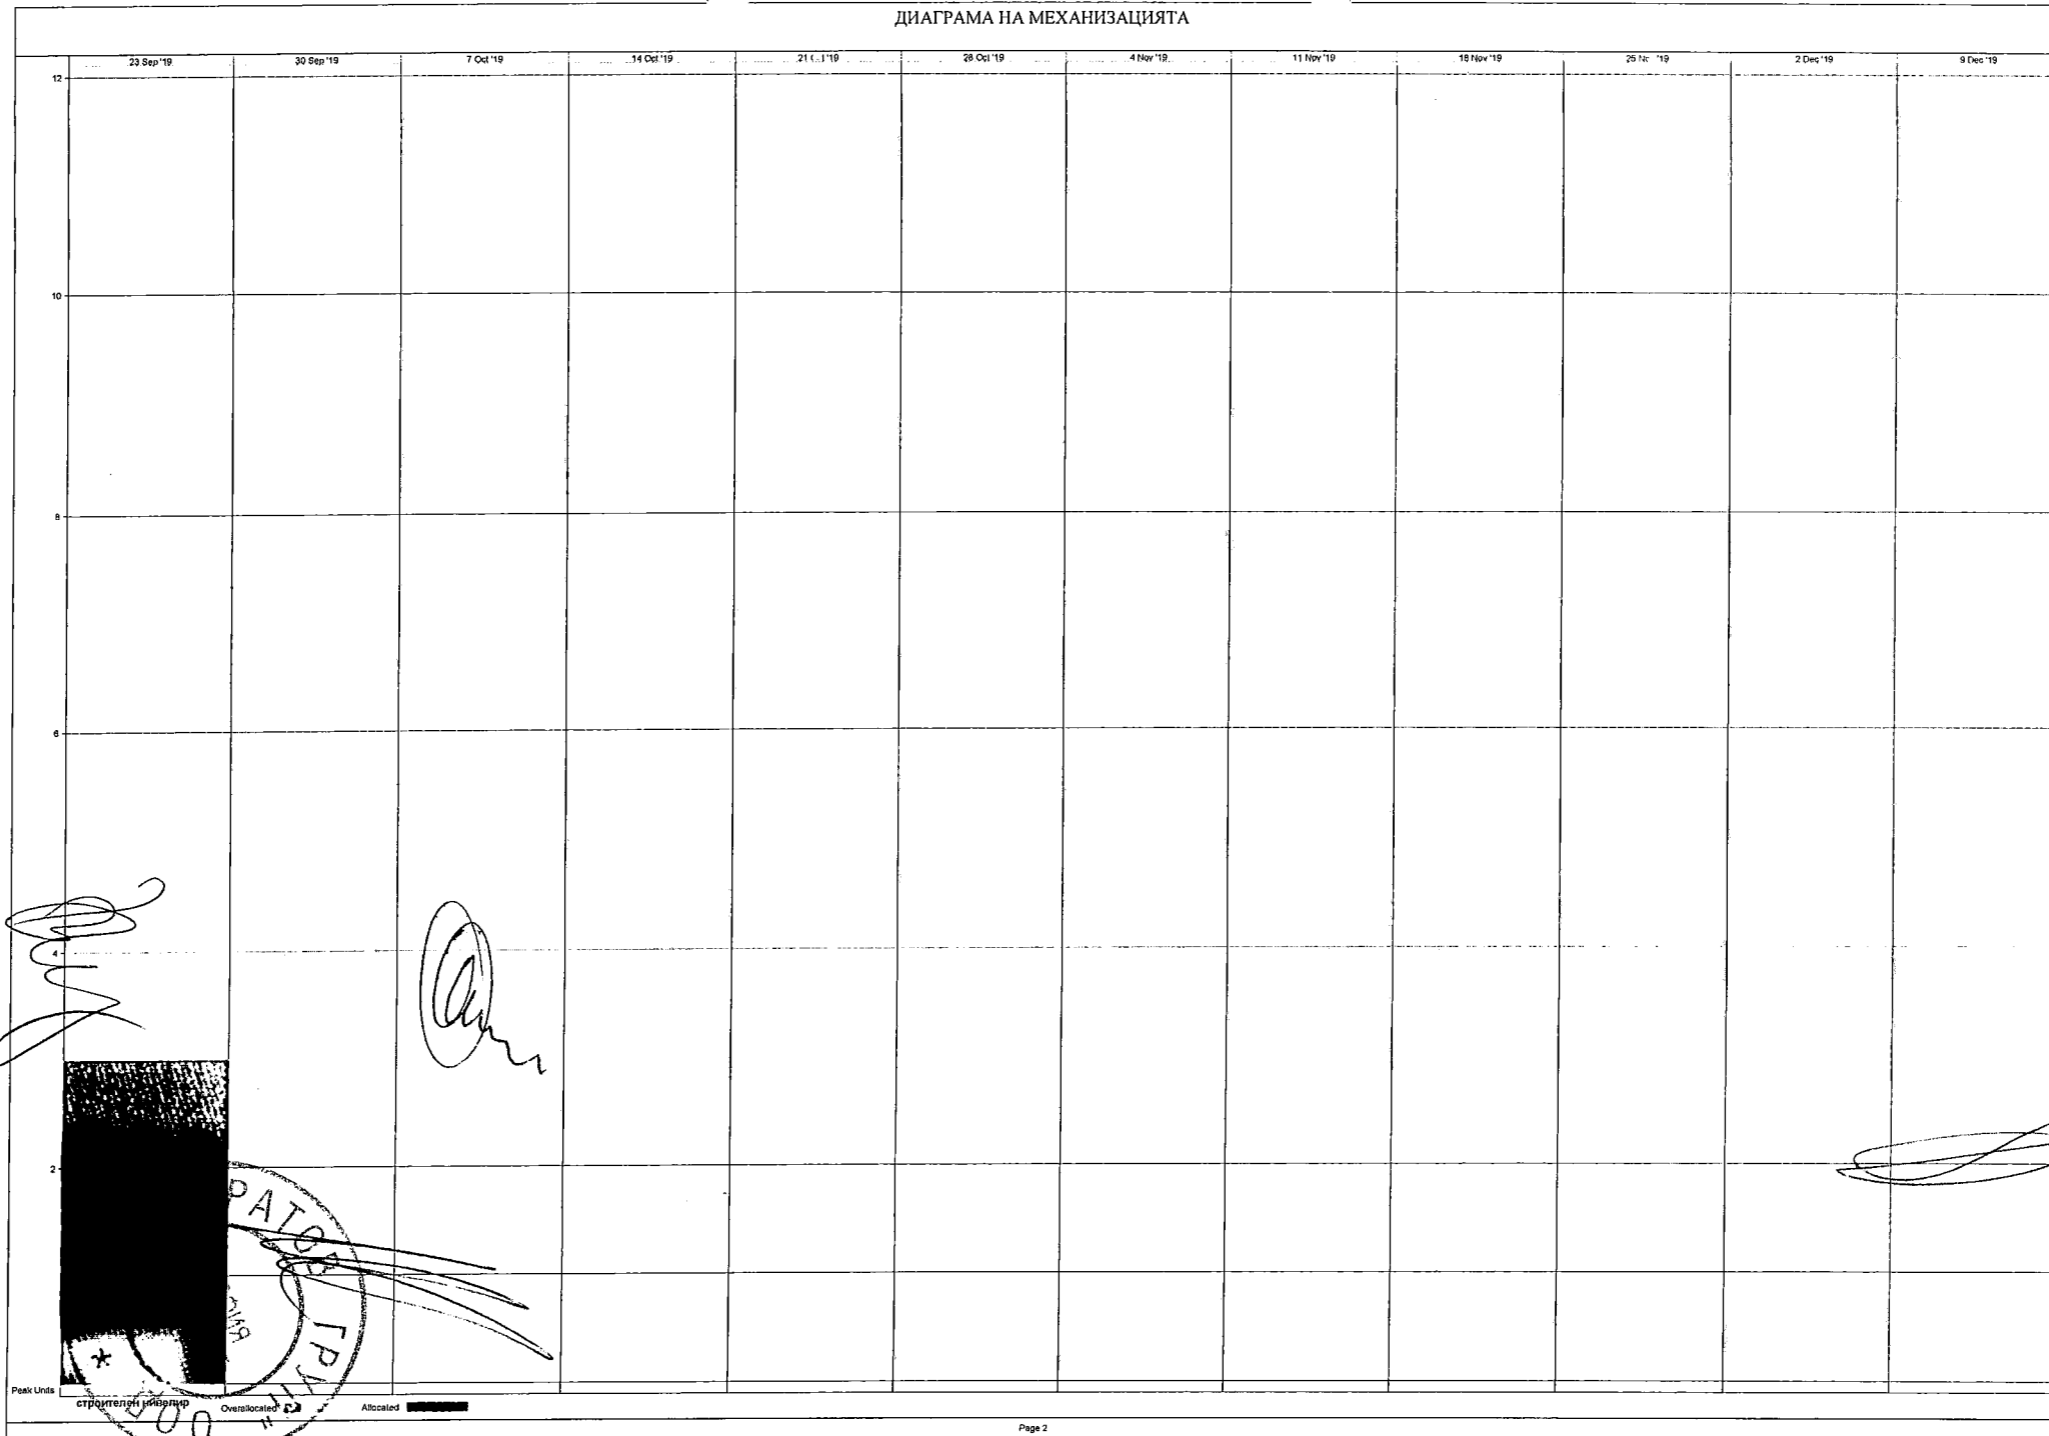


Peak Link

стратегията работи



Overloaded

Abused


ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

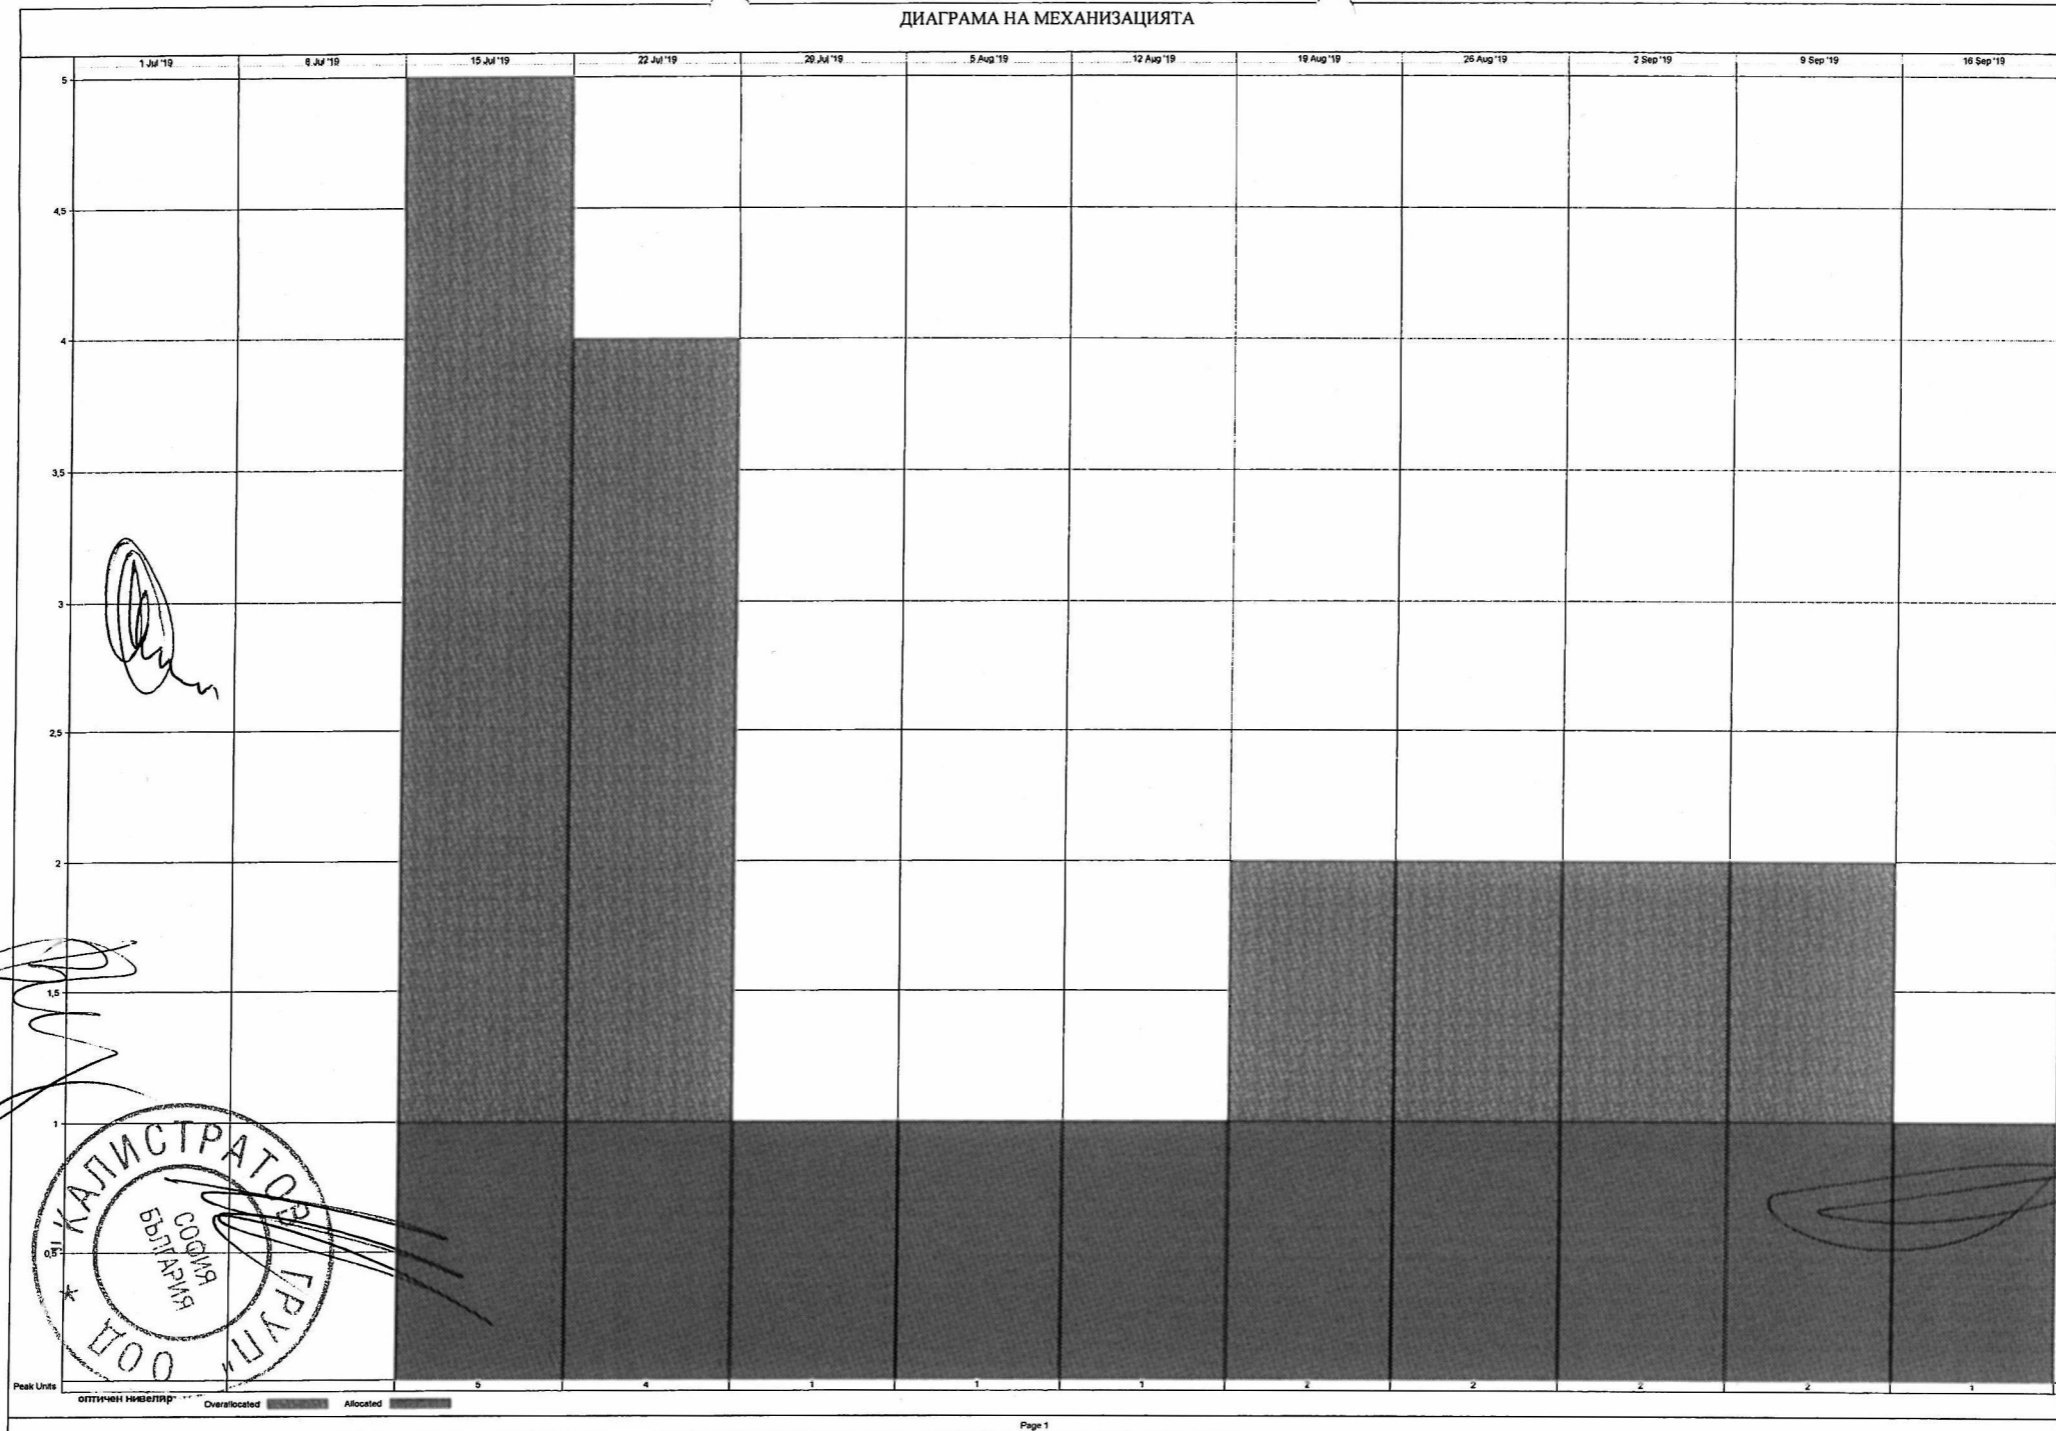

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА


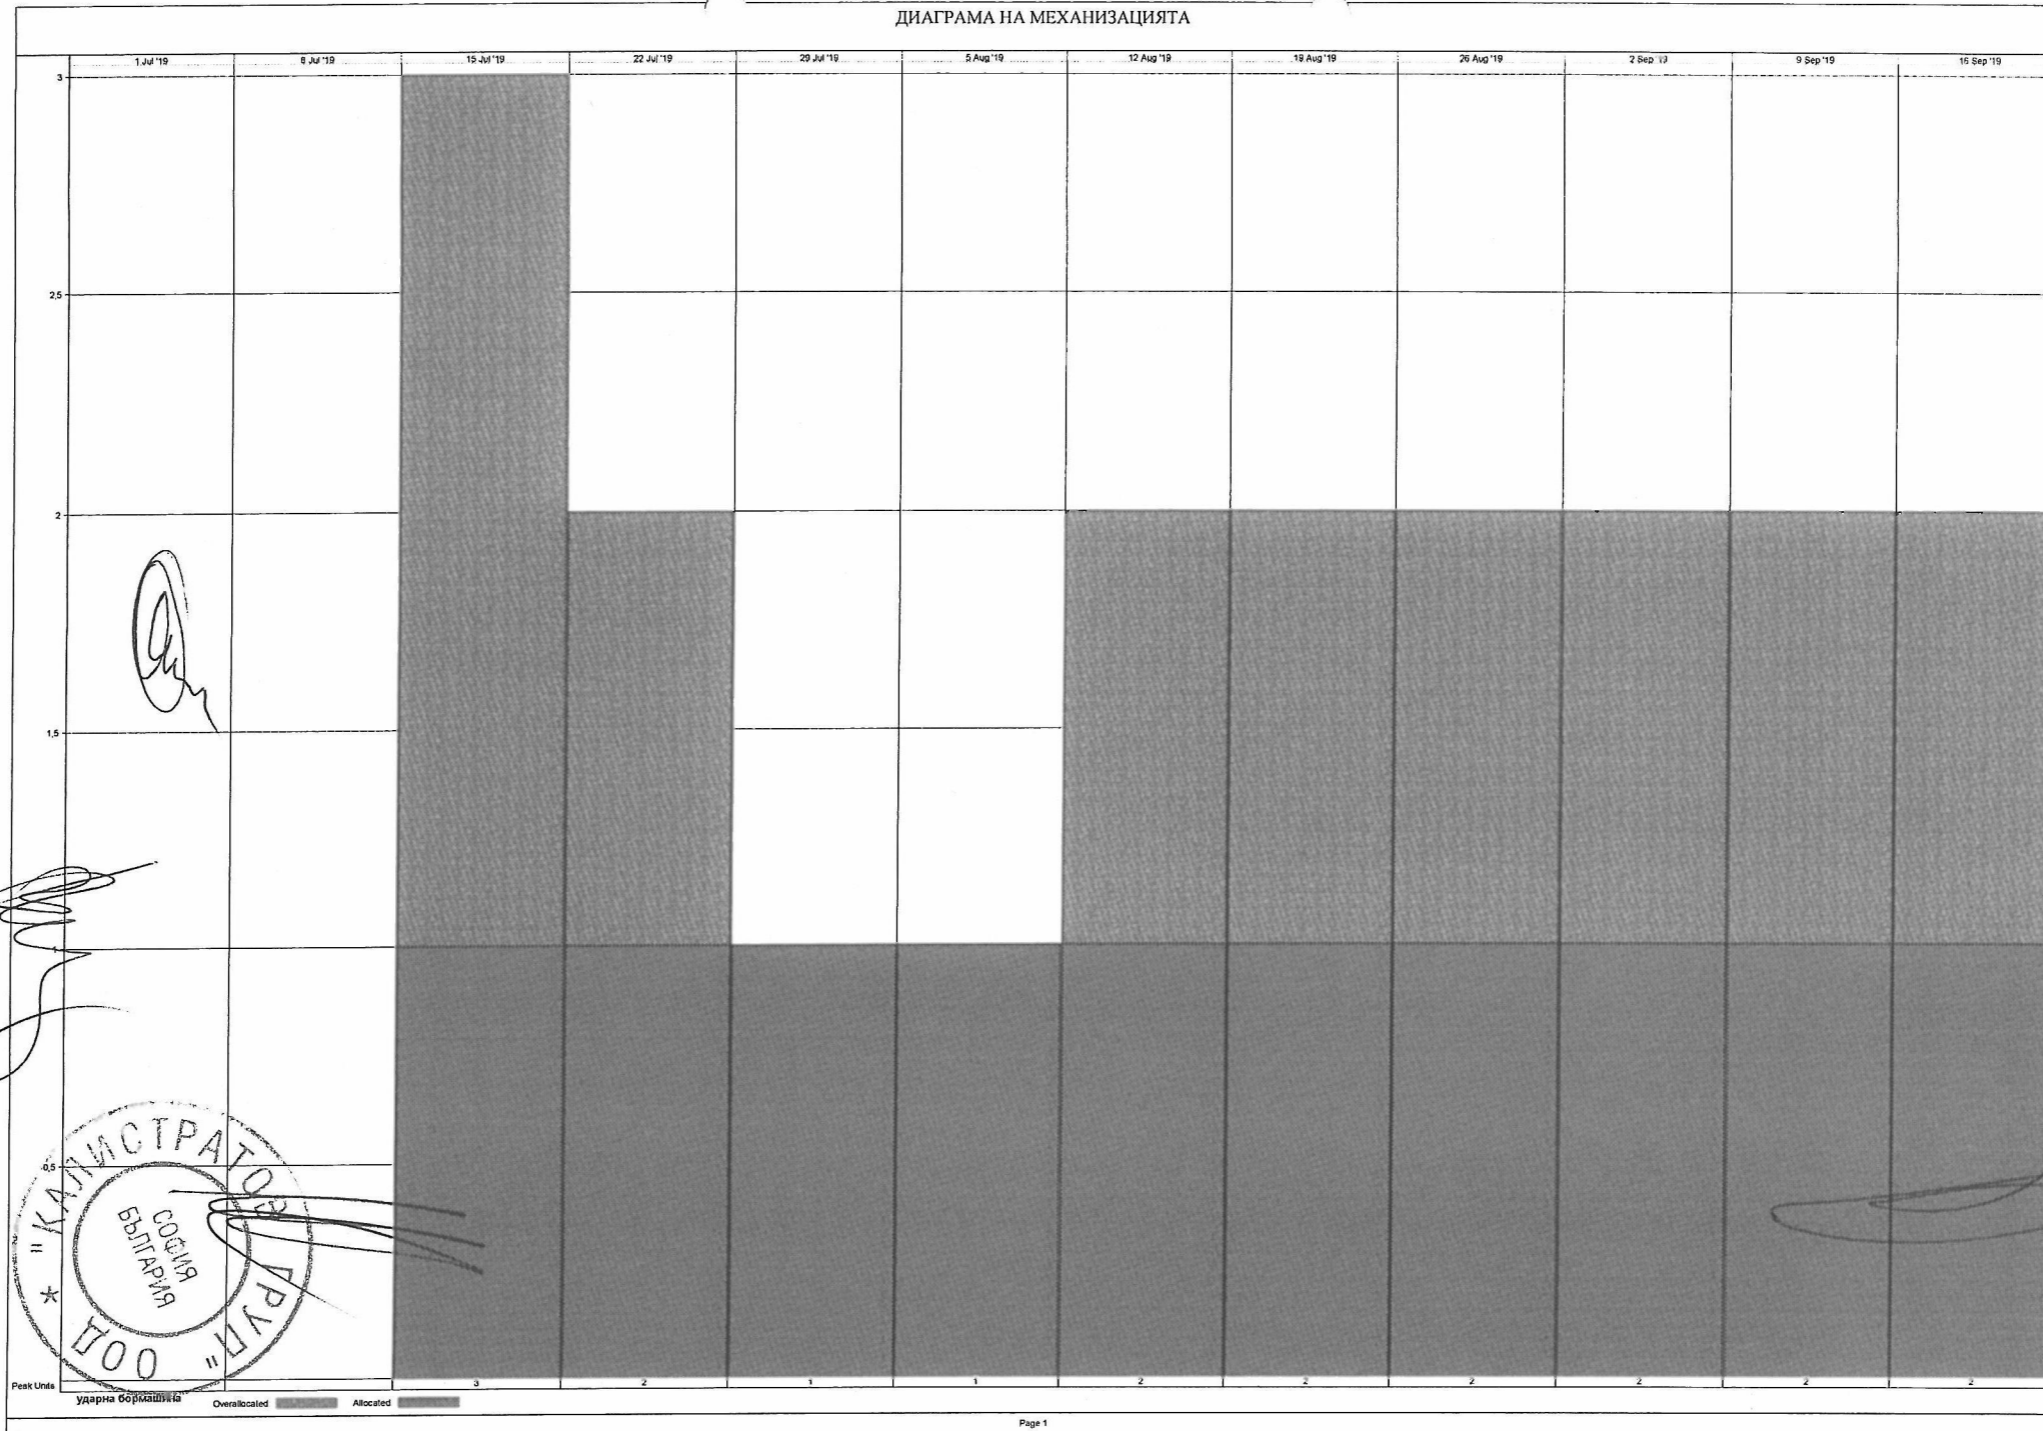


ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

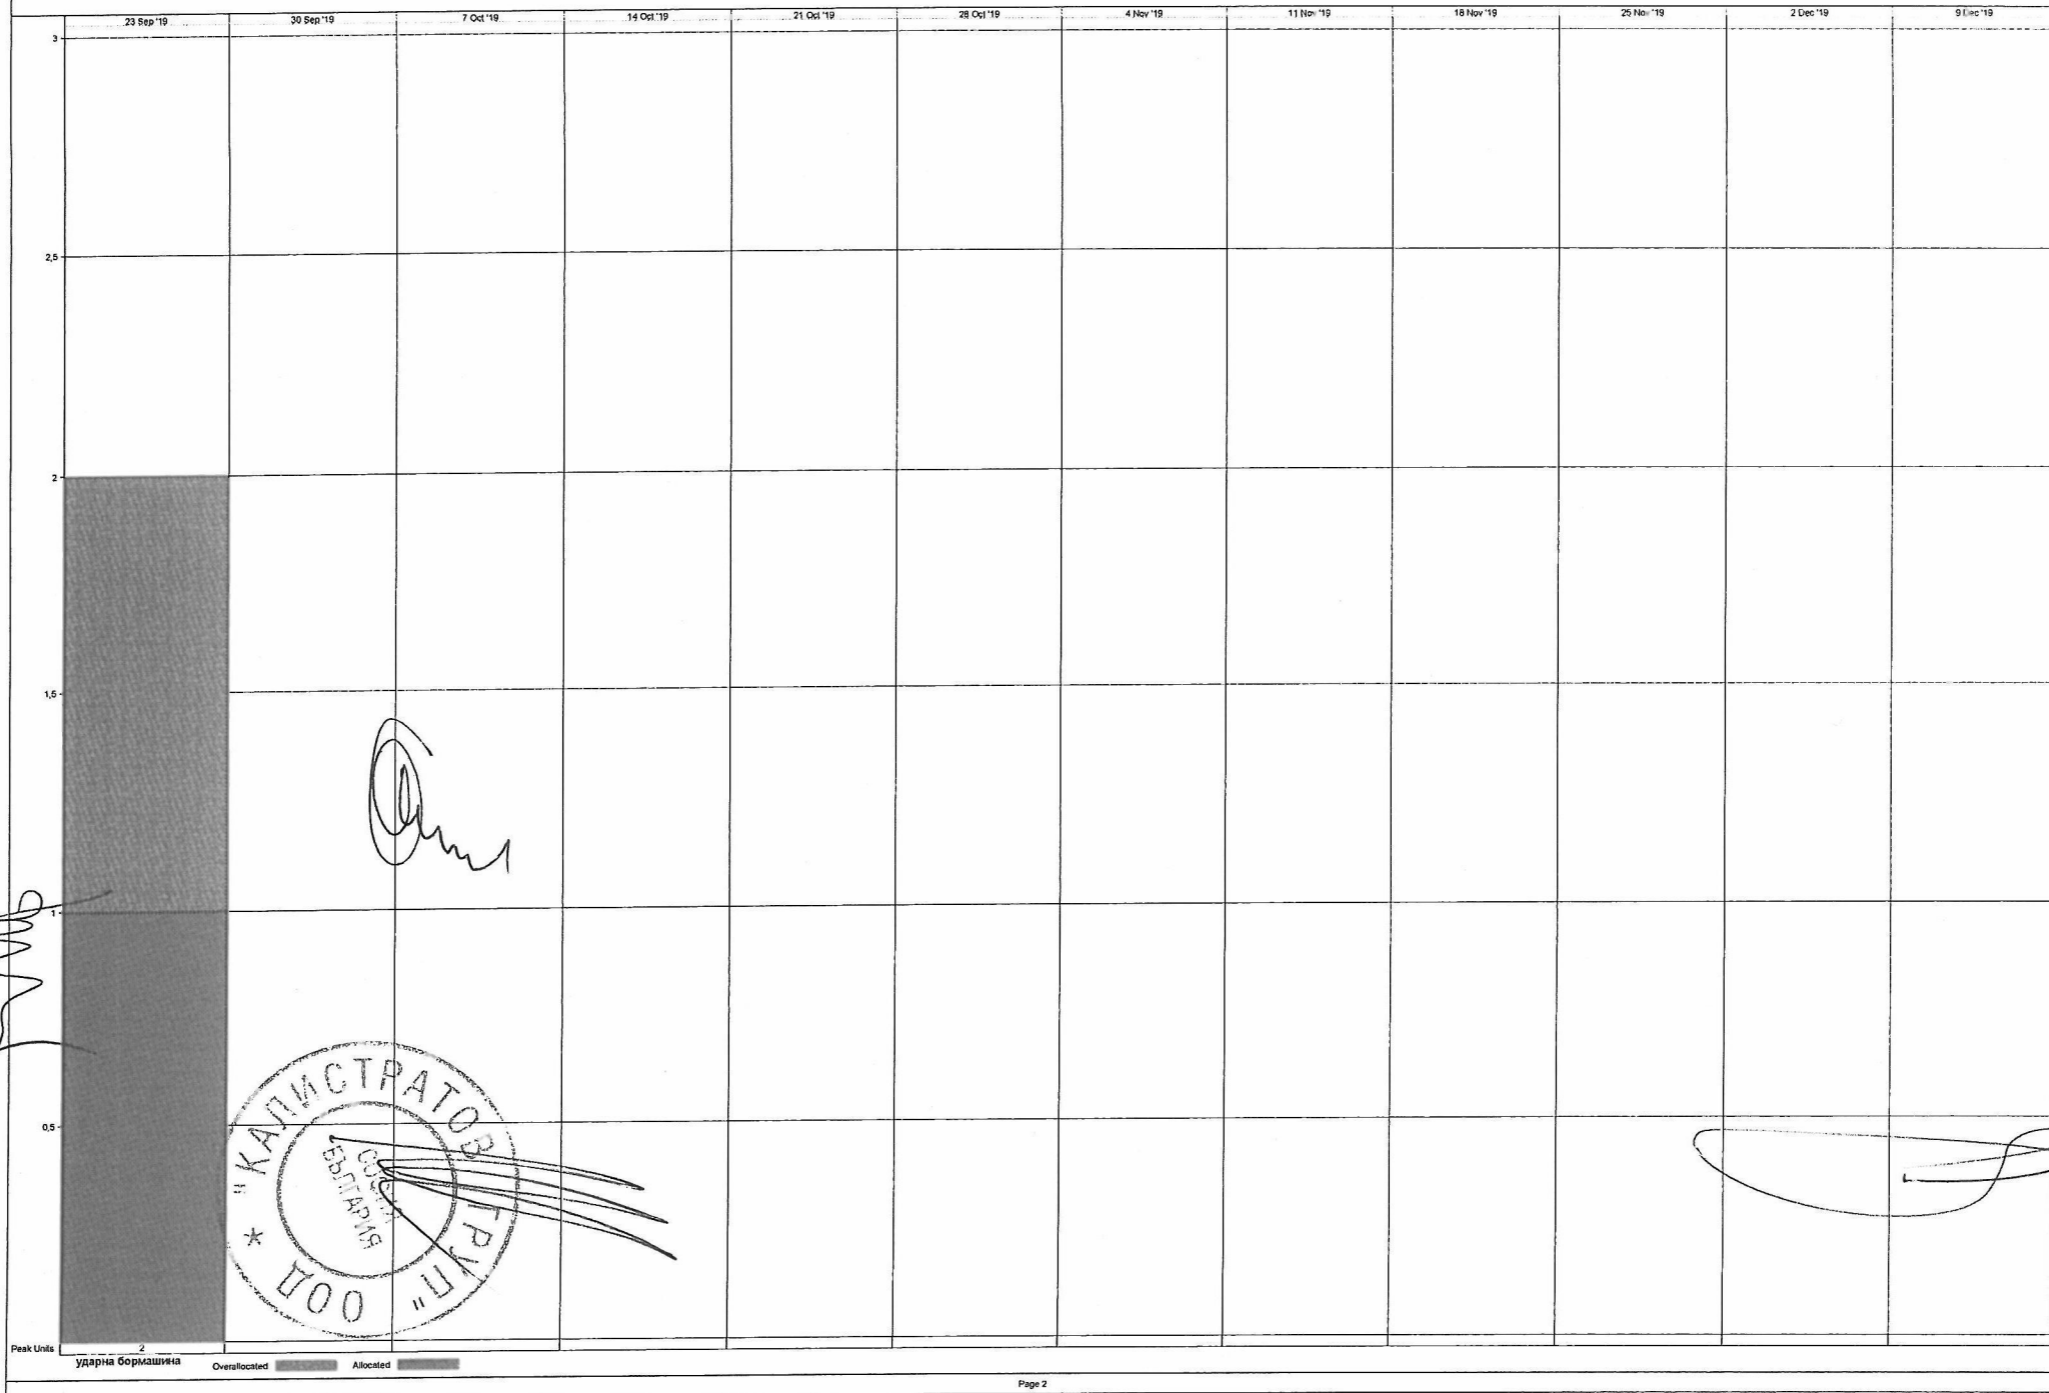


Peak Units
ударна бормашина
Overallocated
Allocated


ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

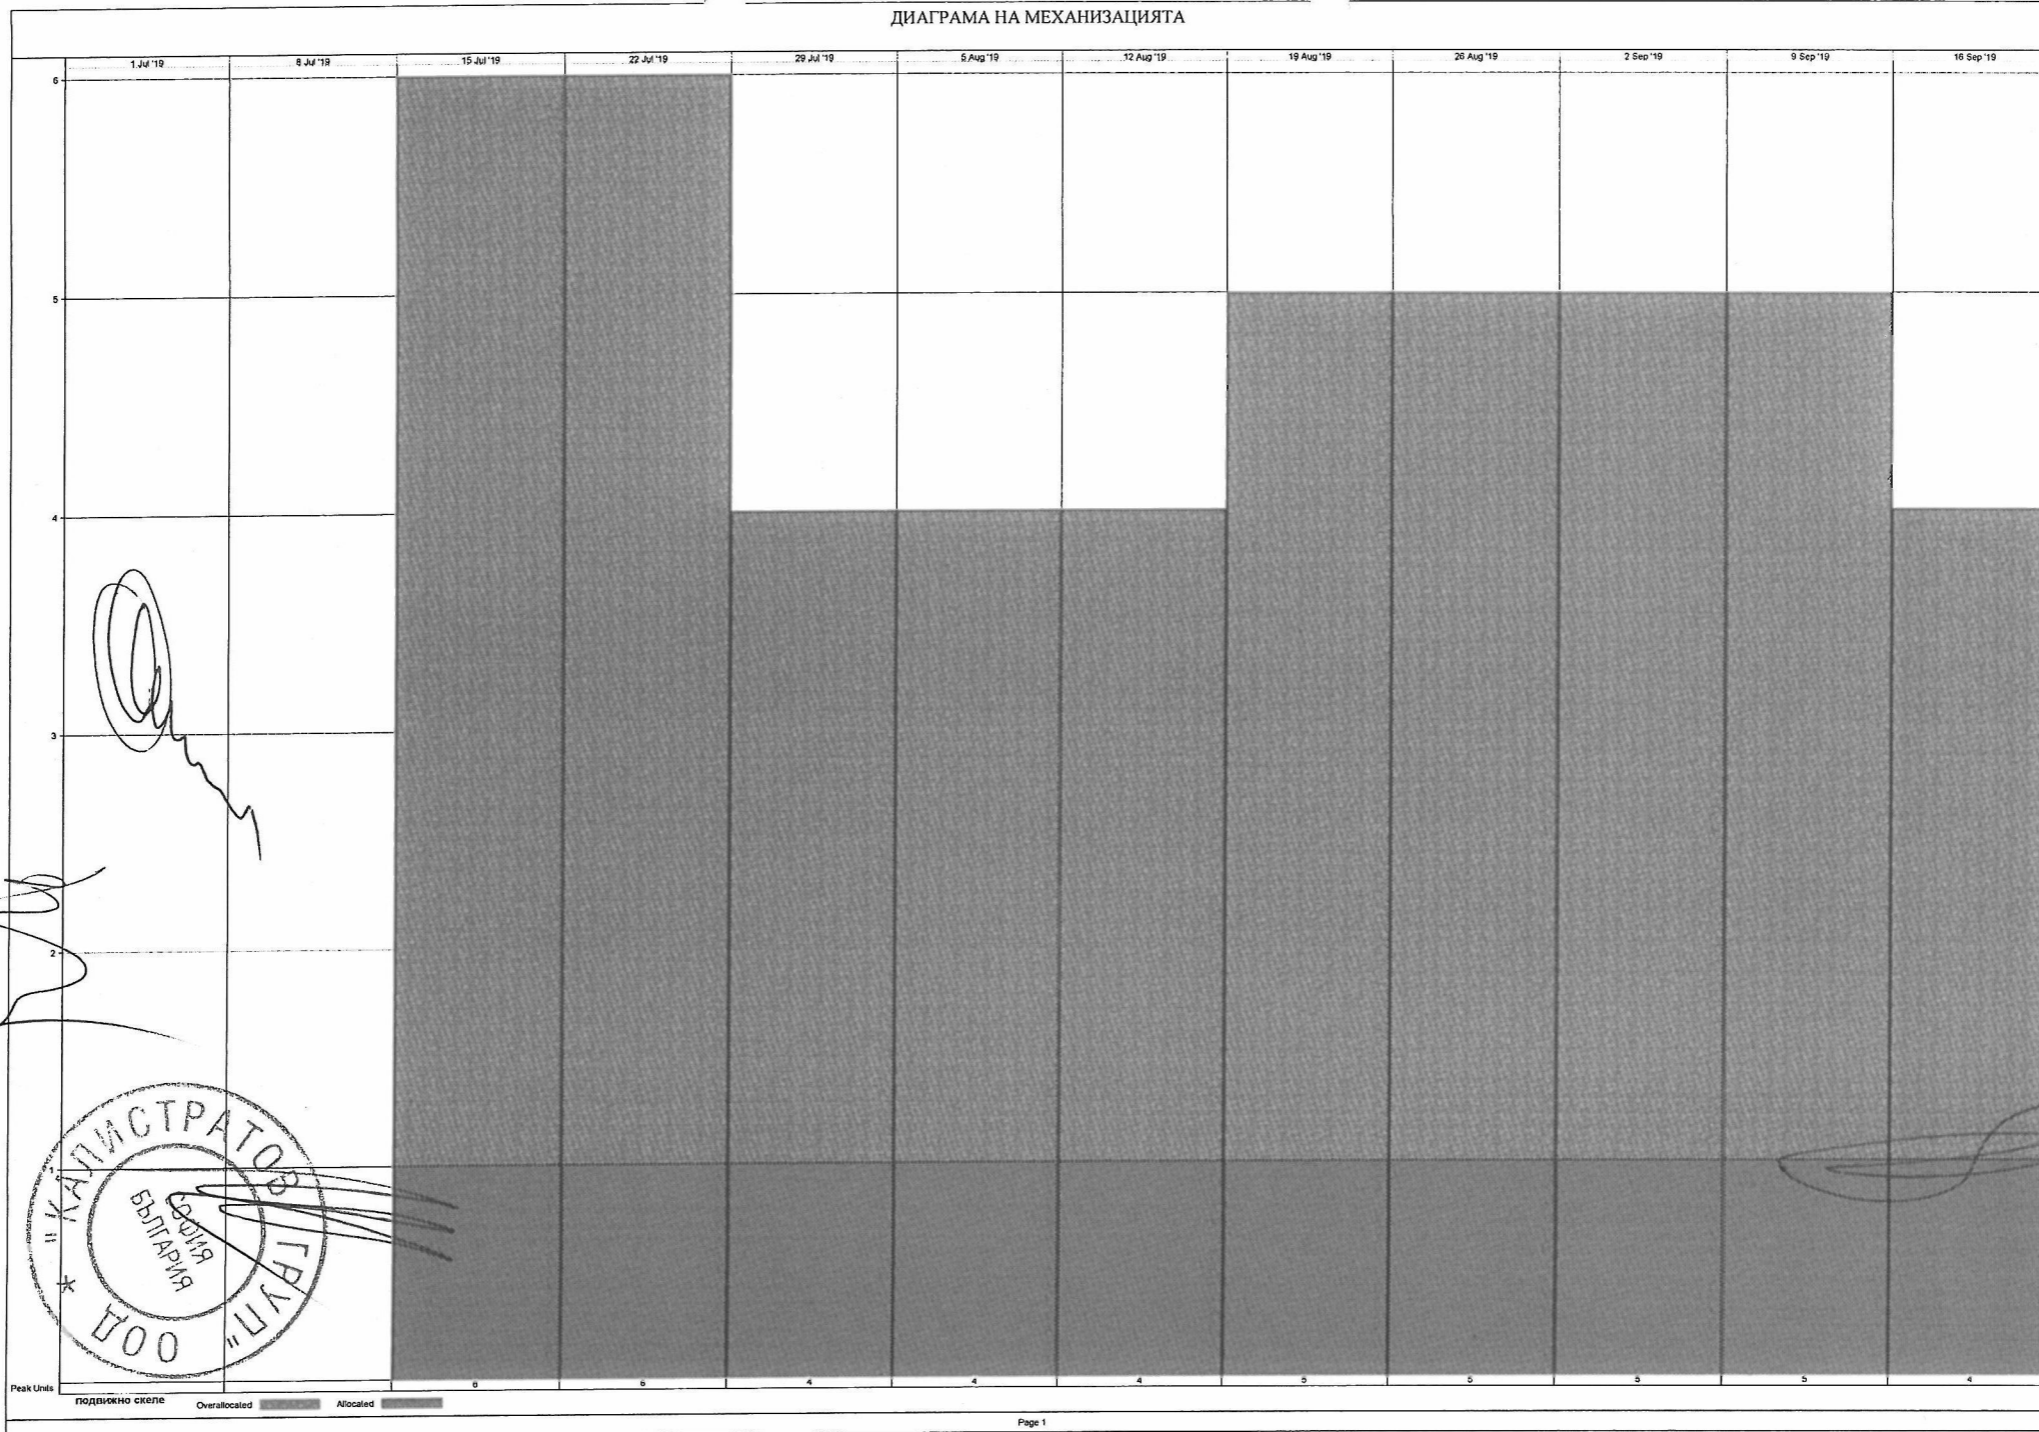



ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

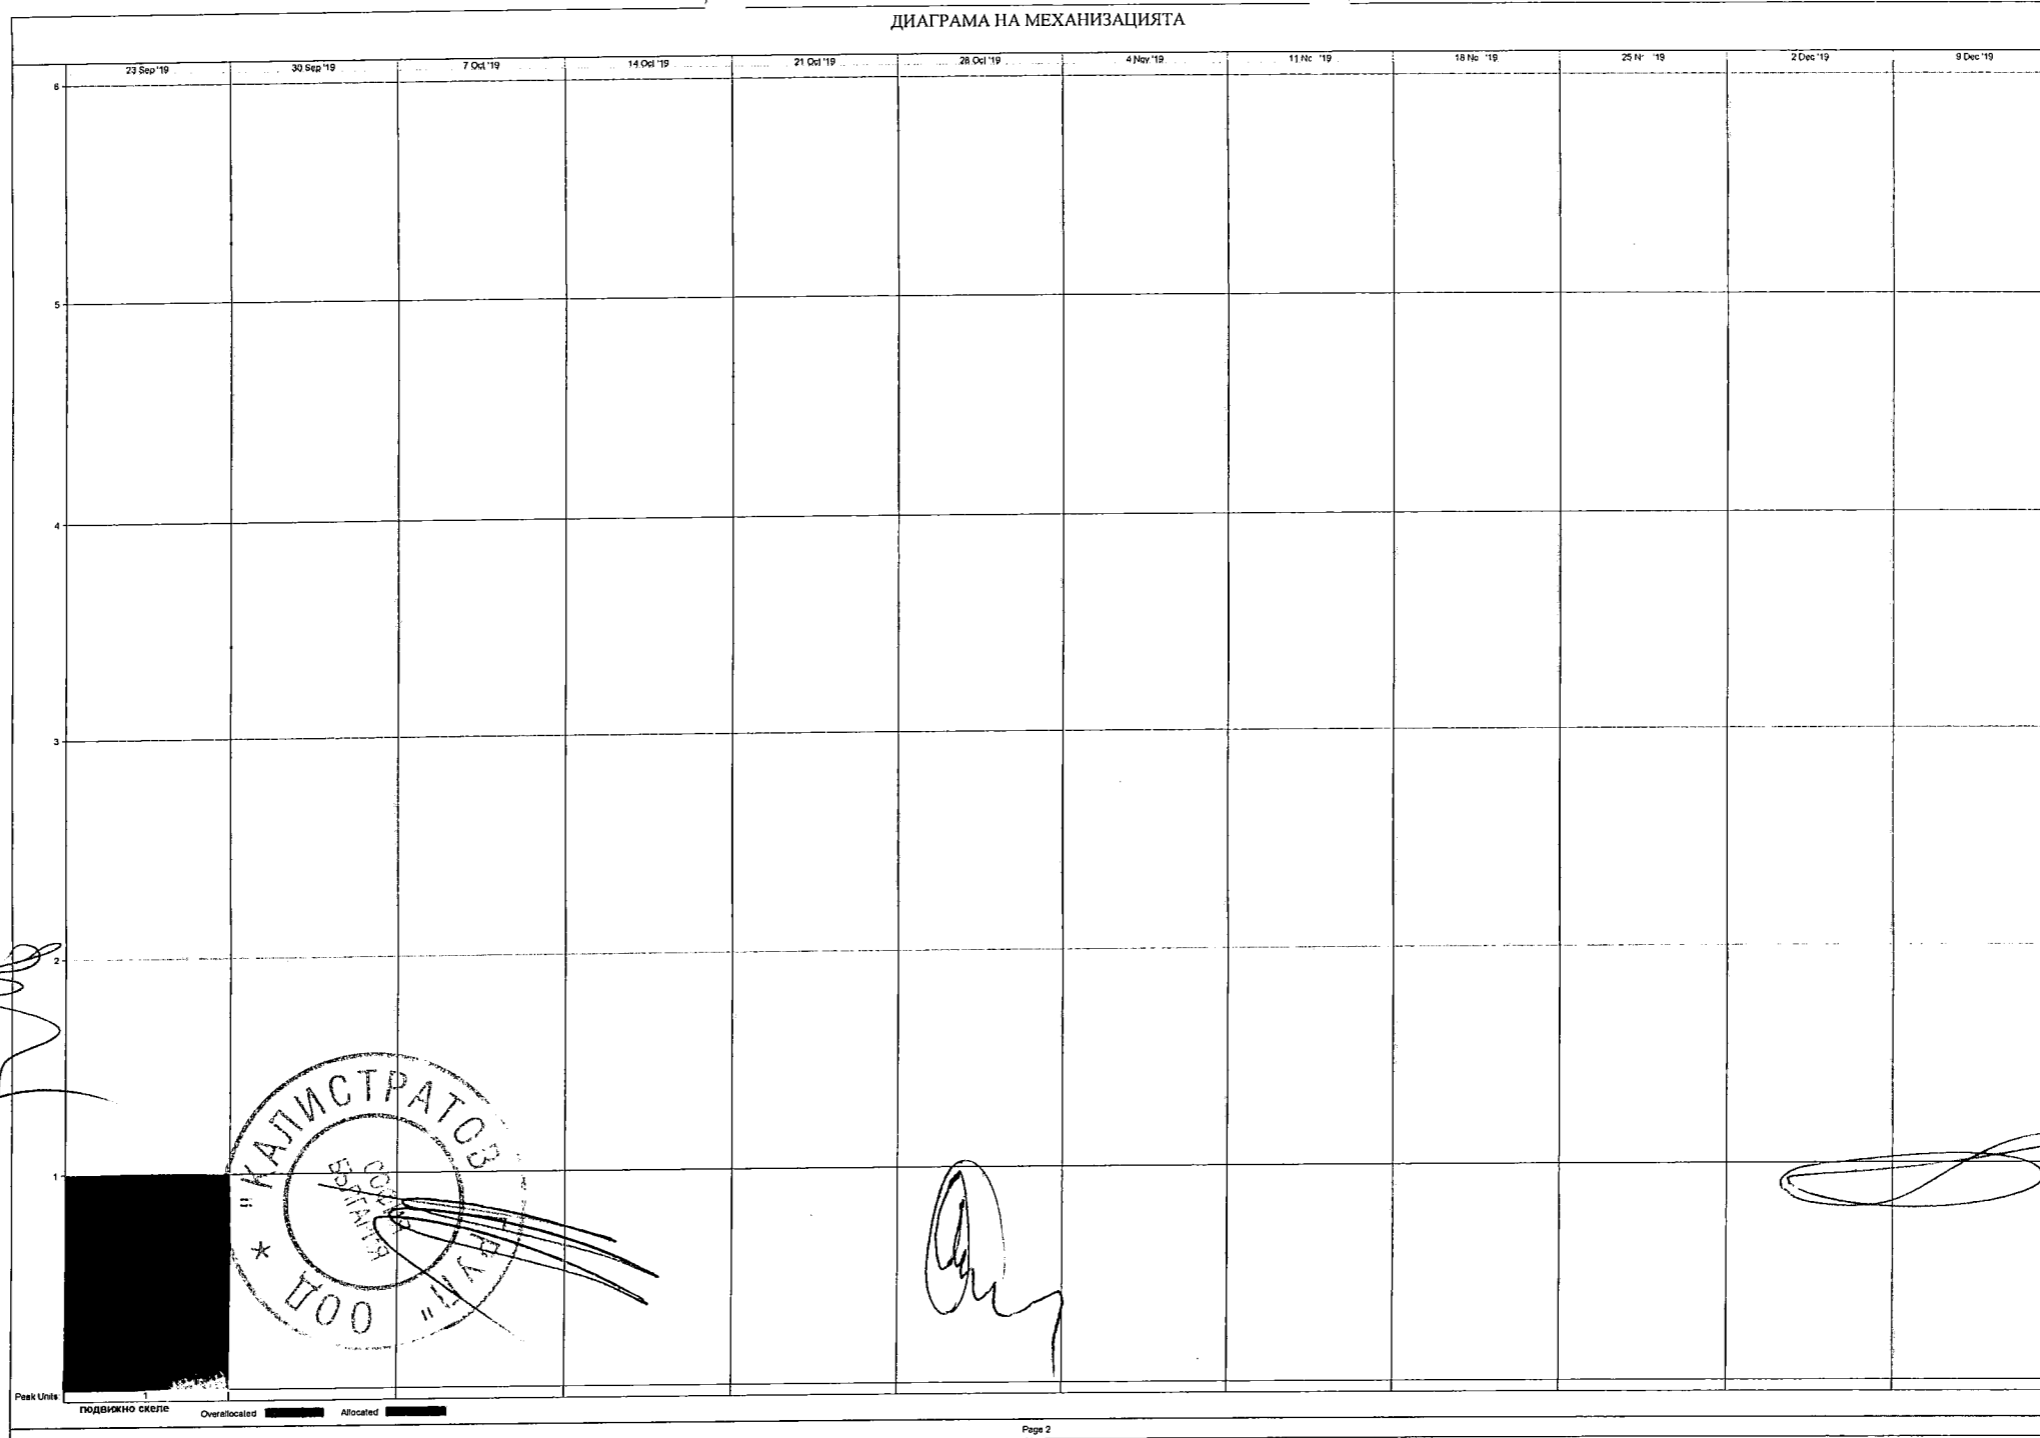

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

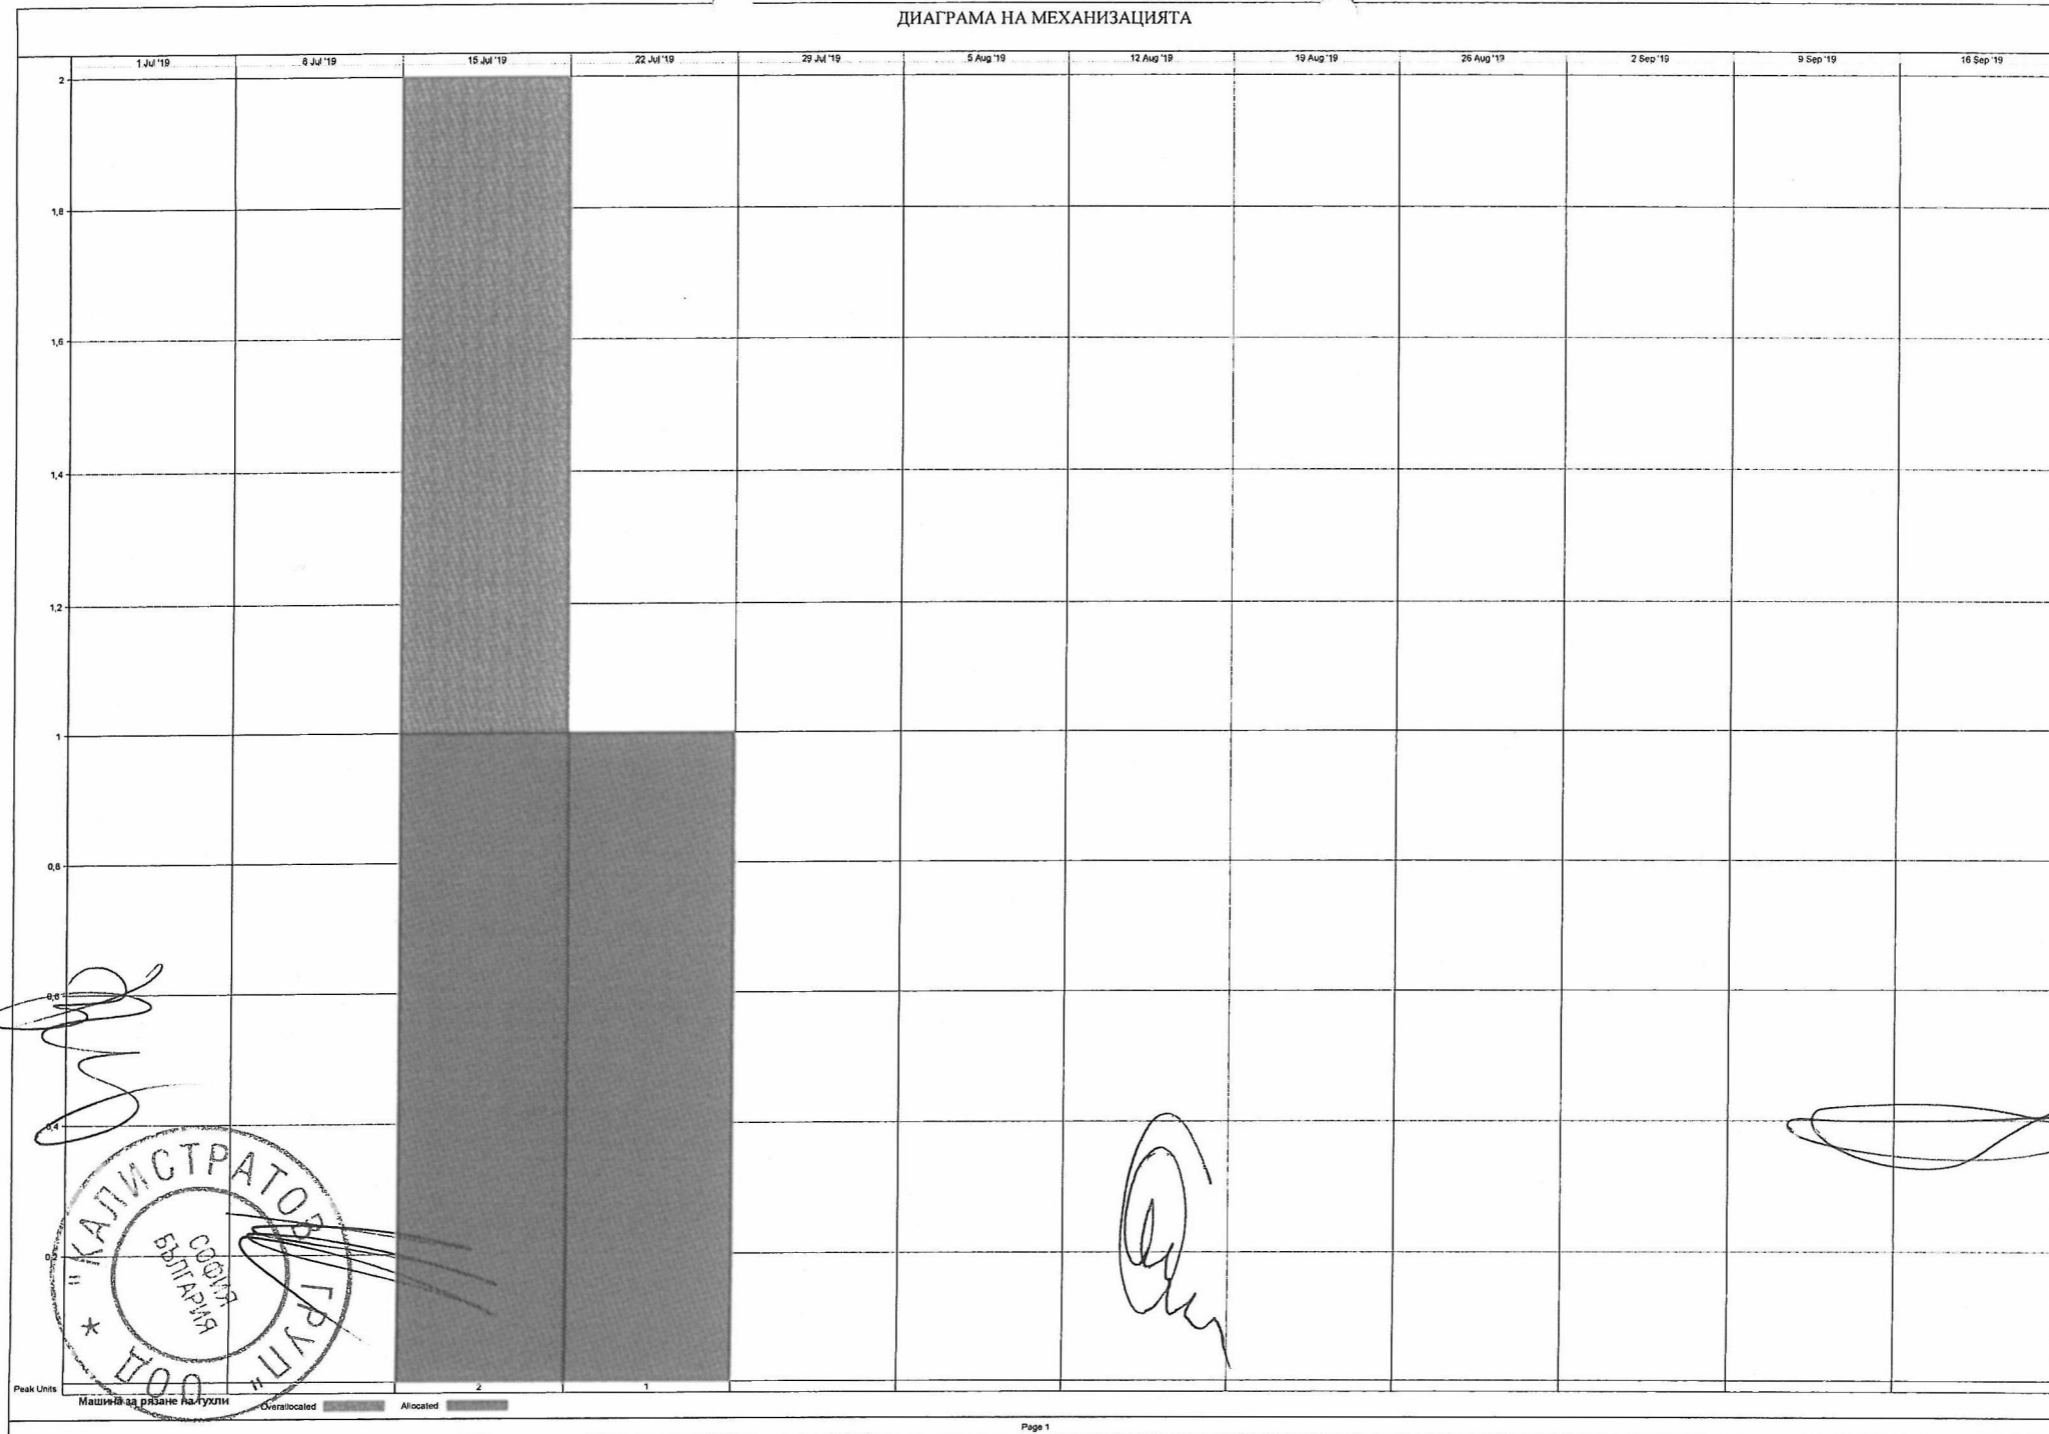


ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

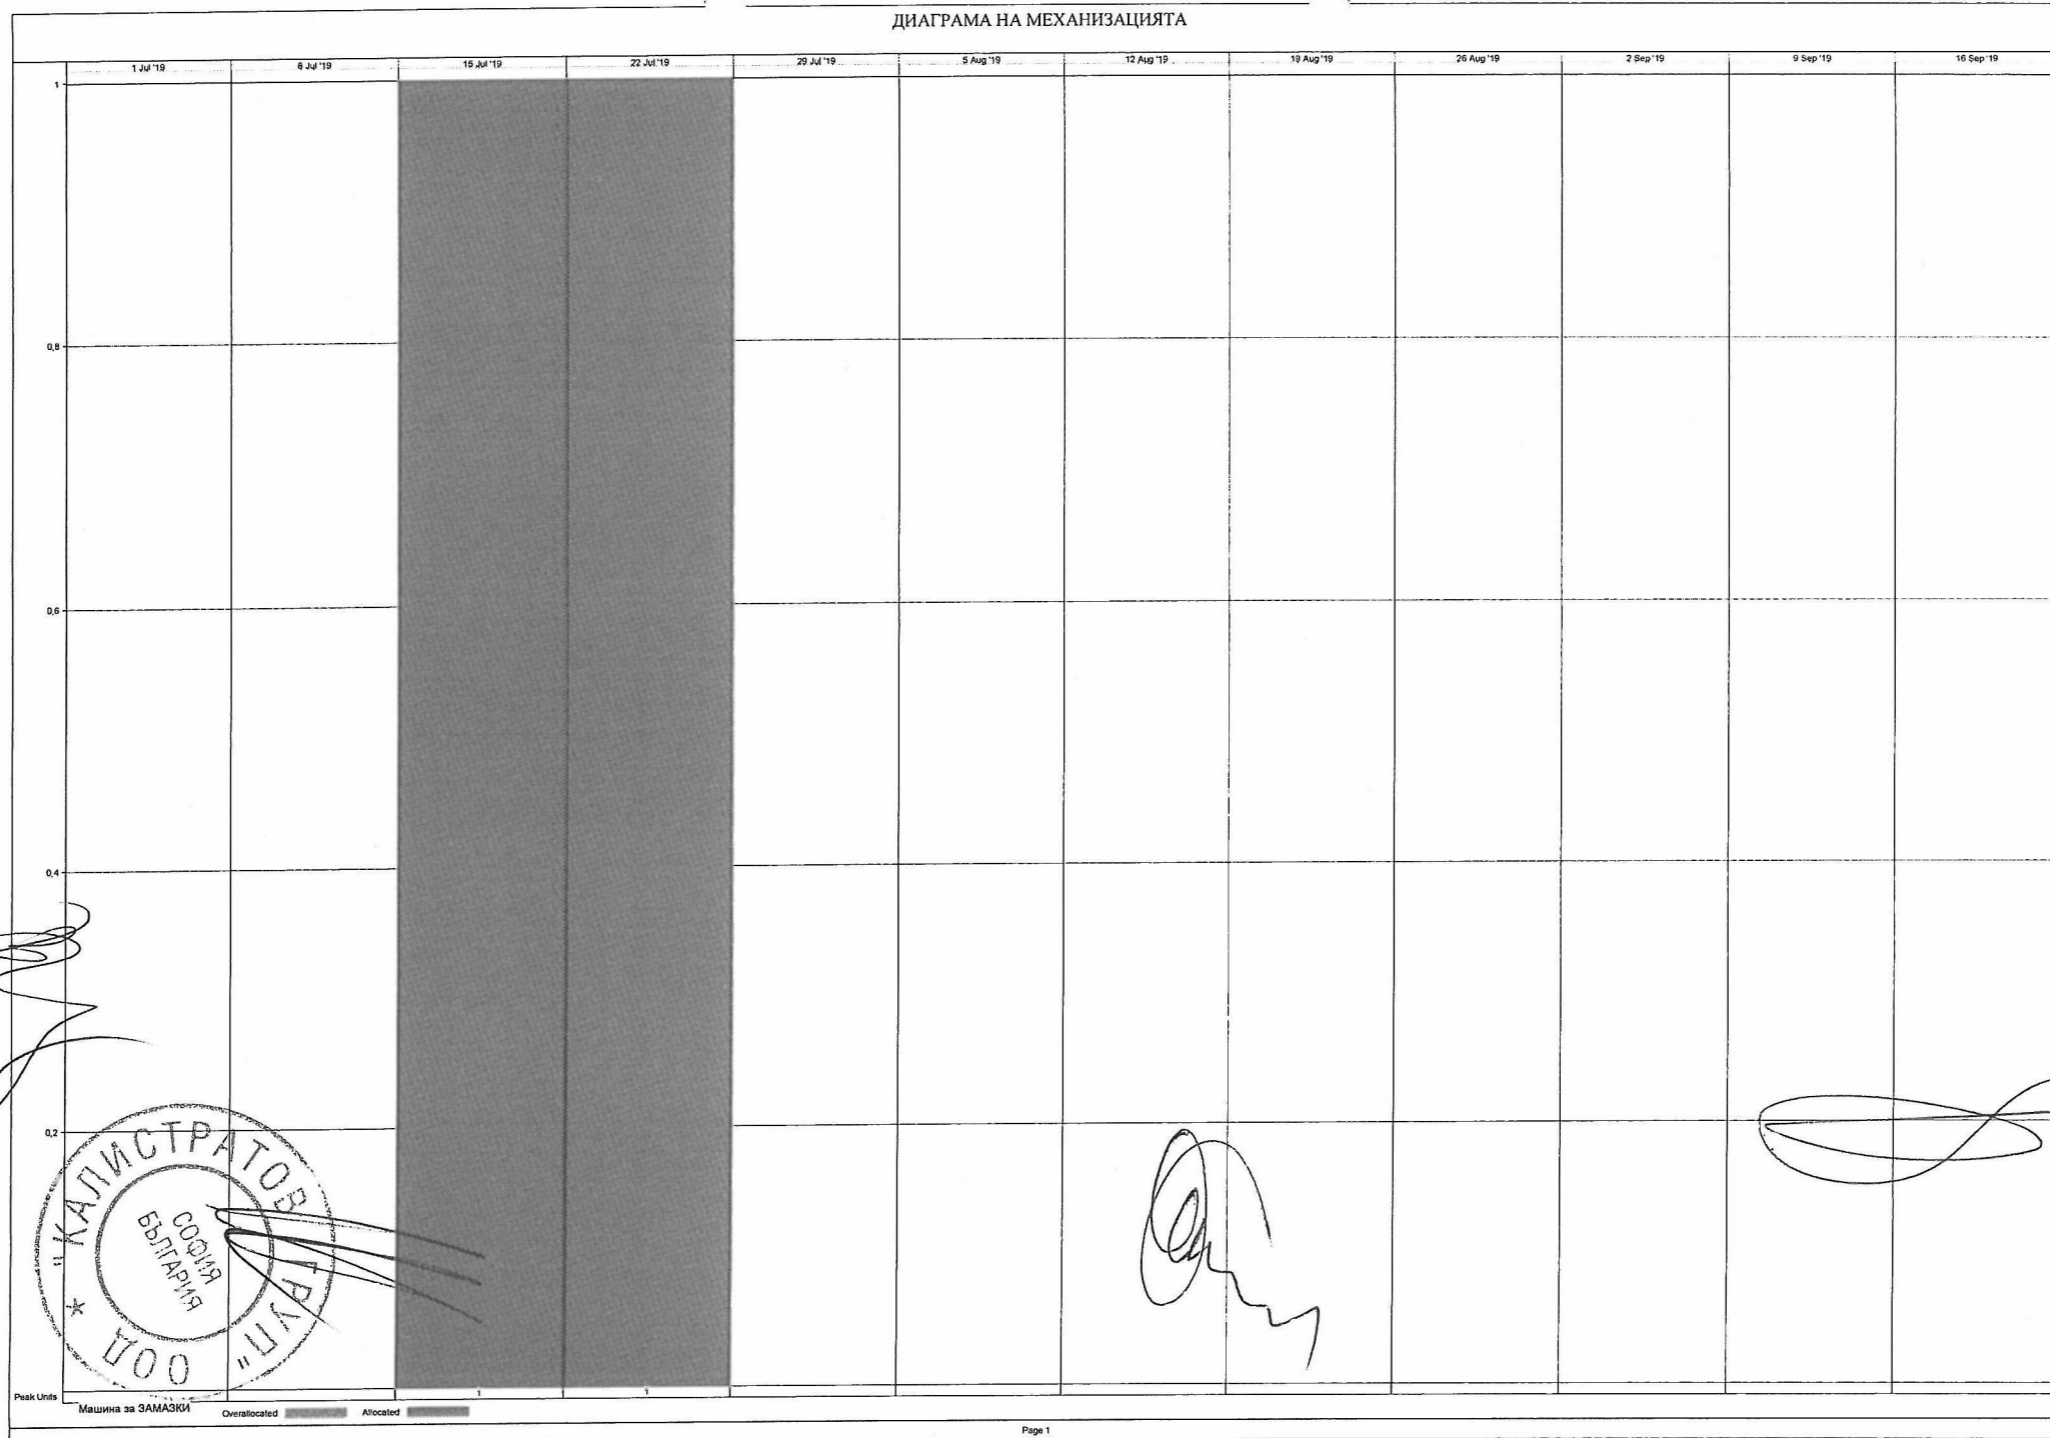


Peak Units
Машина за ЗАМАЗКИ
Overallocated
Allocated

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

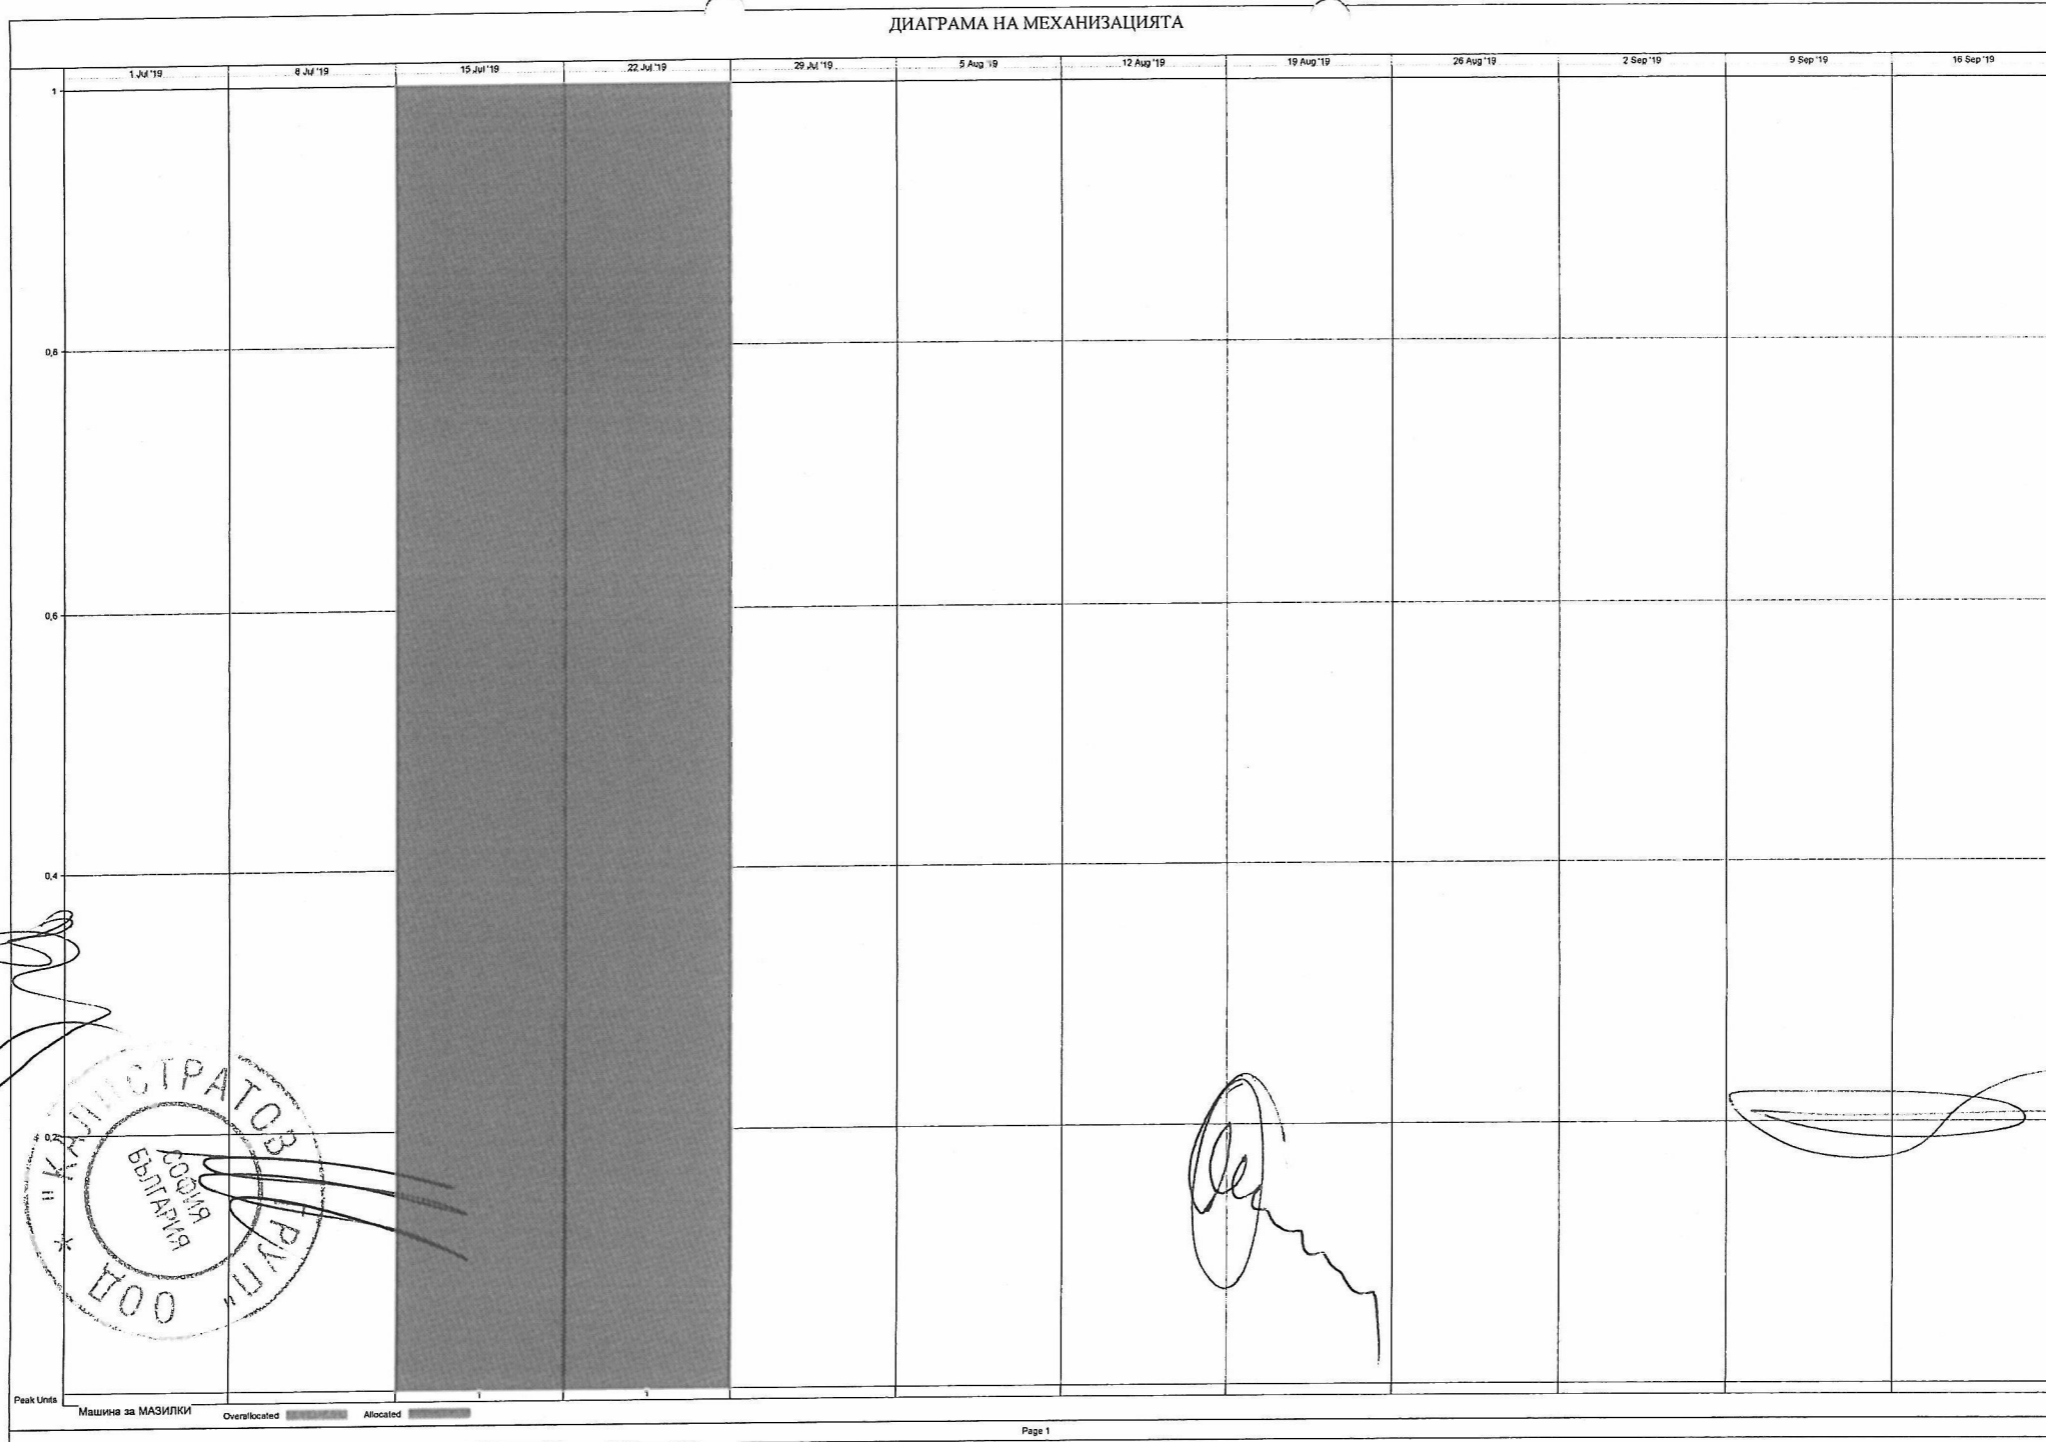


ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

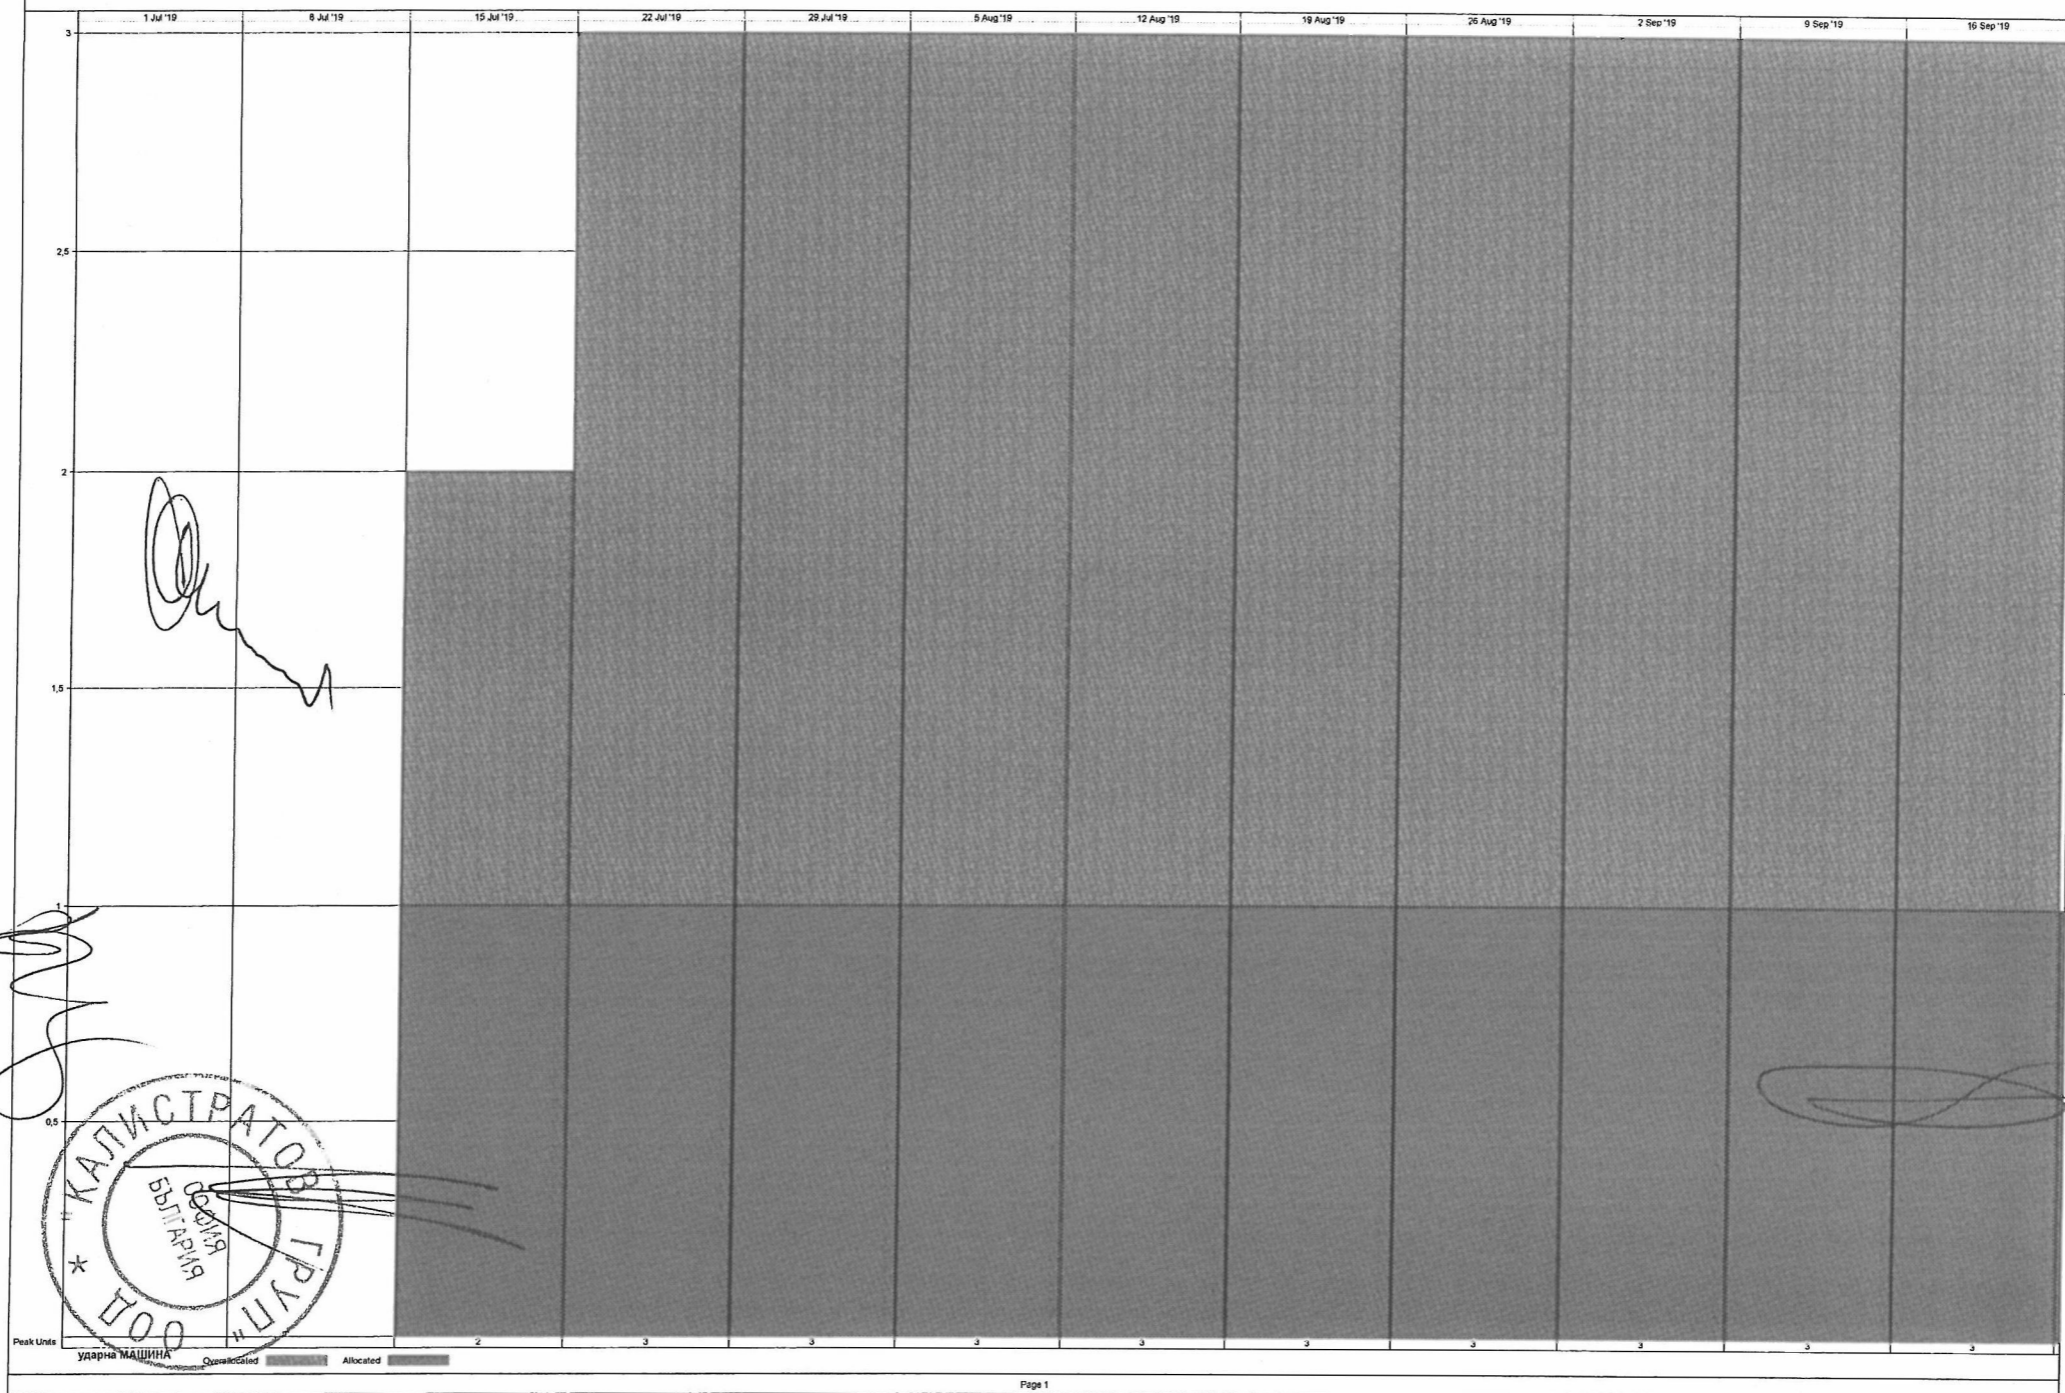


Peak Units удари МАШИНА

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

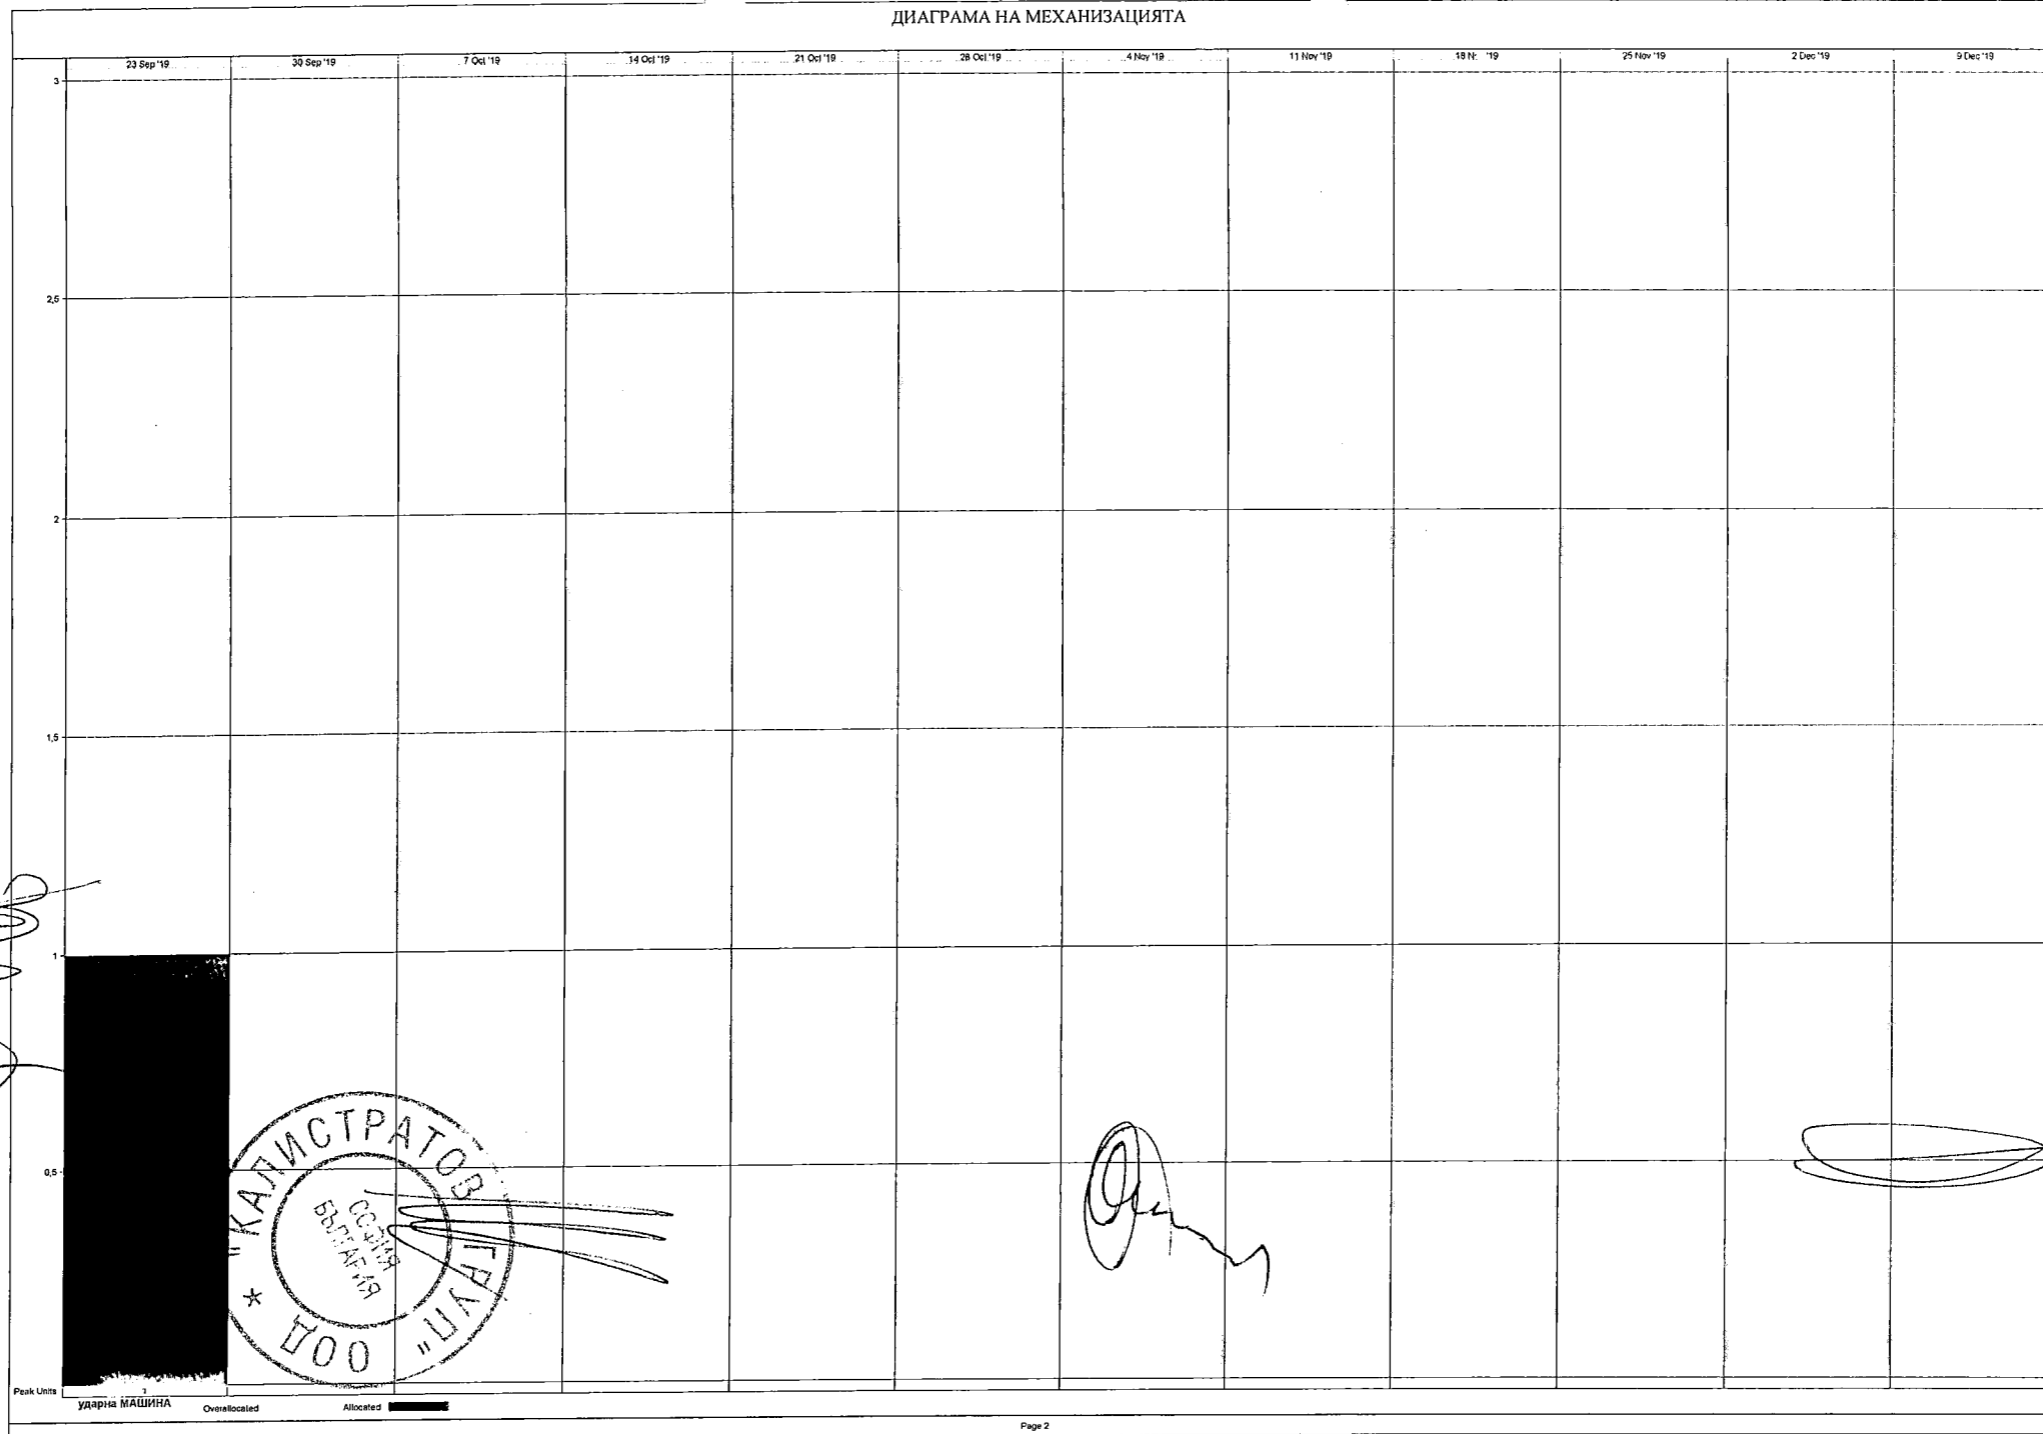

Handwritten scribble




Handwritten signature

Handwritten scribble


Peak Units ударна МАШИНА Overallocated Allocated

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

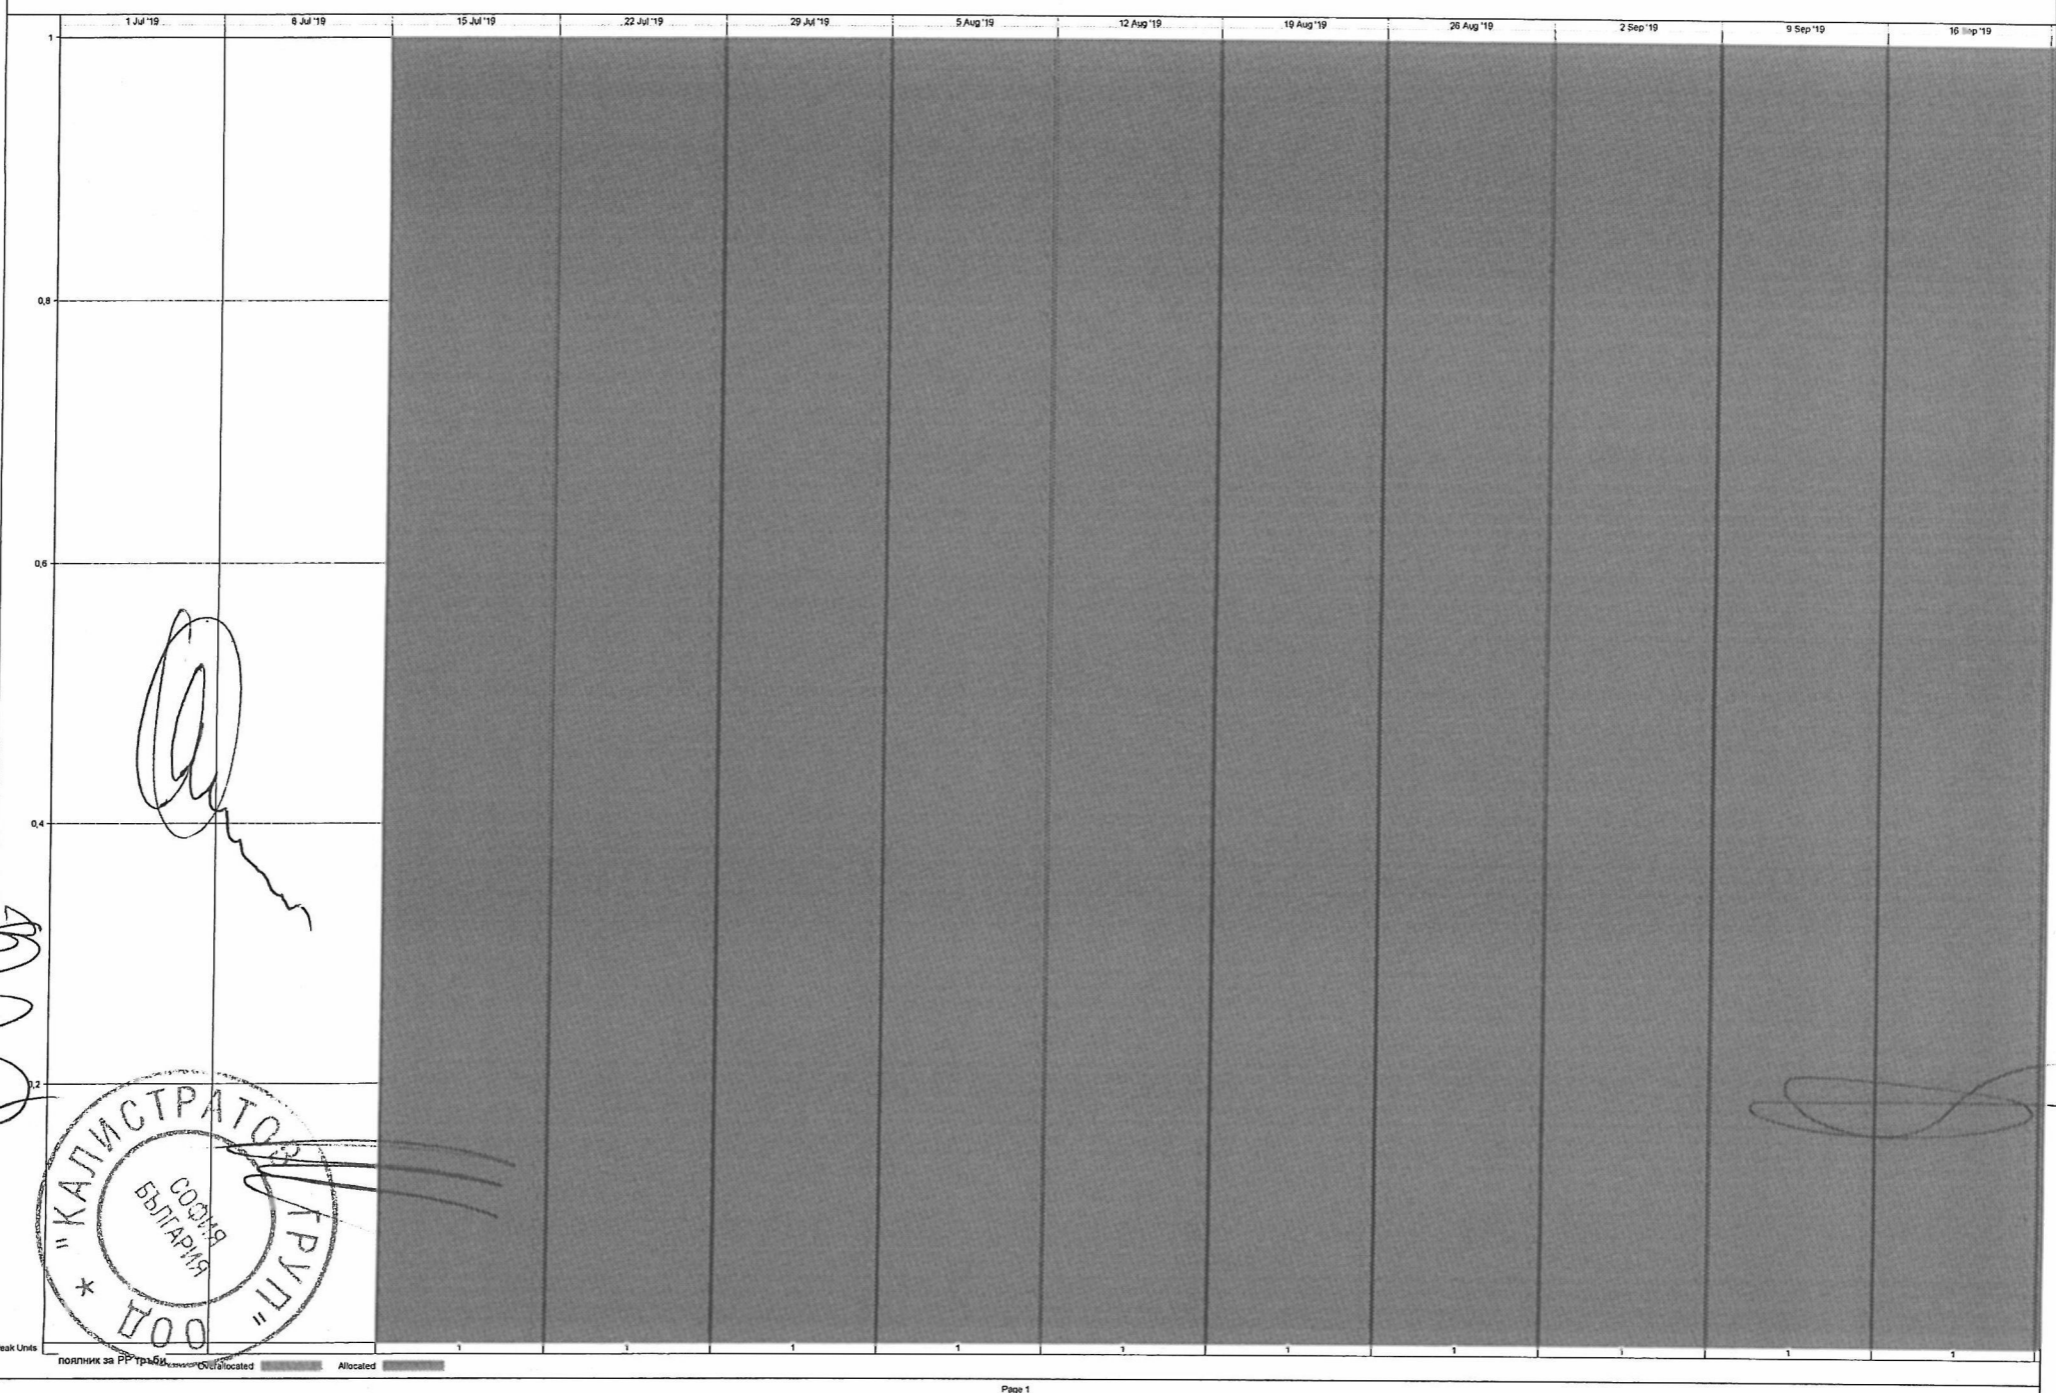



Peak Link
полник за РР-урби

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

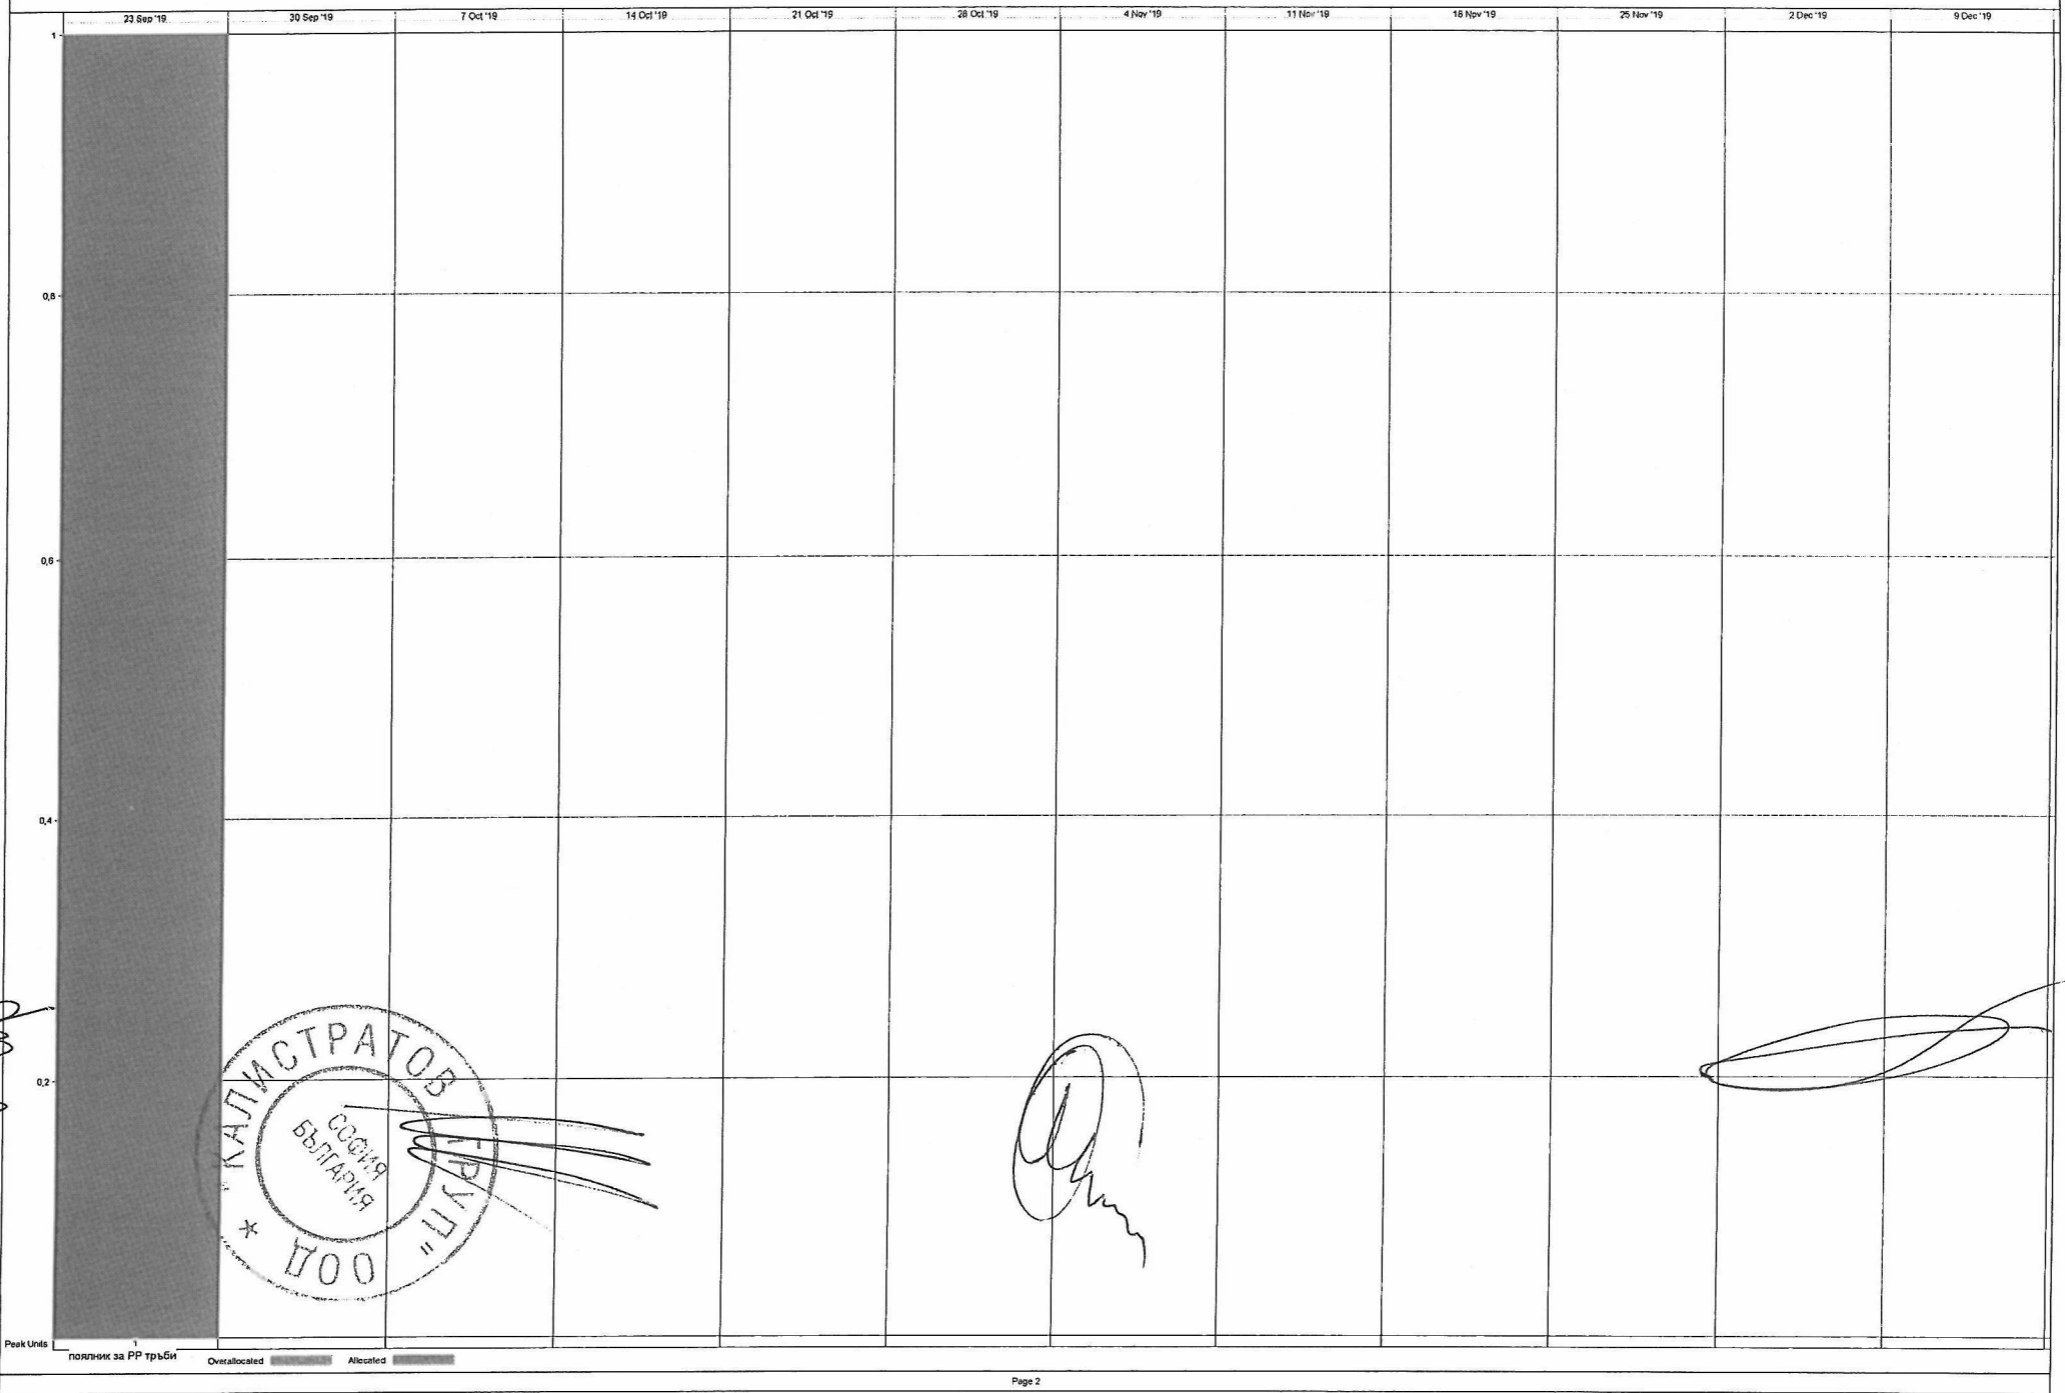

Peak Units
полярик за РР тръби

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

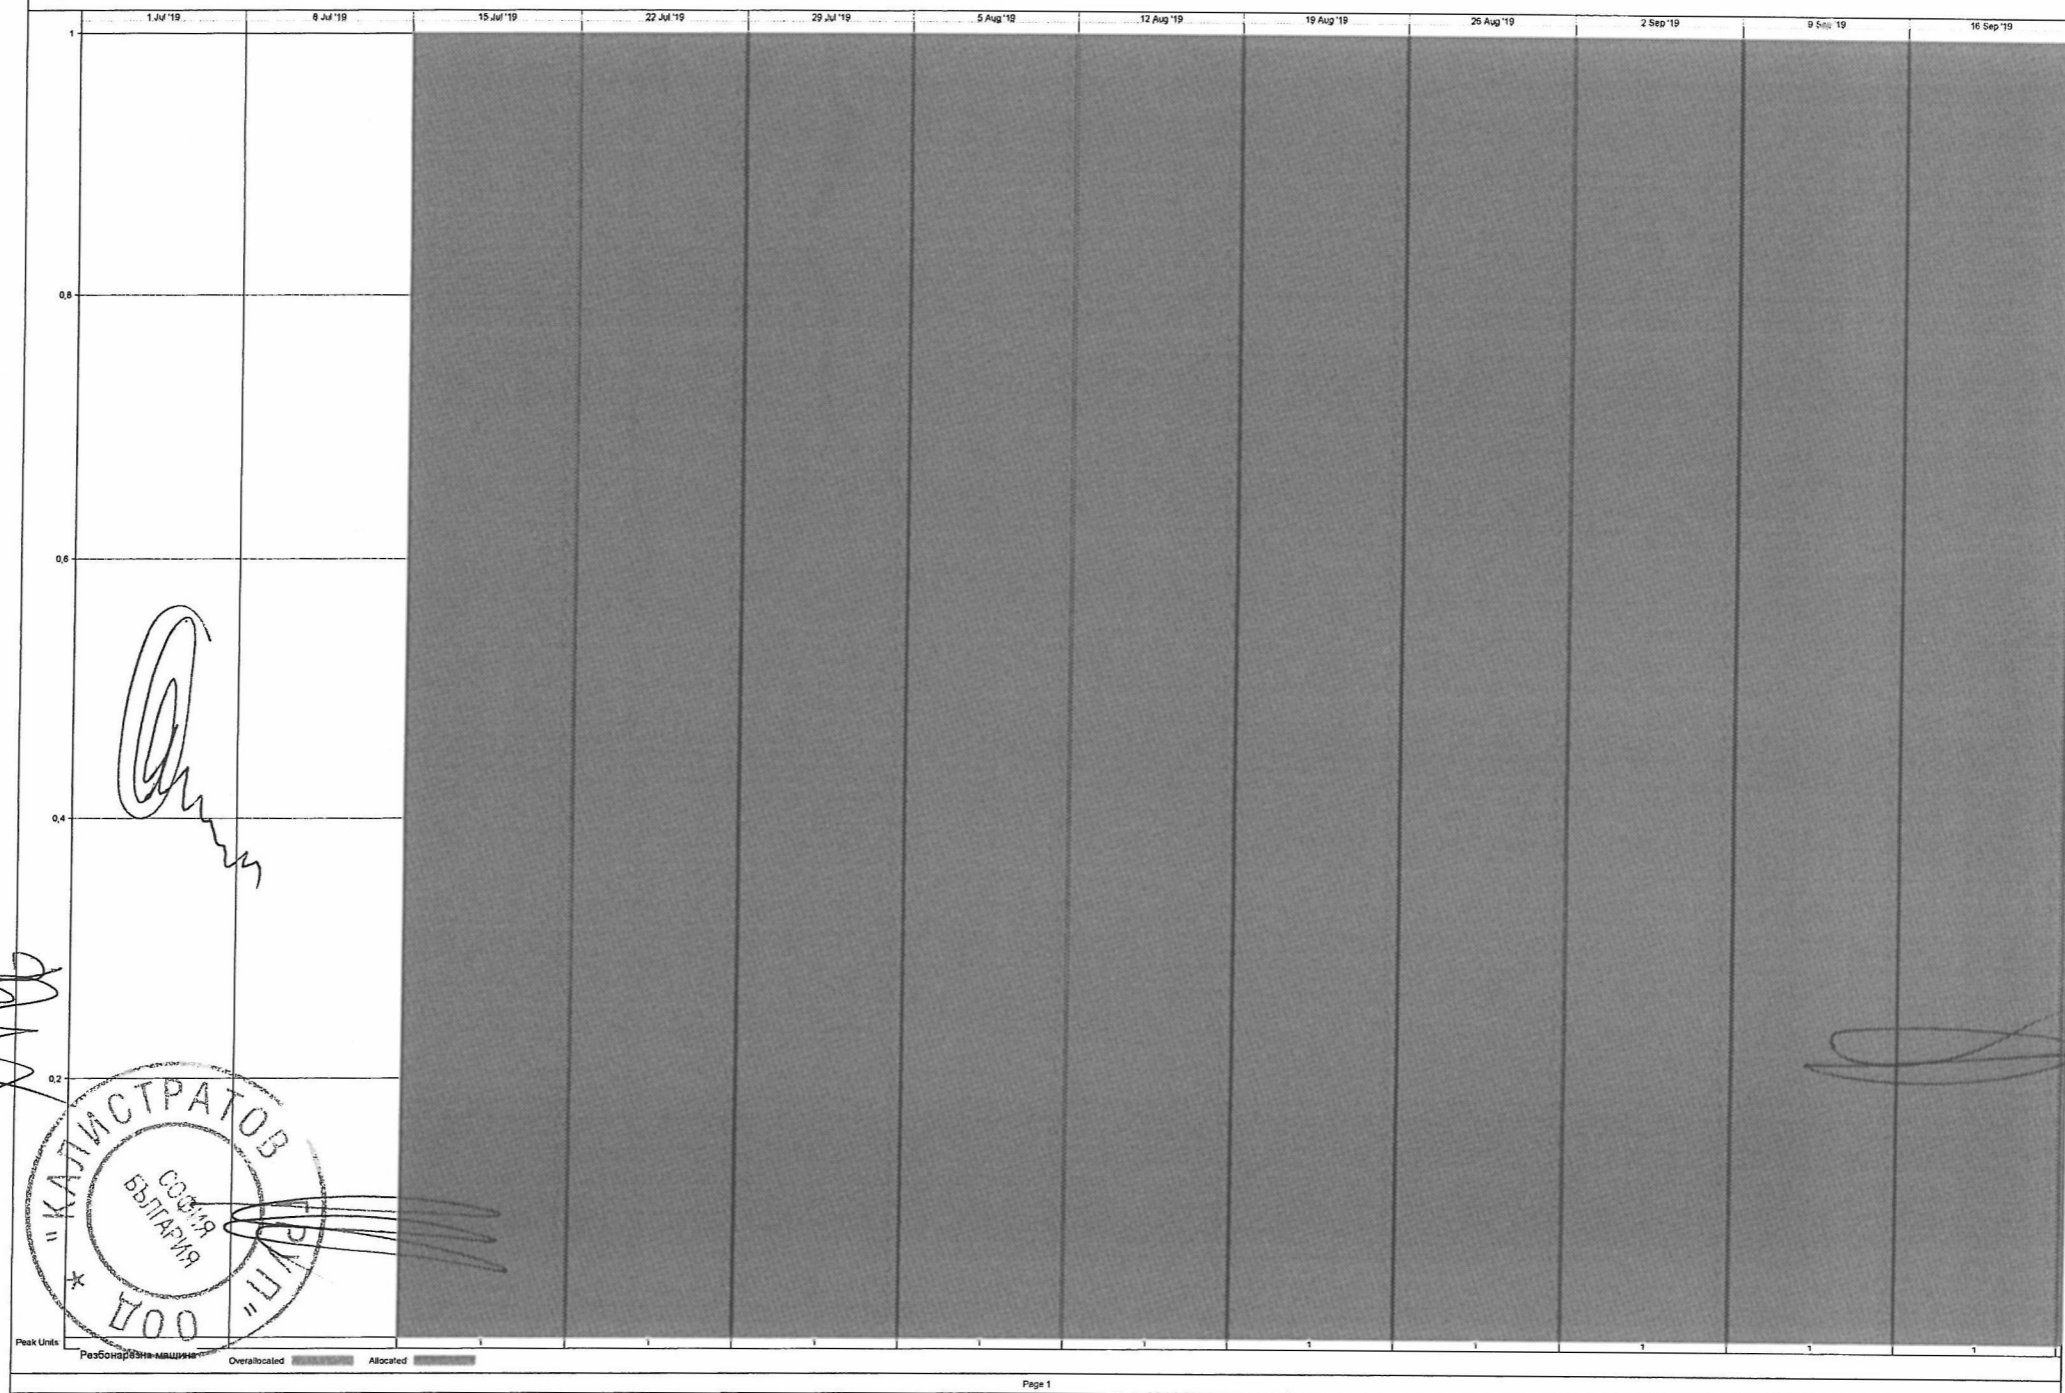


Handwritten scribbles in the left margin of the chart area.

Handwritten scribbles in the right margin of the chart area.

Peak Units Reasonable Machine Overallocated Allocated

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

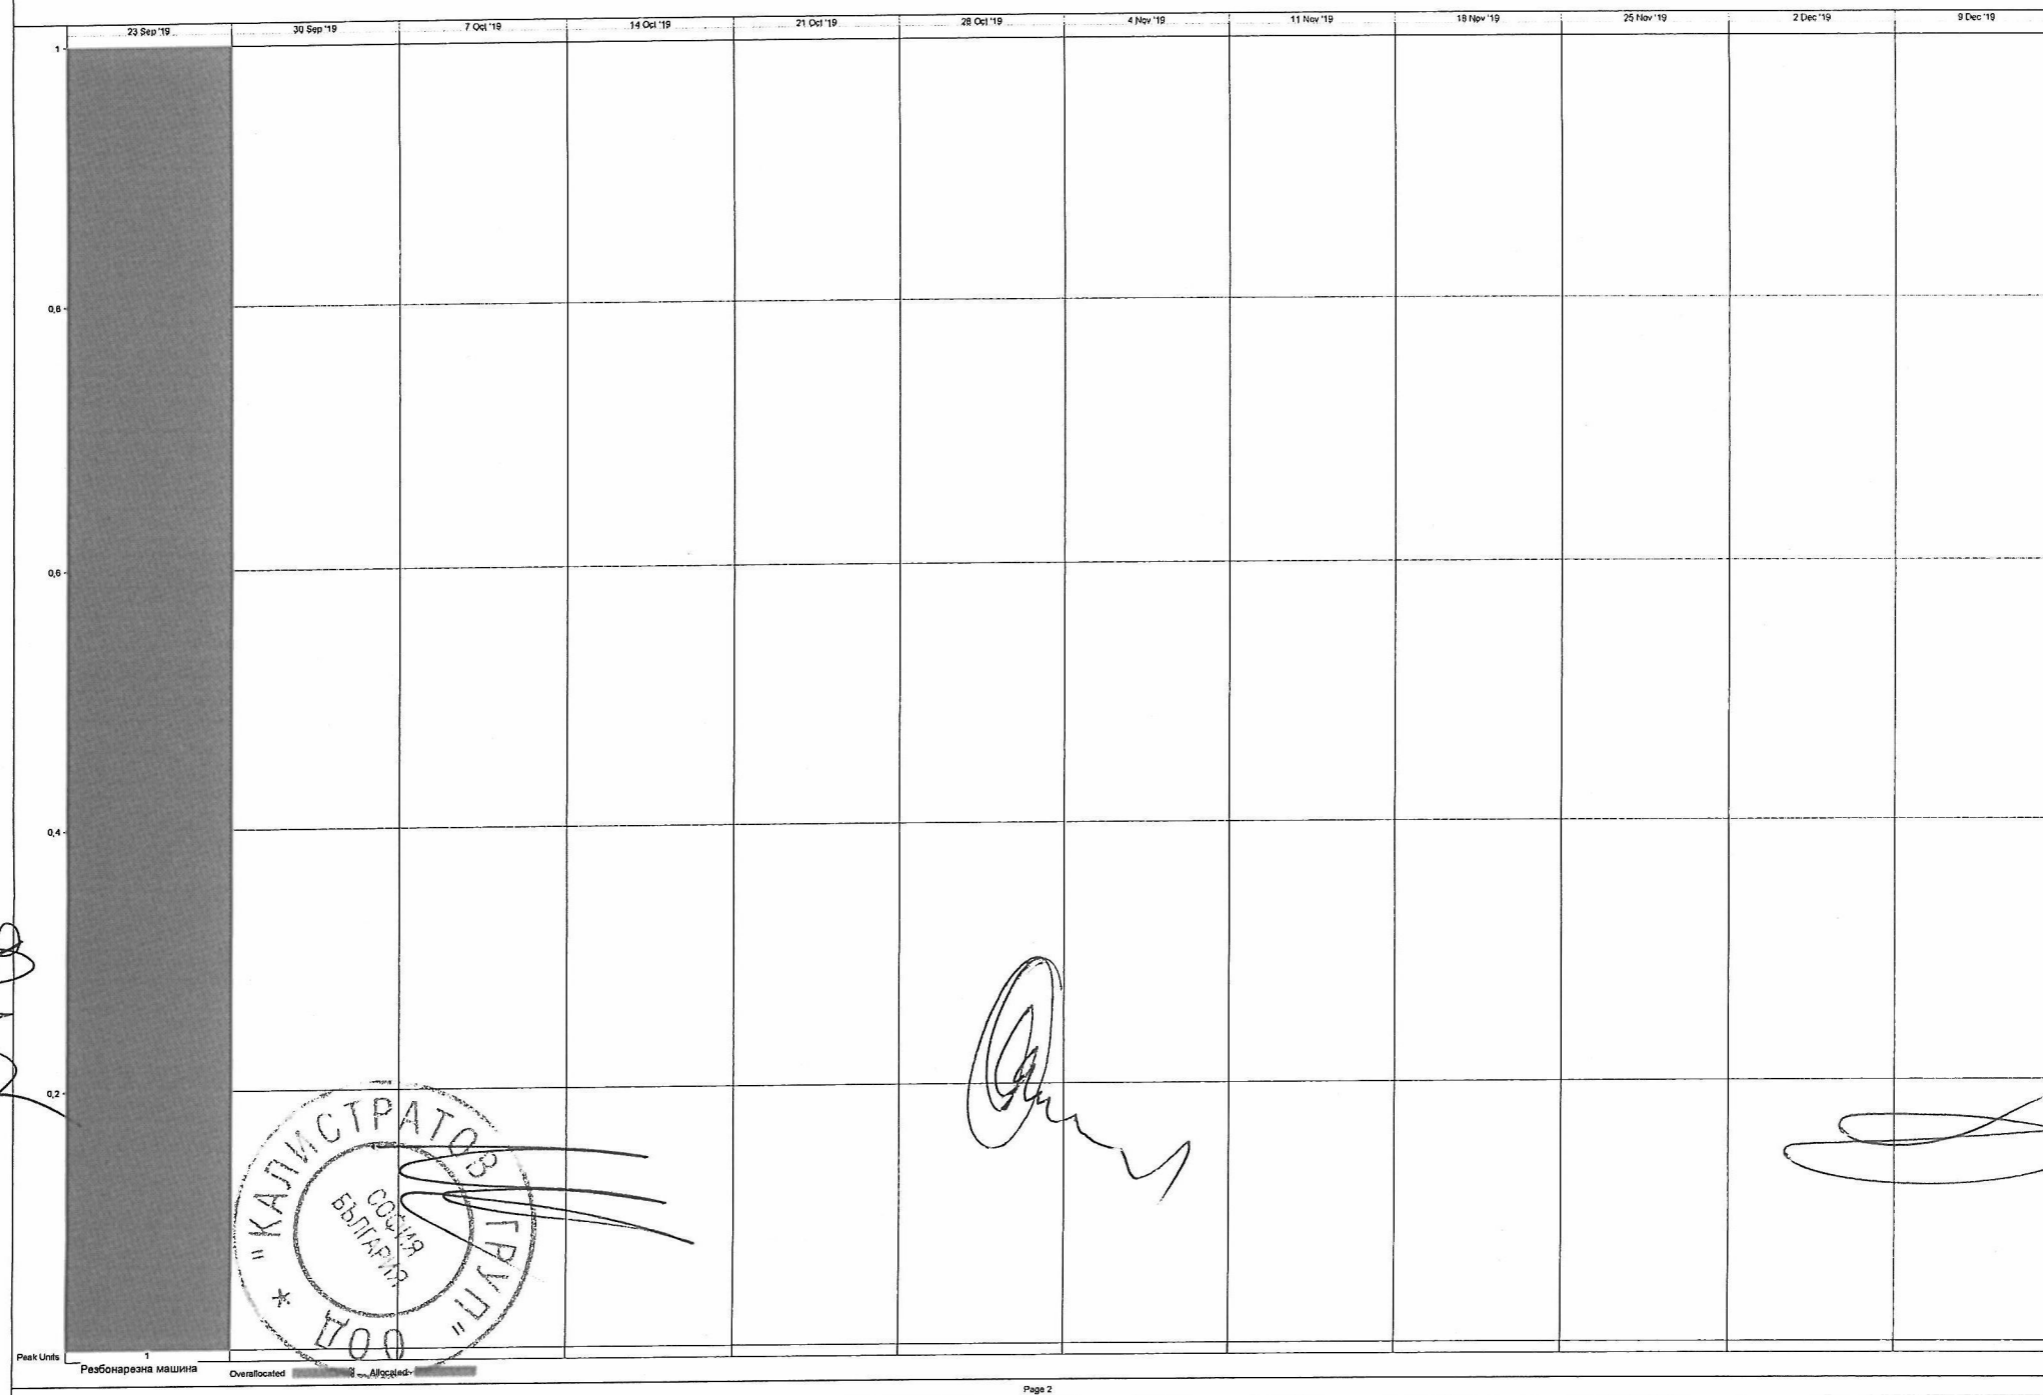


[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

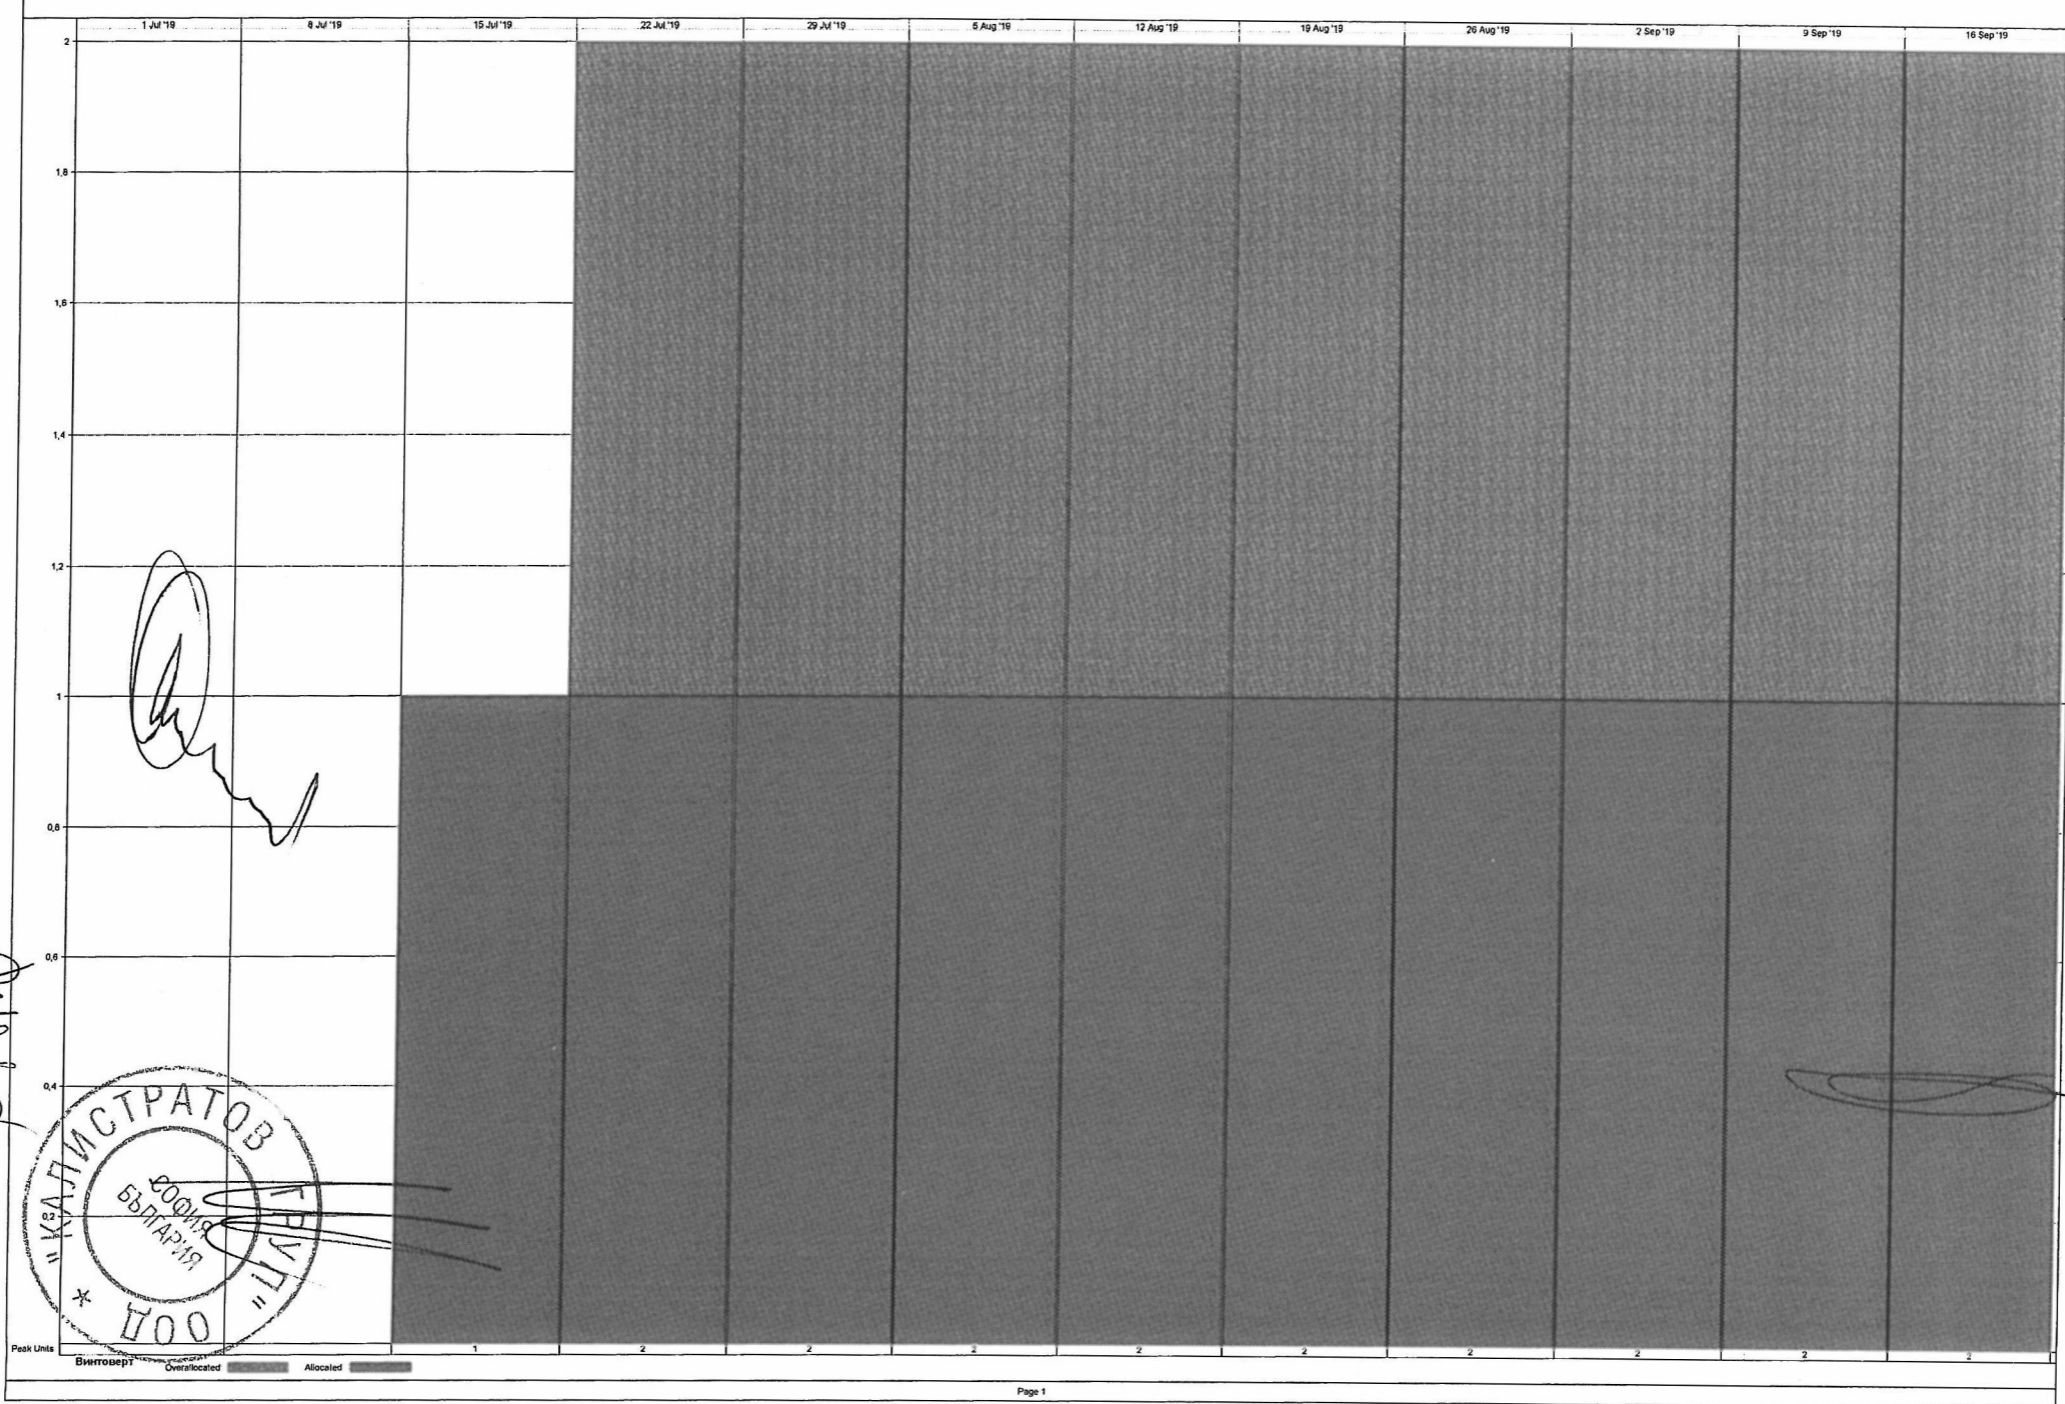


Handwritten signature




ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

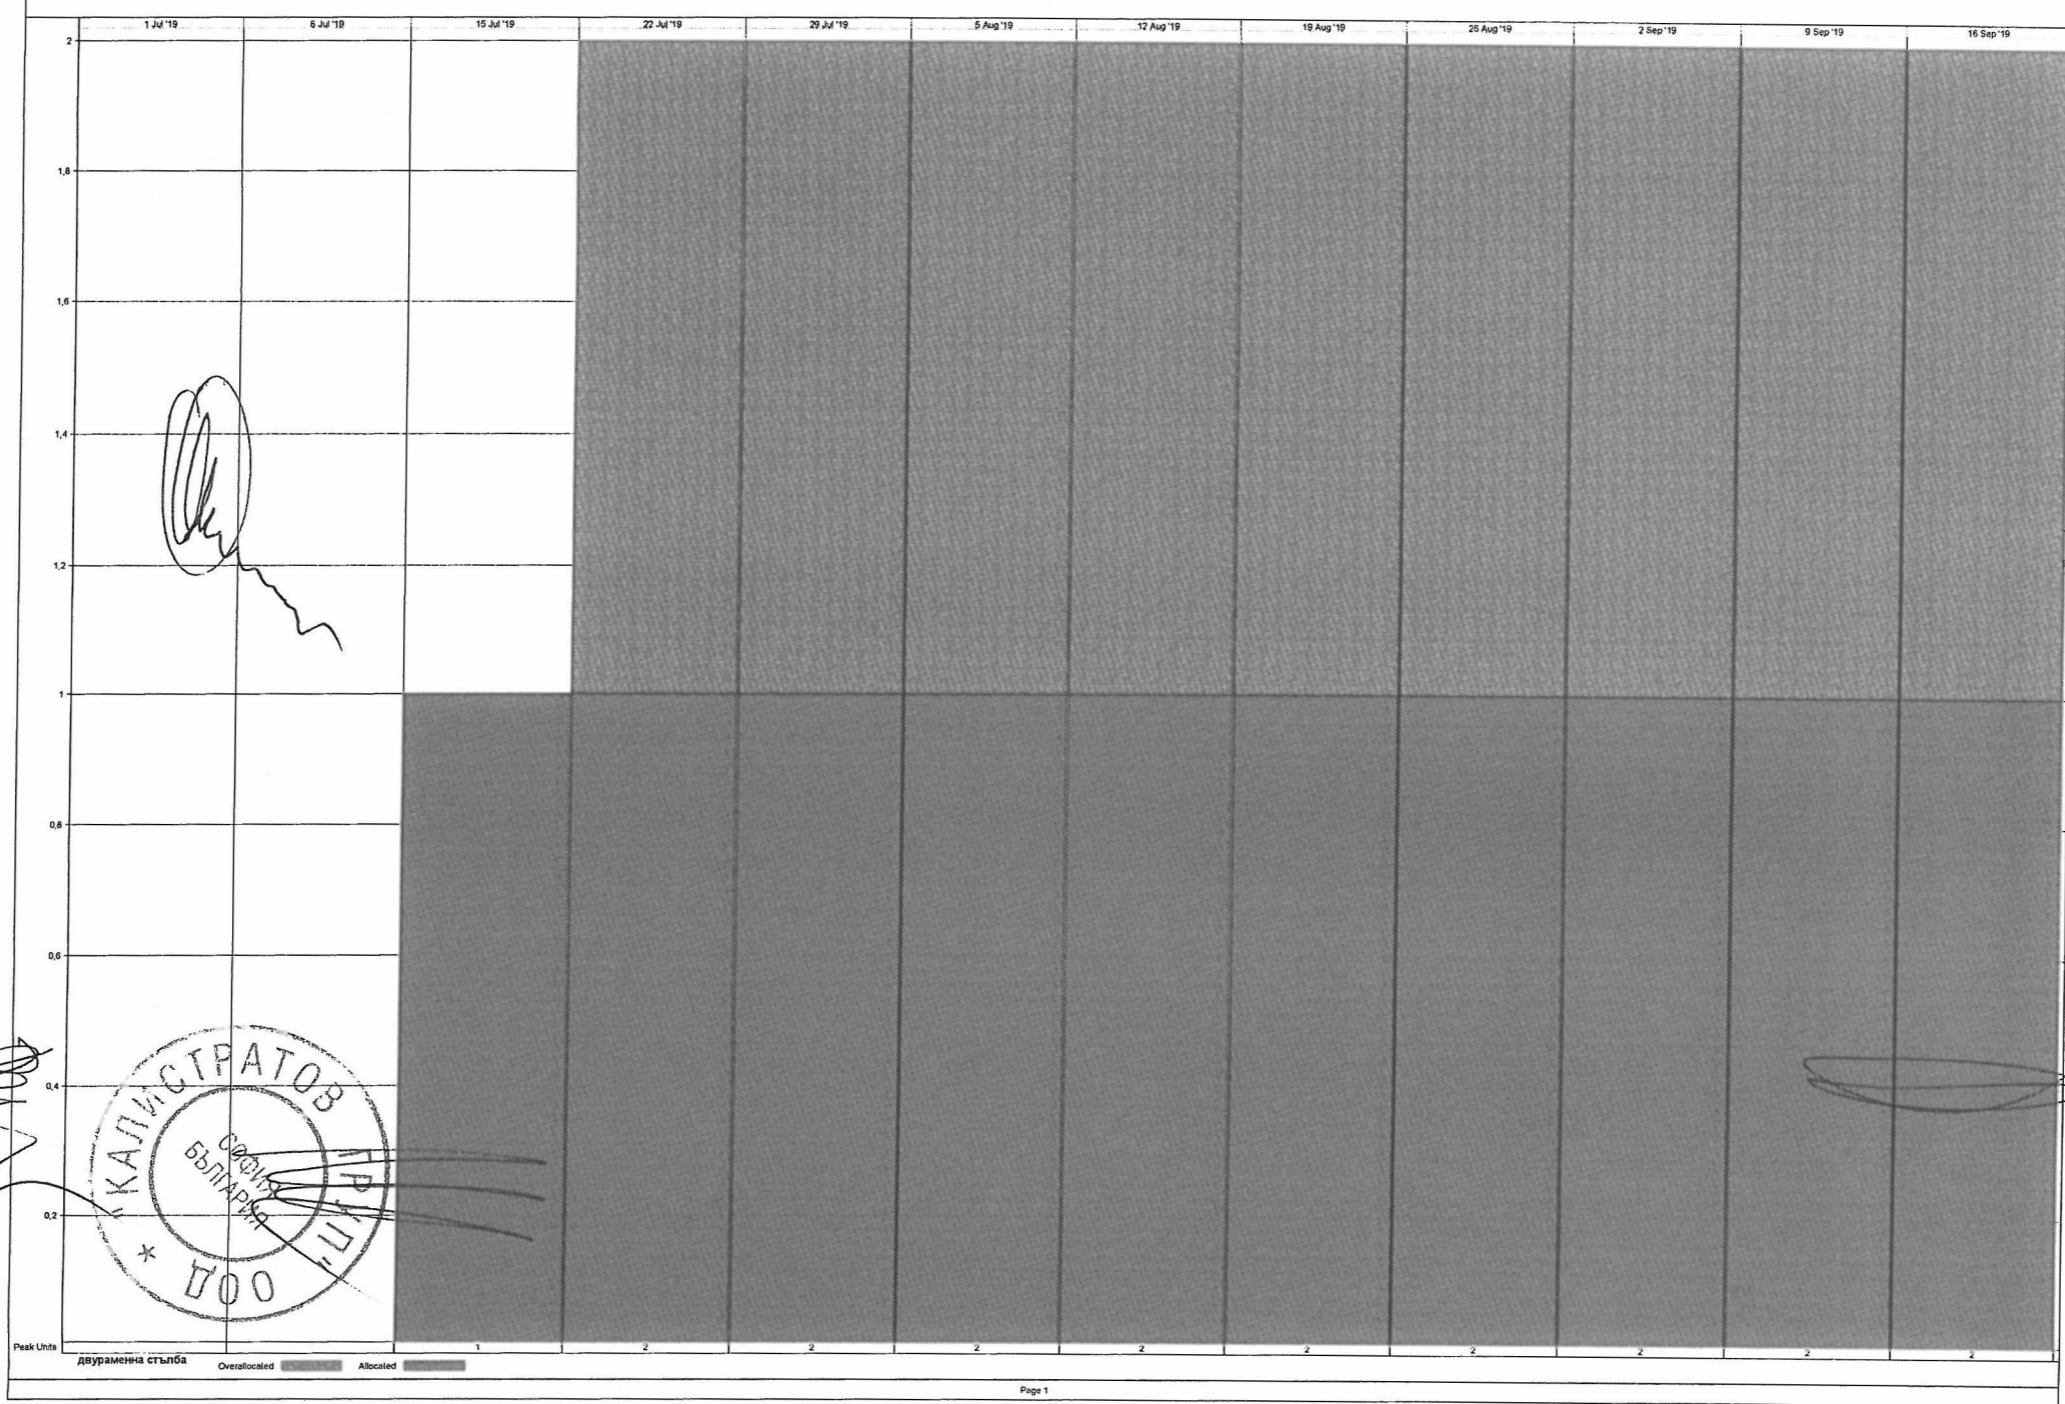

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

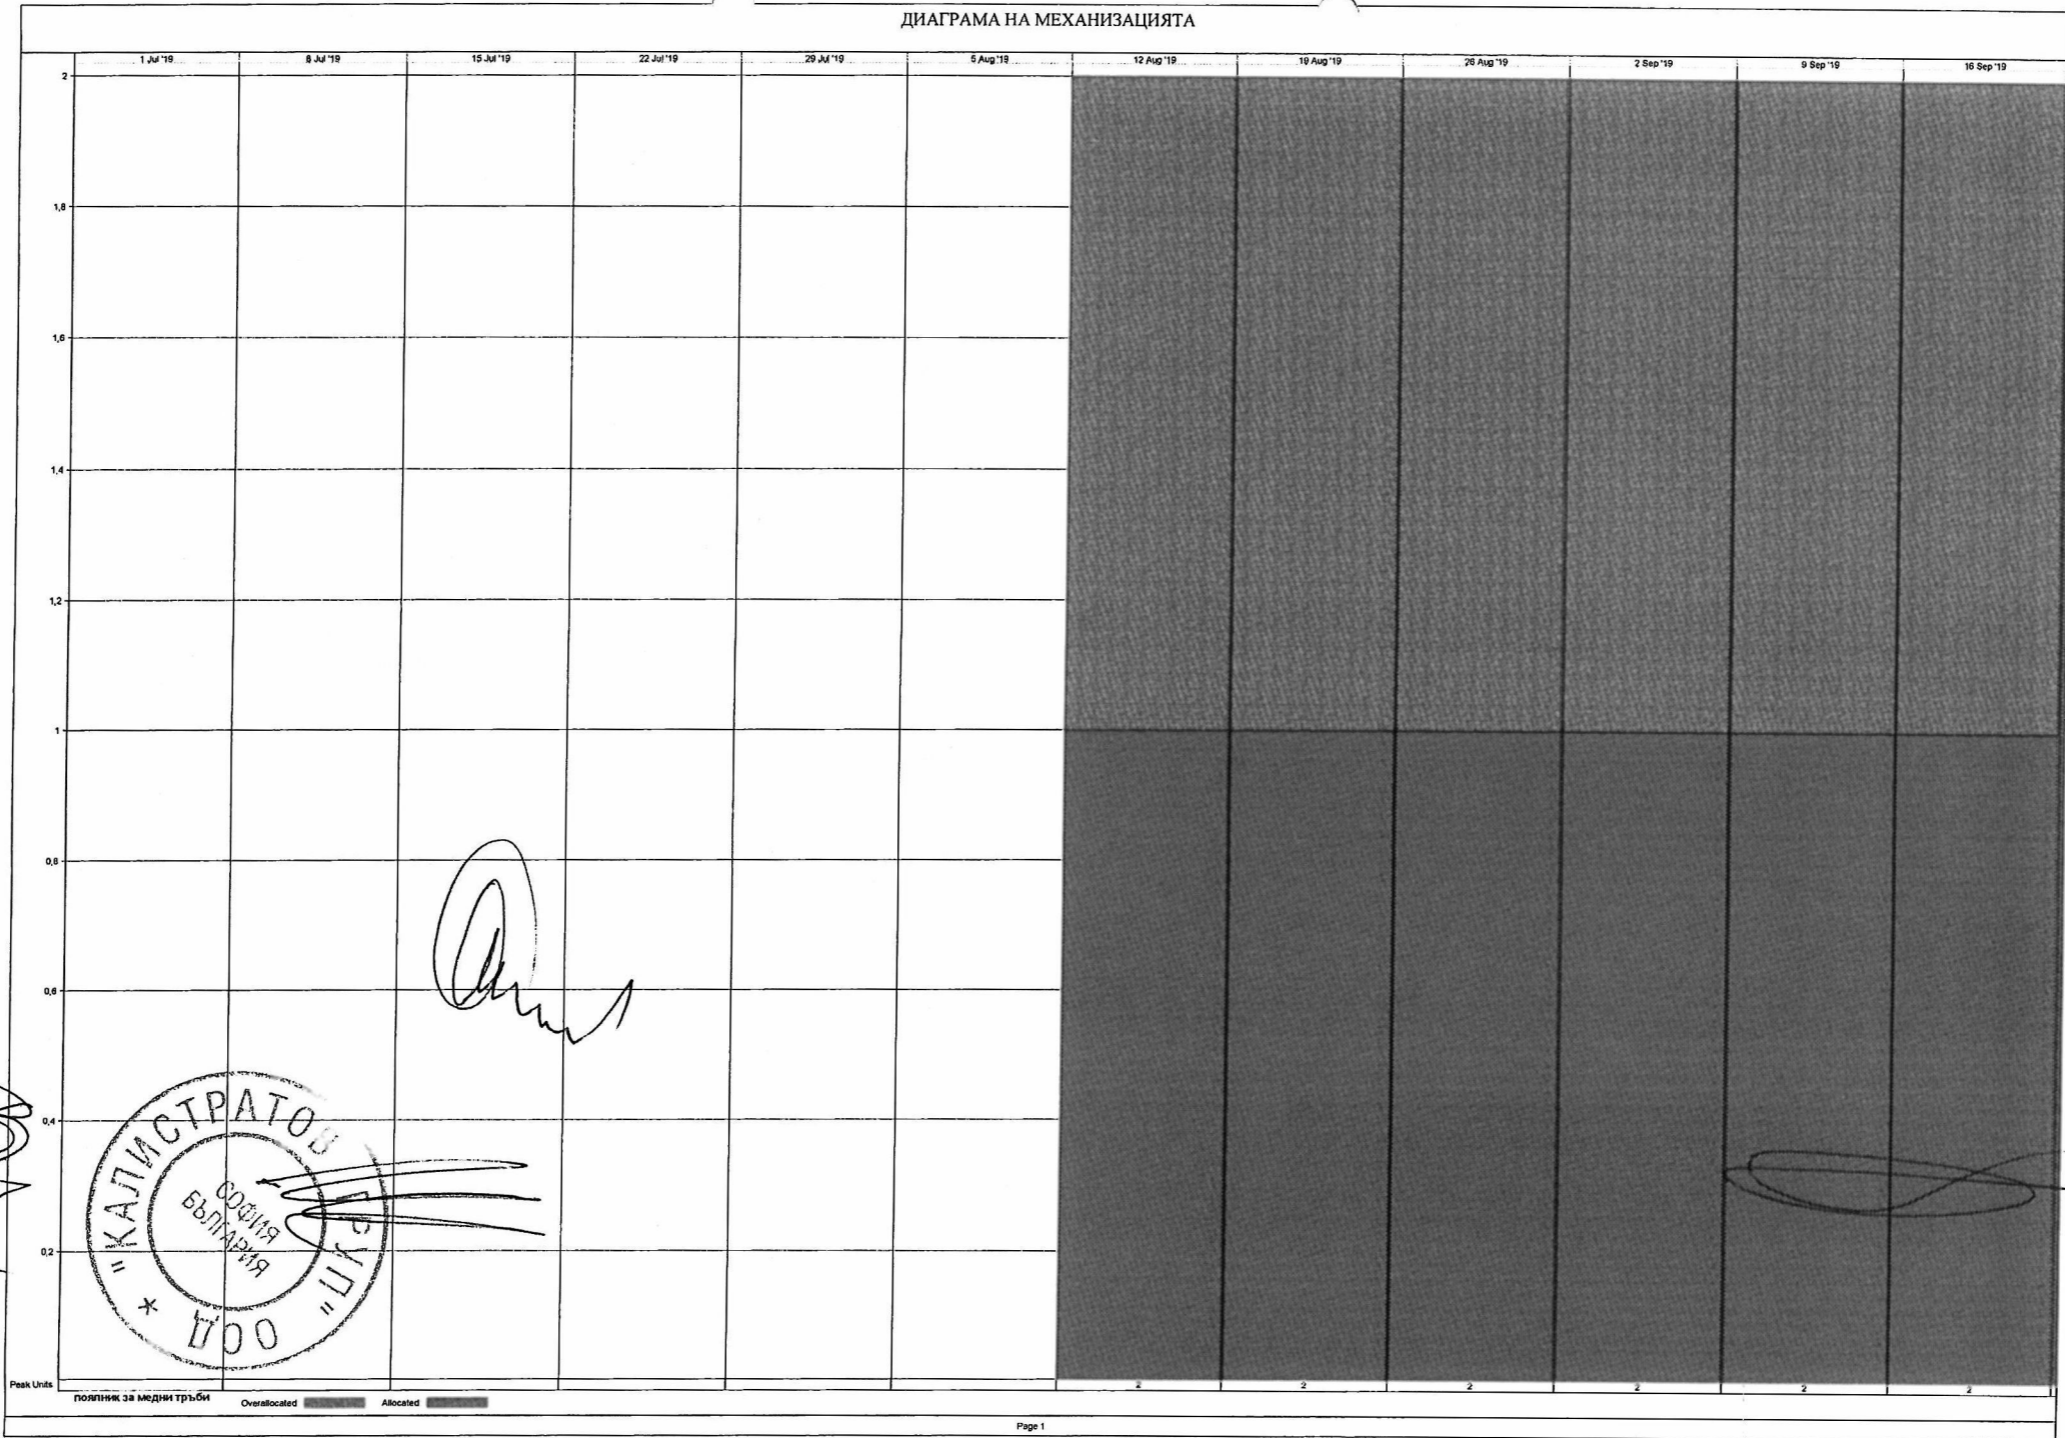

Handwritten scribble on the left side of the chart.




Handwritten signature in the middle-left area of the chart.

Handwritten scribble in the lower-right area of the chart.

Legend for resource allocation: **ПОЛНИМ ЗА МЕДИНИ ТРЪБИ** (Full for medical pipes), **Overallocated** (light grey), **Allocated** (dark grey).

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

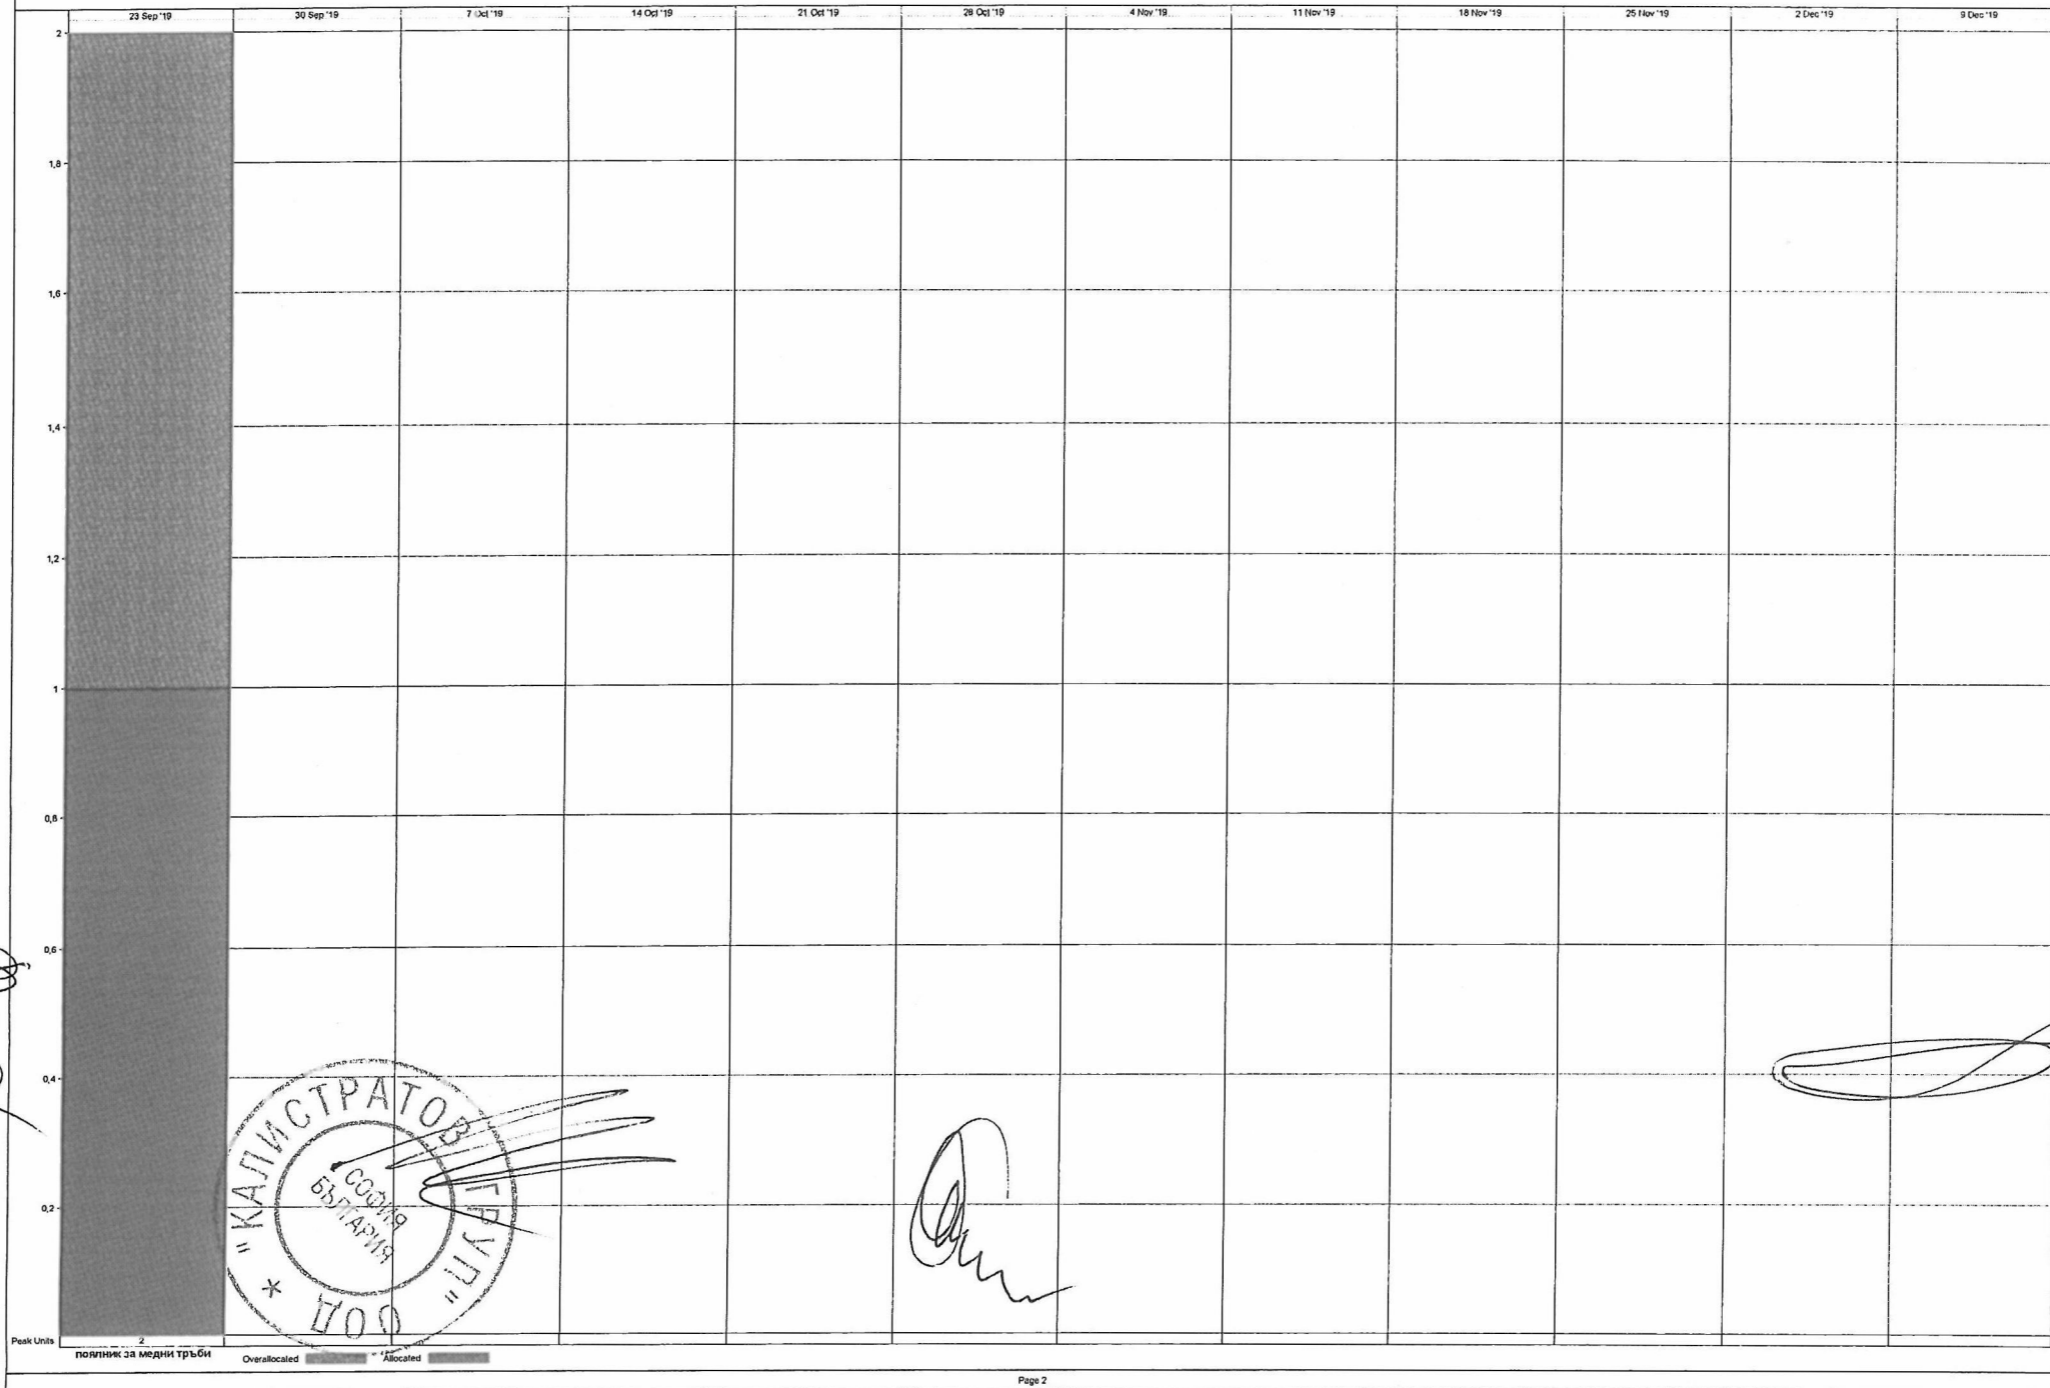

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Приложение 2: Опис на основните материали и елементи, предвидени за влагане на обекта

№	Вид	Характеристики на основните материали и елементи, предвидени за влагане	Съответствие с изискванията в техн. спецификации и инвест. проекти
част Архитектура			
1	PVC стенна облицовка	Standart plus - Tarkett, деб. 1,5 мм	изпълнено
2	PVC настилка	Stella - Tarkett, деб. 1,5 мм	изпълнено
3	Вароциментова мазилка	Теразид / Баумит	изпълнено
4	Циментова замазка	Теразид / Баумит	изпълнено
5	Гипсова шпакловка	Боро / Теразид	изпълнено
6	Защитни буфери/ бандове по стени	Производител: CS FRANCE Доставчик: АССИСТ ЕООД	изпълнено
7	Лагекс	Jotun / Ограхим / Kraft	изпълнено
8	Леки преградни стени и обшивки - гипсокартон	Rigips / Knauf	изпълнено
9	Саморазливна замазка	Баумит Нивело Куатро	изпълнено
10	Окачен таван - 600/600	1. Schlycht Hygena - Knauf AMF; 2. Ultima - Armstrong; 3. Thernatex - Knauf AMF	изпълнено
11	Окачен таван - гипсокартон водоустойчив	Rigips / Knauf	изпълнено
12	Зидария газобетон	YTONG	изпълнено
13	Гранитогрес / Теракот / Фаянс	KAI	изпълнено
14	Топлоизолация XPS	ODE / POFIX / Fibrotermica	изпълнено
15	Вътрешна дограма	Etem E1000, стъклопакет 20 мм Б/Б или PVC панел	изпълнено
16	Метални пожароустойчиви врати	"Елит МС"	изпълнено
част Електро - силовококови системи			
1	етажно табло ТЕ2 с три секции. по схема	Табло NSYCRN IP65, се комплектува с апаратура SE iC60N, на SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
2	табло ТСП по схема	Табло NSYCRN IP65, се комплектува с апаратура SE iC60N, на SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
3	табло Ткухня по схема	Табло Prasma F IP40, се комплектува с апаратура SE iC60N, на SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
4	табло ТМ по схема	Табло Prasma F IP40, се комплектува с апаратура SE iC60N, на SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
5	табло Т21 по схема	Табло Prasma F IP40, се комплектува с апаратура SE iC60N, на SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
6	UPS 15kVA/380V. вградено АВР. време на прекъсване <0.5 s. автономия 10min.	On-line UPS на френската фирма Socomec, модел Masterys BC320S, мощност 20kVA/18kW, трифазен вход - трифазен изход, 4 минути автономия върху максималния товар от 18kW, вградени батерии Normal Life с живот 5 години, вграден автоматичен и ръчен байпас, габарити (ШхДхВ): 444x795x800 мм, тегло 191 кг, MAS4BC320S+91	изпълнено
7	перфорирана метална скара	Горешо поцинкована перфорирана скара и прилежащи елементи. Кабелни скари са в комплект с интегрирани съединители, осигуряващи изравняване на потенциала по цялото трасе (DIN EN 10 327) производител: NIEDAX GmbH & Co. KG - Deutschland	изпълнено
8	кабели СВТ	Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение 0,6/1kV, Производител : Елкабел АД	изпълнено
9	ПЕ-тръба Ø12, Ø14mm, Ø50mm	Тръби COMBO Rigid Courline euro E/T Spiral 320N, клас 2221, неразпространяващи горене , от -5°C до +60°C , Производител : Kouroupis-Binaris S.S."COURBI"	изпълнено
10	осв. тяло с LED 16W. тип „Луна“ с разсейвател. Ф=1440 Lm. 4000°K.	Slim Downlight DSTW8-1840-7SR-ST ; Производител : Tungsram	изпълнено
11	осв. тяло с LED 22W. тип „Луна“ с разсейвател. Ф=2250 Lm. 4000°K.	Осветително тяло, тип Луна, Wave 25W LED 2250lm , Ra>80, 4000K ; Производител Денима ПРО ООД	изпълнено
12	осв. тяло с LED 22W. тип „Луна“ с разсейвател. Ф=2250 Lm. 4000°K. с възможност за димиране	Осветително тяло с LED 22W, тип „Луна“ с разсейвател, Ф=2250 Lm, 4000°K. - Луна тип тип Aviella C07 OA 2000-840 ETDD 01; Производител : Trilux, Германия	изпълнено
13	осв. тяло с LED 30W. тип „Луна“ с разсейвател. Ф=4050 Lm. 4000°K. с възможност за димиране	Осветително тяло тип LED луна за OM Ф450мм/ H110mm, 4x13W LED димируеми, 4000lm/840, ; Производител : Денима ПРО ООД	изпълнено
14	осв. тяло с LED 11W. с вградена АБ. за евакуационно осветление. време на осигуряване 60min	Осветително тяло с LED 11W, с вградена АБ, за евакуационно осветление, време на осигуряване 60min - ONTEC S M1 101 M/NM ST 7xLED, 3ч. Автономия, IP44 ; Производител : Денима ПРО ООД	изпълнено
15	IR-сензори /PIR-ключ/	Осезател за присъствие (PIR) ключ, 230V, ; Производител : Канлукс	изпълнено

16	ключове обикновени със светлинна сигн.	Ключ ASFORA, 10A, 220-240 V AC 50Hz , степен на защита: IP20 , производител: SCHNEIDER ELECTRIC.	изпълнено
17	ключове обикновени	Ключ ASFORA, 10A, 220-240 V AC 50Hz , степен на защита: IP20 , производител: SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
18	ключове обикновени димиращи	Ключ ASFORA, 10A, 220-240 V AC 50Hz , степен на защита: IP20 , производител: SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
19	ключове девиаторни	Ключ ASFORA, 10A, 220-240 V AC 50Hz , степен на защита: IP20 , производител: SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
20	импулсни бутони	Ключ ASFORA, 10A, 220-240 V AC 50Hz , степен на защита: IP20 , производител: SCHNEIDER ELECTRIC,	изпълнено
21	контакти 16A. единични. „Шуко“ (с капаче)	Контакт Asfora ШУКО 2P+T, 10/16A 250V, бял, 220-240 V AC 50Hz , Производител: SCHNEIDER ELECTRIC,	изпълнено
22	контакти 16A. IP44. единични. „Шуко“ (с капаче)	Контакт Asfora ШУКО 2P+T, 10/16A 250V, бял, 220-240 V AC 50Hz , Производител: SCHNEIDER ELECTRIC,	изпълнено
23	контакти 16A. триполюсни.	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 16A 2P-E PKF16W423 200-250V AC 50/60Hz 6h IP44, Производител: SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
24	контакти 16A. сдвоени. „Шуко“	Контакт Asfora ШУКО 2P+T, 10/16A 250V, бял, 220-240 V AC 50Hz , Производител: SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
25	контакти 16A. 4бр. единични в обща рамка	Контакт Asfora ШУКО 2P+T, 10/16A 250V, бял, 220-240 V AC 50Hz , Производител: SCHNEIDER ELECTRIC,	изпълнено
26	триполюсни контакти 25A/230V. единични. за подвижен рентгенов апарат.	Триполюсен контакт 25A/230V ; Производител: SCHNEIDER ELECTRIC	изпълнено
част Електро - слабоотковни системи			
1	кабел СВТ 3x1,5мм2	Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение 0,6/1кV , Производител : Елкабел АД	изпълнено
2	захранващ блок за камери	захранващ блок ; Производител: RANINA LTD	изпълнено
3	камера за вътрешен монтаж	камера за вътрешен монтаж HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux (0 Lux IR on); обектив 3.6 мм; EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; за външен монтаж (IP66) - 20-60C; 12Vdc/4W, DS-2CE56D1T-IT3 ; Производител: Hikvision,	изпълнено
4	Мегапикселова IP за вътрешен монтаж IP камера Ден/Нощ, EXIR	Мегапикселова IP за вътрешен монтаж IP камера Ден/Нощ, EXIR технология 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux/F1.2; обектив 4 мм; механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; 12Vdc/PoE , DS-2CD1121-I ; Производител: Hikvision,	изпълнено
5	16-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер	16-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер: поддържа 16 HD-TVI или аналогови камери (свободно избираемо) + 2 IP камери (FullHD/25 к/с); компресия H.264; резолюция до 1080p (1920x1080); скорост на запис (общо): 400 кад/сек@1080p (real-time); 4 SATA HDD (до 4TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI/VGA изходи; RS-485; графично меню; CMS софтуер iVMS-4200; USB мишка; без HDD, DS-7216HUHI-F2/N ; Производител: Hikvision,	изпълнено
6	HDD 6 TR	HDD 6 TR ; Производител: Western Digital,	изпълнено
7	цветна видеокамера с вградено разговорно устройство	цветна видеокамера с вградено разговорно устройство , DS-KB2411-DM ; Производител: Hikvision,	изпълнено
8	4" цветен видеомонитор с електронен звънец и вграден захранващ блок	4" цветен видеомонитор с електронен звънец и вграден захранващ блок , DS-KH2200 ; Производител: Hikvision,	изпълнено
9	захранване	захранване , DS-KAW50-1 ; Производител: Hikvision,	изпълнено

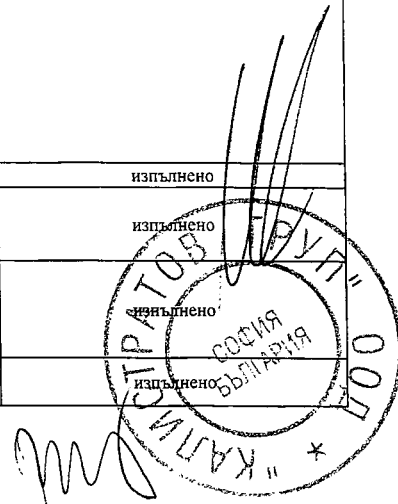

10	Интелигентен аналогов адресируем оптичен димов пожарозвестител, програмируема чувствителност, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54,	Интелигентен аналогов адресируем оптичен димов, FAP-425-O-R ; Производител: BOSCH	изпълнено
11	Интелигентен аналогов адресируем термичен пожарозвестител, програмируема чувствителност, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54,	Интелигентен аналогов адресируем термичен пожарозвестител, програмируема чувствителност, самодиагностика, вградени изолатори и централен индивидуален индикатор, изпитан и сертифициран по EN54, FAH-425-T-R ; Производител: BOSCH	изпълнено
13	Допълнителен панел за модули с консумативи	Допълнителен панел за модули с консумативи , HBE-0012 + accessories ; Производител: BOSCH	изпълнено
14	Модул за управление на LSN- контура с до 127 LSN елемента	Модул за управление на LSN- контура с до 127 LSN елемента , LSN 0300A ; Производител: BOSCH	изпълнено
15	Адресна SIM карта	Адресна SIM карта с 512 адреса ; Производител: BOSCH	изпълнено
16	Ръчен пожарозвесител адресируем вътрешен монтаж	Ръчен пожарозвесител адресируем вътрешен монтаж , FMC- 420RW-GSRRD ; Производител: BOSCH	изпълнено
17	Адресируема сирена с лампа	Адресируема сирена с лампа , FNM-420-A-BS-RD:FNS-420-R ; Производител: BOSCH	изпълнено
18	Адресируем модул за управление	Адресируем модул за управление , FLM-420-O111-E ; Производител: BOSCH	изпълнено
19	Захранващ блок	захранване ; Производител: RANINA LTD	изпълнено
20	Надвратен индикатор	Надвратен индикатор , RI31 ; Производител: RANINA LTD	изпълнено
21	Високоговорители за окачен таван 6,3 и 1.5W, 100V	Високоговорители за окачен таван 6,3 и 1.5W, 100V , LBC 3087/41 ; Производител: BOSCH	изпълнено
22	Атенуатор за 6W, 100V	Атенуатор за 6W, 100V , LBC1401/10 ; Производител: BOSCH	изпълнено
23	Атенуатор за 50W, 100V	Атенуатор за 50W, 100V , LBC1411/10 ; Производител: BOSCH	изпълнено
24	тримодулна кутия на тримодулна кутия, комплектувана с 3 бр. Insert RJ45 Cat. 6, и три броя контакти 220V-скрит монтаж	тримодулна кутия на тримодулна кутия, комплектувана , Aemsa ; Производител: Aemsa	изпълнено
25	инсталационен кабел ReaMO Cat.7, S/FTP, 4P, AWG 23, up to 750 MHz	инсталационен кабел ReaMO Cat.7, S/FTP ; Производител: R&M	изпълнено
26	свързващ модул RJ 45,"Real10",Cat6	свързващ модул RJ 45,"Real10",Cat6 ; Производител: R&M	изпълнено
27	четец AR-737H за безконтактни карти, компактен, 26-битов Wiegand протокол, вграден тампер-ключ, подходящ за вътрешен и външен монтаж.	четец AR-737H за безконтактни карти , AR-737H + AR-921RB ; Производител: SOYAL	изпълнено
28	магнитен контакт за врата	магнитен контакт за врата , SC517 ; Производител: CQR	изпълнено
29	мрежов контролер за управление на до 16 врати, - 2 бр. Wiegand порта за създаване на 2 бр. Wiegand четци; Серийни порта RS-485 - 2 бр. всеки поддържа по 8 бр. четци и вграден Ethernet интерфейс за LAN или WAN, RS-485 интерфейс за комуникация, Anti-pass-back функция, до 15 000 потребители, часовник, календар, функция за отваряне на всички врати при спешност, съхранение на натрупаната информация за повече от два месеца при липса на комуникация с компютър, вградени LED индикатори за захранване и комуникация, кутия с ключалка	мрежов контролер за управление на до 16 врати , AR-716E1 ; Производител: SOYAL	изпълнено
30	електромагнитен насрещник	електромагнитен насрещник , 1740 ; Производител: Intesa	изпълнено
31	автомат за затваряне на врата	автомат за затваряне на врата , IS 60 ; Производител: ISEO Group Италия	изпълнено
32	паник-бутон	паник-бутон , PASP1 ; Производител: CQR	изпълнено
33	контролен панел и аксесоари	контролен панел и аксесоари , EVO192 ; Производител: PARADOX	изпълнено
34	кутия за контролен панел	кутия за контролен панел ; Производител: CTC	изпълнено
35	клавиатура буквено-цифрова - дисплей	клавиатура буквено-цифрова - дисплей , K641+ BUL/ENG ; Производител: PARADOX	изпълнено
36	Адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор	Адресируема централа за повикване на медицински персонал и провеждане на разговор , BM5511 ; Производител: Betamark	изпълнено
37	Захранващ блок	Захранващ блок , BM5520 ; Производител: Betamark	изпълнено
38	Адресируем модул за повикване от болнично легло	Адресируем модул за повикване от болнично легло , BM5530 ; Производител: Betamark	изпълнено
39	Адресируем модул за разговор от болнични легла	Адресируем модул за разговор от болнични легла , BM5550 ; Производител: Betamark	изпълнено



40	Модул за нулиране повикването от болнична стая	Модул за нулиране повикването от болнична стая , BM5560 ; Производител: Betamark	изпълнено
41	Изнесен индикатор –червен/зелен	Изнесен индикатор –червен/зелен , BM5540 ; Производител: Betamark	изпълнено
42	Панел с бутон за повикване, отказ и индикация от всяко легло	Панел с бутон за повикване, отказ и индикация от всяко легло ; Производител: Betamark	изпълнено
част ВиК			
1	PVC тръби и фитинги	PVC тръби и фитинги за вътрешно сградна канализация- Валдом Сърбия	изпълнено
2	PVC ревизионни отвори	PVC тръби и фитинги за вътрешно сградна канализация- Валдом Сърбия	изпълнено
3	Тоалетни мивки	Умивалници- Видима – Идеал Стандарт	изпълнено
4	Сифони за тоалетни мивки	Сифони за мивка, сифони за умивалници, сифони за биде,сифони за вани и душкабини, сифони-тръбни структури за вграждане- Alca plast s.r.o. bratislavská 2856, 690 02 břeclav	изпълнено
5	Клозети моноблок със задно оттичане	WC Тоалетни чинии и WC комплекти- Видима – Идеал Стандарт	изпълнено
6	Подови сифони ф 50	Сифони за мивка, сифони за умивалници, сифони за биде,сифони за вани и душкабини, сифони-тръбни структури за вграждане- Alca plast s.r.o. bratislavská 2856, 690 02 břeclav	изпълнено
7	Аусгус./изливна мивка	Умивалници- Видима – Идеал Стандарт	изпълнено
8	Кухненска мивка със сифон	Умивалници- Видима – Идеал Стандарт	изпълнено
9	ППР тръби, фитинги и арматура ф20,ф25,ф32	PILSA - тръби и фитинги от PP-R, PP-RCT, -GF-, -BF-, AL-, Турция	изпълнено
10	S-сифон ф50, ф75, ф110	Сифони за мивка, сифони за умивалници, сифони за биде,сифони за вани и душкабини, сифони-тръбни структури за вграждане- Alca plast s.r.o. bratislavská 2856, 690 02 břeclav	изпълнено
11	Поцинковани тръби и фитинги	Тръби от нелегирана стомана подходящи за свързване чрез заваряване и с резба S195T съгласно EN 10255:2004+A1:2007- ArcelorMittal Tubular Products Iași SA	изпълнено
12	Топлоизолация от микропореста гума с деб.9, 13мм	Топлоизолация- Lisolante K-flex Spa	изпълнено
13	Смесителни батерии	Видима – Идеал Стандарт	изпълнено
14	Пожарна касетка 60/60 за вграждане- щорц, кран, шланг	Индустриал партс	изпълнено
част Отопление, вентилация и климатизация			
1	Радиатор алуминиев секционен	Радиатори- HELIOS,Radiatori 2000 S.p.a	изпълнено
2	Полиетиленови тръби с алуминиева вложка	Многослойни тръби с ал.вложка Valsir SPA	изпълнено
3	Климатизатор мултисплит-система на директно изпарение, инверторен, термомоппен	LG	изпълнено
4	Блок вентилационен смукателно-нагнетателен	Нексас	изпълнено
5	Въздухонагревател електрически канален	АТС	изпълнено
6	Вентилатор за санитарни възли	АТС	изпълнено
7	Въздуховоди и вентилационни елементи от поцинкована ламарина	Нексас	изпълнено
част Медицински газове			
1	Етажно газоразпределително табло	производство: Дрегер, Германия	изпълнено
2	Кислородни дози	производство: Дрегер, Германия	изпълнено
3	Вакуум дози	производство: Дрегер, Германия	изпълнено
4	Доза сгъстен въздух	производство: Дрегер, Германия	изпълнено
5	Медни тръби - Ф12, Ф10, Ф15, Ф18, Ф22, Ф28, Ф35, Ф42, колена, тройници	производство: Италия / Германия / Гърция	изпълнено
6	Твърд припой	производство: Ротенбергер, Германия	изпълнено

